

CHARTRE QUALITE

PUITS ET FORAGES D'EAU

FORAGE D'EXPLOITATION F20

Entreprise: EURO FORAGE

Client: SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO

Maître d'oeuvre:

Lieu du forage Site de Pont-Cariou
22290 LANLEFF

Coordonnées GPS: **Latitude** **Longitude** **Altitude** m

Date début du forage 07/01/2002

Date fin du forage 16/01/2002 **Machine** D12

Date début pompage **Niveau statique** m

Débit maxi. d'essai m3/h

Date fin de pompage **Rabatement correspondant** 0,00 m

Notes - PROF. : 100 m

AVANCEMENT DES TRAVAUX

FORAGE D'EXPLOITATION F20

Client: SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO

Maître d'oeuvre:

Du	Au	Travaux réalisés
07/01/2002	15/01/2002	: - Amenée de l'atelier de forage - Mise en station - Foration MFT 15" de 0 à 28 m - Busage acier Diam 406 de 0 à 6 m - Busage acier Diam 323 de 0 à 28 m - Foration MFT 10" de 28 à 100 m
16/01/2002		: - Busage PVC 178/195 de 0 à 100 m - Cimentation - Repli de l'atelier de forage

PHASES du FORAGE

FORAGE D'EXPLOITATION F20

Client:	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO		
Maitre d'oeuvre:			
Lieu du forage:	Site de Pont-Cariou		
	22290	LANLEFF	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	6,00	Alluvion
6,00	100,00	Volcano sédimentaire

FORAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Mode de forage	Fluide de forage
0,00	28,00	15"	381,00	MFT	Air
28,00	100,00	10"	254,00	MFT	Air

TUBAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0,00	6,00	16"	406,00	5,00		Acier	Tube plein		
0,00	28,00	12"3/4	323,00	4,00		Acier	Tube plein		
0,00	36,10	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
36,10	41,80	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11
41,80	62,90	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
62,90	68,60	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11
68,60	80,00	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
80,00	100,00	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11

CIMENTATION


De	à	Ø "	Ø mm	Nature du ciment	Méthode de pose	Vol. m3
0,00	28,00	12"3/4	323,00	CPJ 45	Gravitaire	2,10
0,00	34,00	7"5/8	195,00	CPJ 45	Gravitaire	1,35

FORAGE D'EXPLOITATION F20

Client :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO

Maitre d'oeuvre :

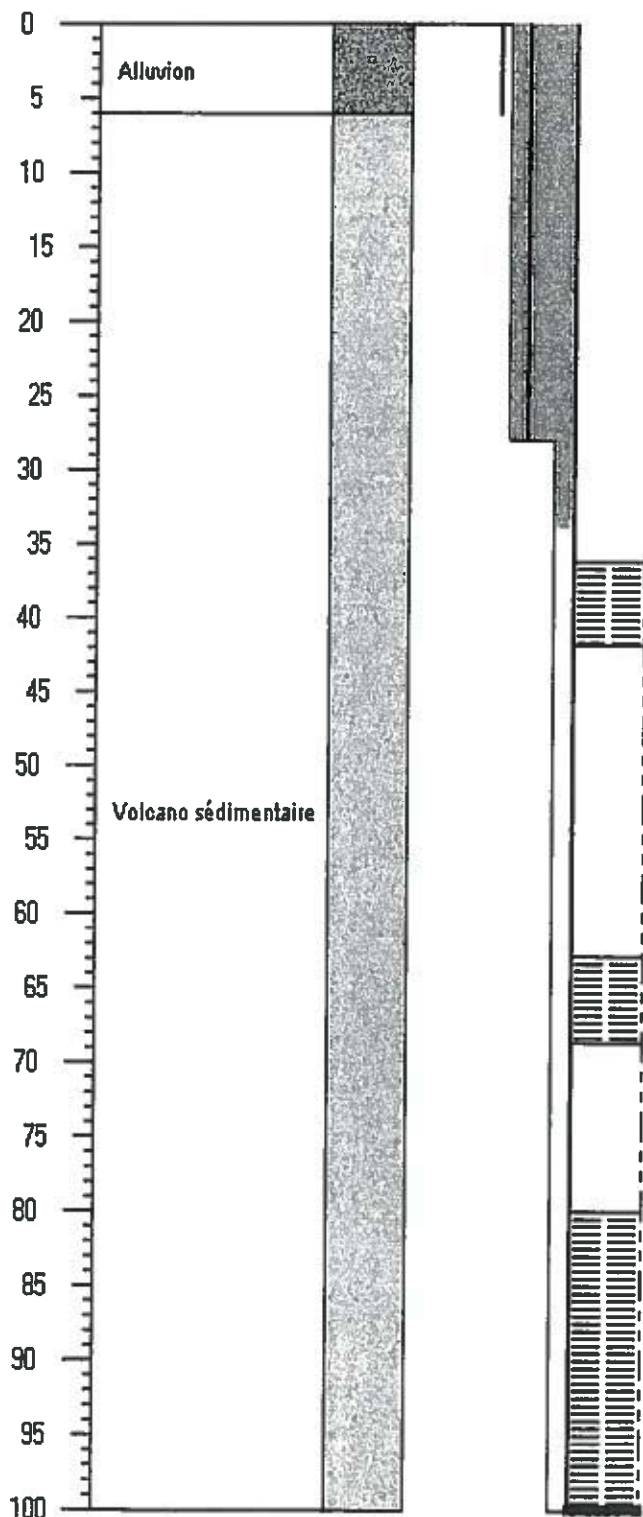

F: 381 mm (15")
T: 406 mm (16")

F: 381 mm (15")
T: 323 mm (12 3/4")

F: 264 mm (10")
T: 195 mm (7 7/8")

Travaux réalisés

du : 07/01/2002

au : 16/01/2002

Développement et pompages

du :

au :

DébitFinal : 50 m³/h

Rabatt: m

A Louvigné...
Le 24.01.02.

Conforme
EURO FORAGE
au forage exécuté

SARL au Capital de 150.000 Frs

ZA Route du Mans

53210 LOUVIGNE

Tél. 02 43 26 17 80 - Fax 02 43 26 17 01
R.C.S. LAVAL 334 864

Signature du
Chef de chantier
