

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS003QFAW


**TRAVAUX DE FORAGE
POUR
LES BESOINS
DE LA PAC**

**à
Vésigneul sur marne (51)**

Affaire suivie par :

Monsieur DUVIVIER Daniel

**TRAVAUX REALISES
LE
30 Mars 2017**

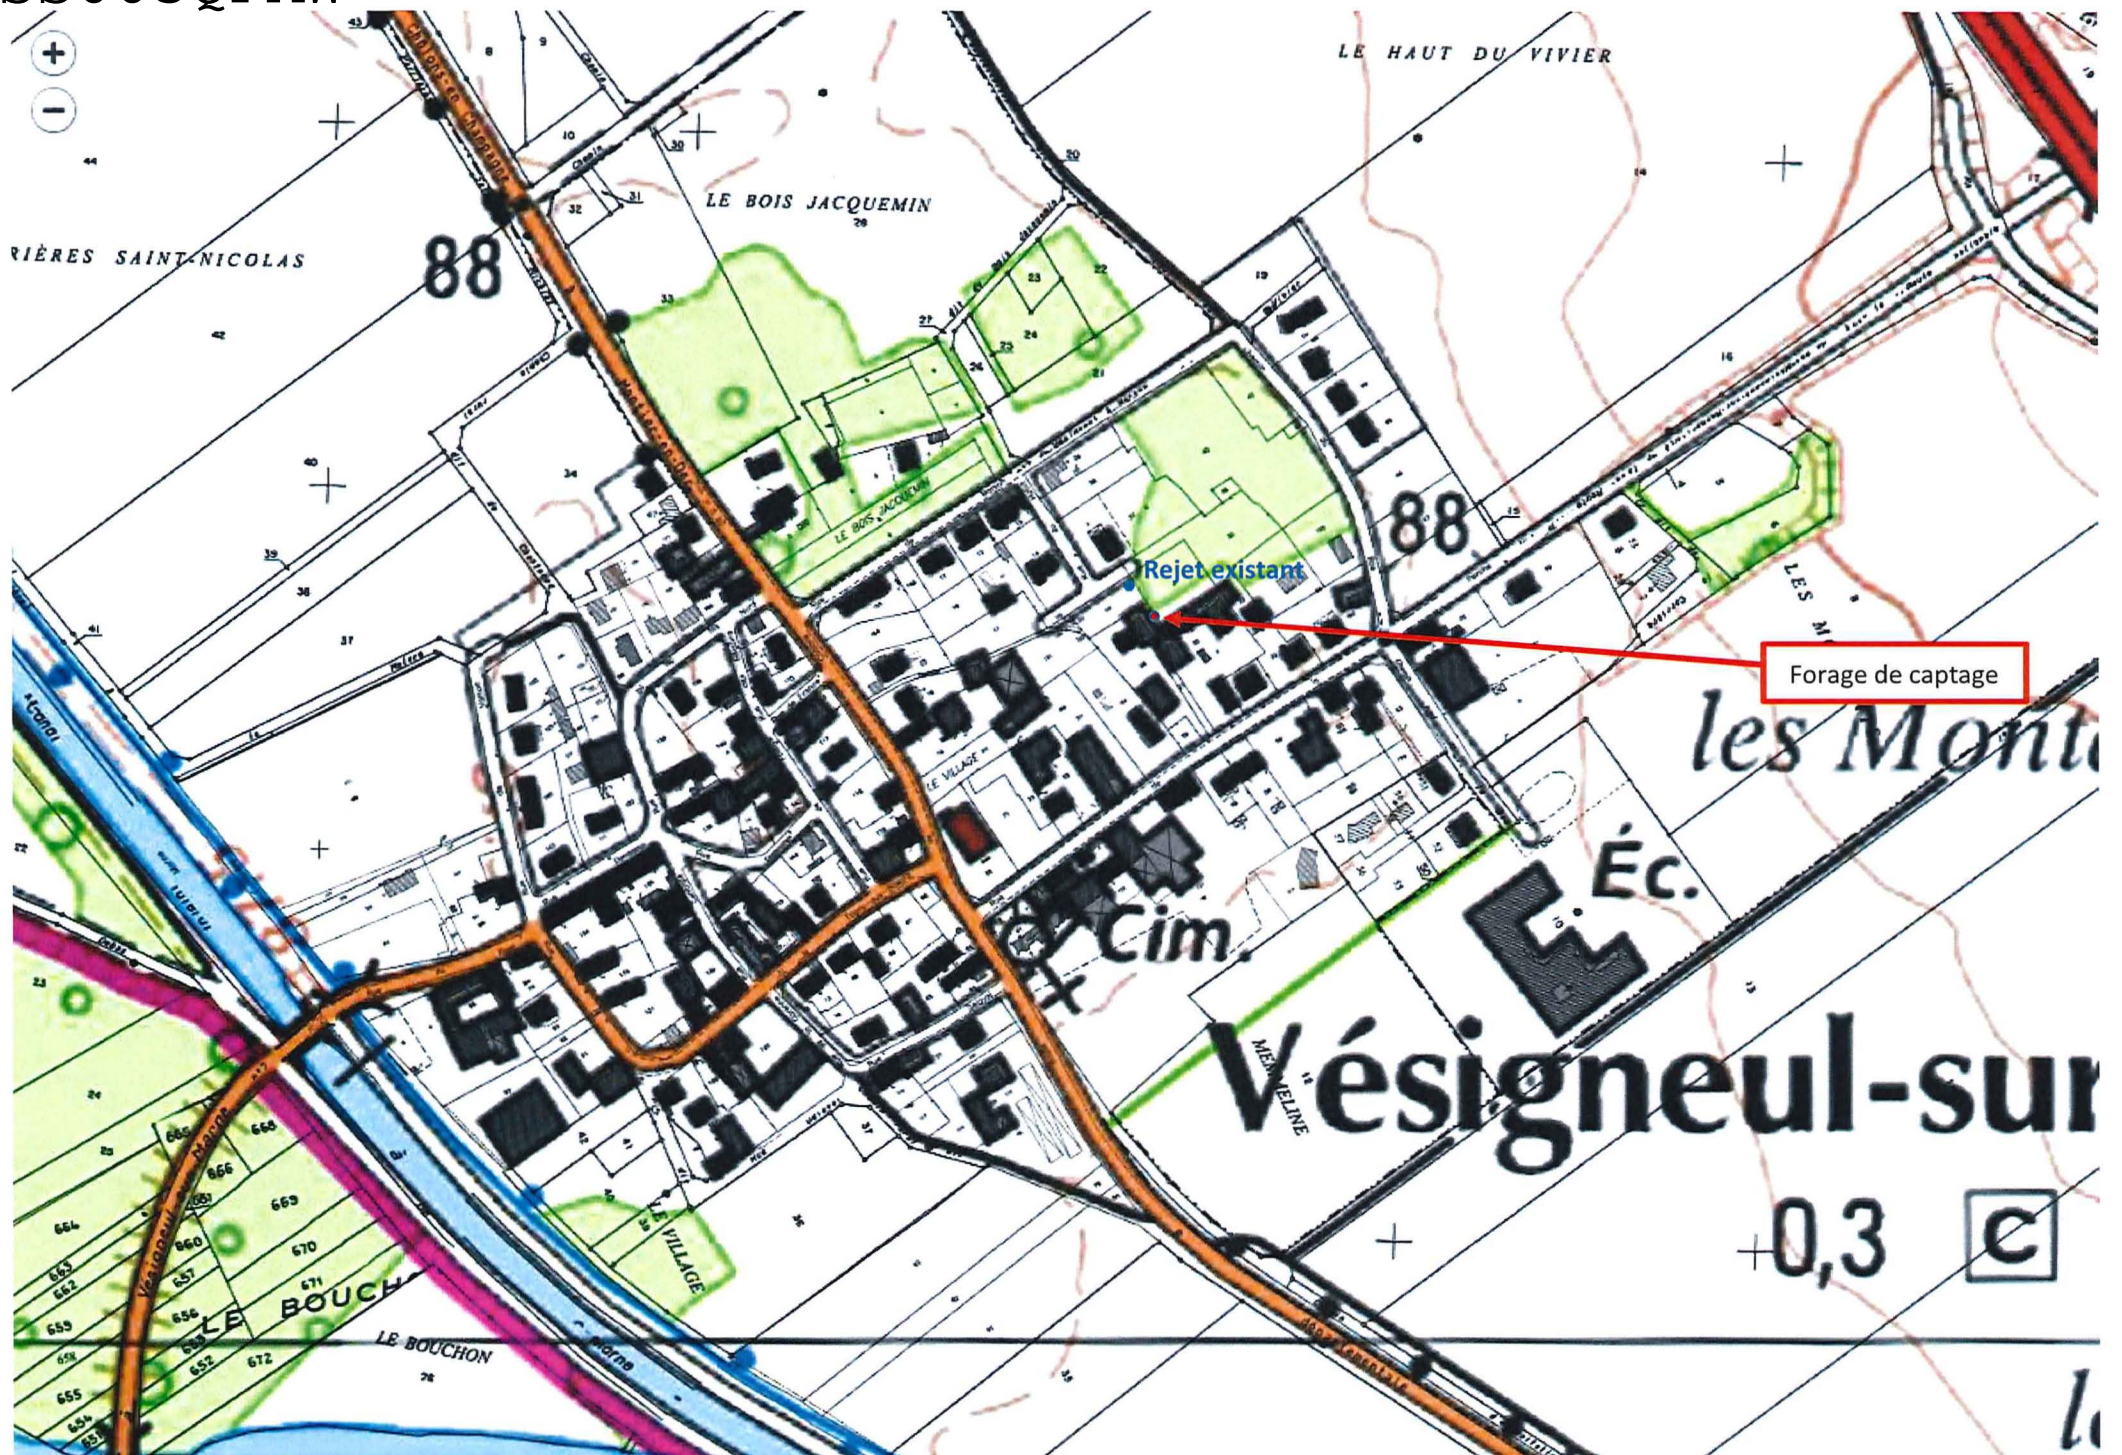

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mr DUVIVIER Daniel, 7 rue de la Perche - 51240 Vésigneul sur Marne	
Date :	30/03/2017	n° Inst. : 1772
Affaire suivie par :	Vous-même	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC	
Lieu du chantier :	Vésigneul sur Marne	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale : 18,79

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	7,50	280	Tarière	à sec
7,50	8,30	200	Battage	à sec
8,30	20,00	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	8,30	200	200/184	PVC		x
-0,40	10,00	140	140/126	PVC		x
10,00	18,80	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	Mr DUVIVIER Daniel, 7 rue de la Perche - 51240 Vésigneul sur Marne		
Date :	30/03/2017	n° Inst. :	1772
Affaire suivie par :	Vous-même		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC		
Lieu du chantier :	Vésigneul sur Marne		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	7,50	CPJ45	x		280	200
0,00	8,30	CPJ45	x		184	140
8,30	9,50	CPJ45	x		171	140
9,50	10,00	Jupe			171	140

POMPAGE	NS (m) :	2,67	Côte / Sol (m):	0,4	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	------	-----------------	-----	---------	---------

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
2,90	13,00	1h
2,74	6,00	87h
Acidification :		0 tonne(s)
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
2,74	6,00	87h
Débit spécifiques		
Q' =	85,71	m ³ / h / m

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mr DUVIVIER Daniel, 7 rue de la Perche - 51240 Vésigneul sur Marne	
Date :	30/03/2017	n° Inst. : 1772
Affaire suivie par :	Vous-même	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC	
Lieu du chantier :	Vésigneul sur Marne	

