


## Rapport et Coupe technique du forage

**Chantier:**

**Observations:** Nous réalisons le forage avec mise en place des sondes et remplissage de coulis géothermique (cimentation).

Les raccordements et mise en service (PAC) sont réalisés par le chauffagiste.

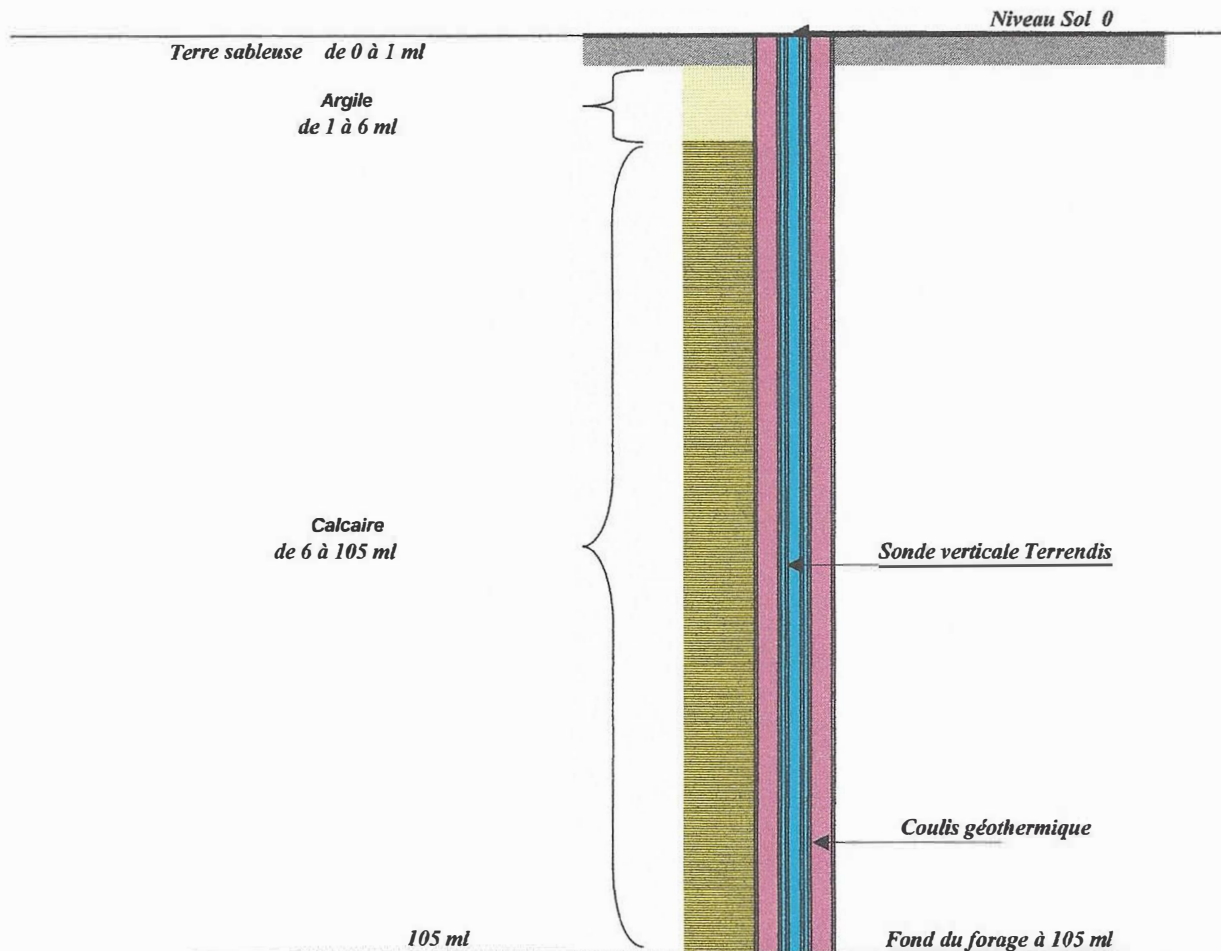

**Date de réalisation:**

Du 11 avril au 20 avril 2017

**Déroulement général du chantier:**

Chantier qui s'est très bien déroulé, 6 mètres de caisings  
Marteau fond de trou.

**Nombre de forages réalisés:**

4 forages verticaux de 105 ml

**Nombre de forages exploités:**

4 forages exploités.

**Cimentation:** ( Mise en œuvre sous pression)

Le coulis géothermique employé est le Lamdamix de chez DPMF.  
160 sacs de coulis géothermique (cimentation).

**Numéros de section et parcelles des forages:**

section B parcelle n° 188

**Coordonnées localisation des forages:**

1,17044,44,78787 / 1,17055,44,78791  
1,17049,44,78781 / 1,1706,44,78784

**Nature du fluide:**

Eau glycolée mise en place par le chauffagiste.
