

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Entreprise:</b>      | <b>TRAFORDYN</b>   |
| <b>Client:</b>          | <b>MAIRIE DE TREMUSON</b><br>Place pierre michel<br>22440 TREMUSON |
| <b>Maître d'oeuvre:</b> | <b>MAIRIE DE TREMUSON</b><br>Place pierre michel<br>22440 TREMUSON |
| <b>Exploitant:</b>      | <b>MAIRIE DE TREMUSON</b><br>Place pierre michel<br>22440 TREMUSON |

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Place pierre michel  
22440 TREMUSON

**Coordonnées :** **Longitude** 269 150 **Latitude** 6 840 786 **Altitude :** 0.00 m  
**Zone** Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 31/07/2019

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 31/07/2019

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Stenuik

**Resp. Chantier :** DEVRAND

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Client:             | MAIRIE DE TREMUSON  |
| Maître d'oeuvre:    | MAIRIE DE TREMUSON  |
| Lieu de l'ouvrage : | Place pierre michel |
|                     | 22440 TREMUSON      |

## LITHOLOGIE

| De    | à     | Libellé        |
|-------|-------|----------------|
| 0.00  | 1.00  | Terre végétale |
| 1.00  | 11.00 | Schiste pourri |
| 11.00 | 50.00 | Schiste        |

## FORAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00  | 12.00 | 7"1/8 | 180.00 | M.f.t.         | Air              |
| 12.00 | 50.00 | 6"1/4 | 159.00 | M.f.t.         | Air              |

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 45.00          | 500.00           |

## TUBAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Épais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00  | 38.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 38.00 | 50.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |

## REPLISSAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Matériau | Nature           | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 12.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment   | Ciment-bentonite | Sous pression   |         |           |         |

# FORAGE D'EAU

**Travaux réalisés :**

1/1

du : 31/07/2019 au : 31/07/2019

**Client :**

**MAIRIE DE TREMUSON**

**Maitre d'oeuvre :**

**MAIRIE DE TREMUSON**

**Localisation de l'ouvrage :** Place pierre michel

**22440 TREMUSON**

**Coordonnées de l'ouvrage :**

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 269 150


Latitude (Y): 6 840 786

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/251

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

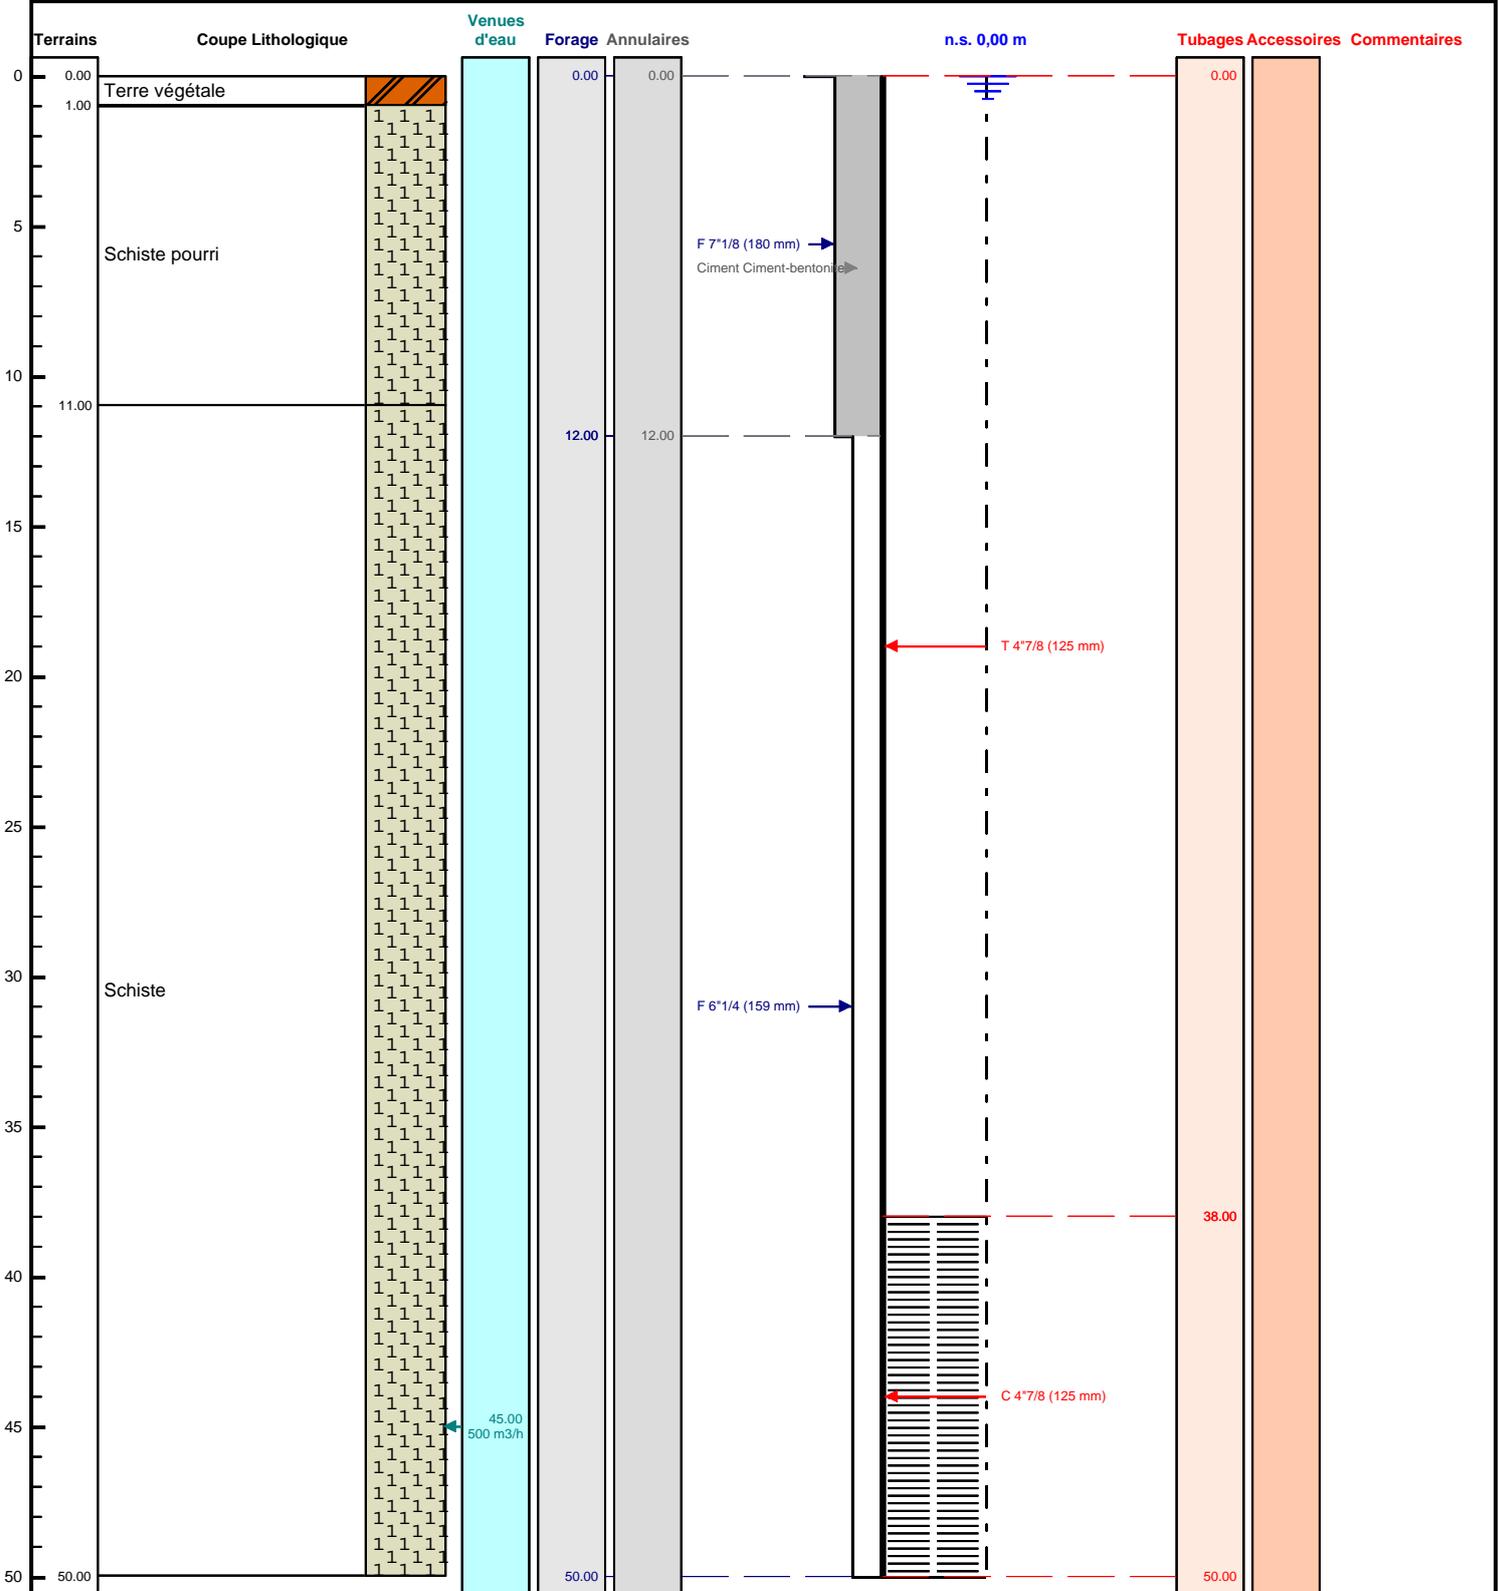

Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise
