

**S.A.R.L. BONIFACE**

**ENTREPRISE DE FORAGE**

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : [www.boniface-51.com](http://www.boniface-51.com)

# **TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES**

à  
**Les Mesneux (51)**


**BSS004AZQG**

**TRAVAUX REALISES  
LES  
23 et 24 Novembre 2020**

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso

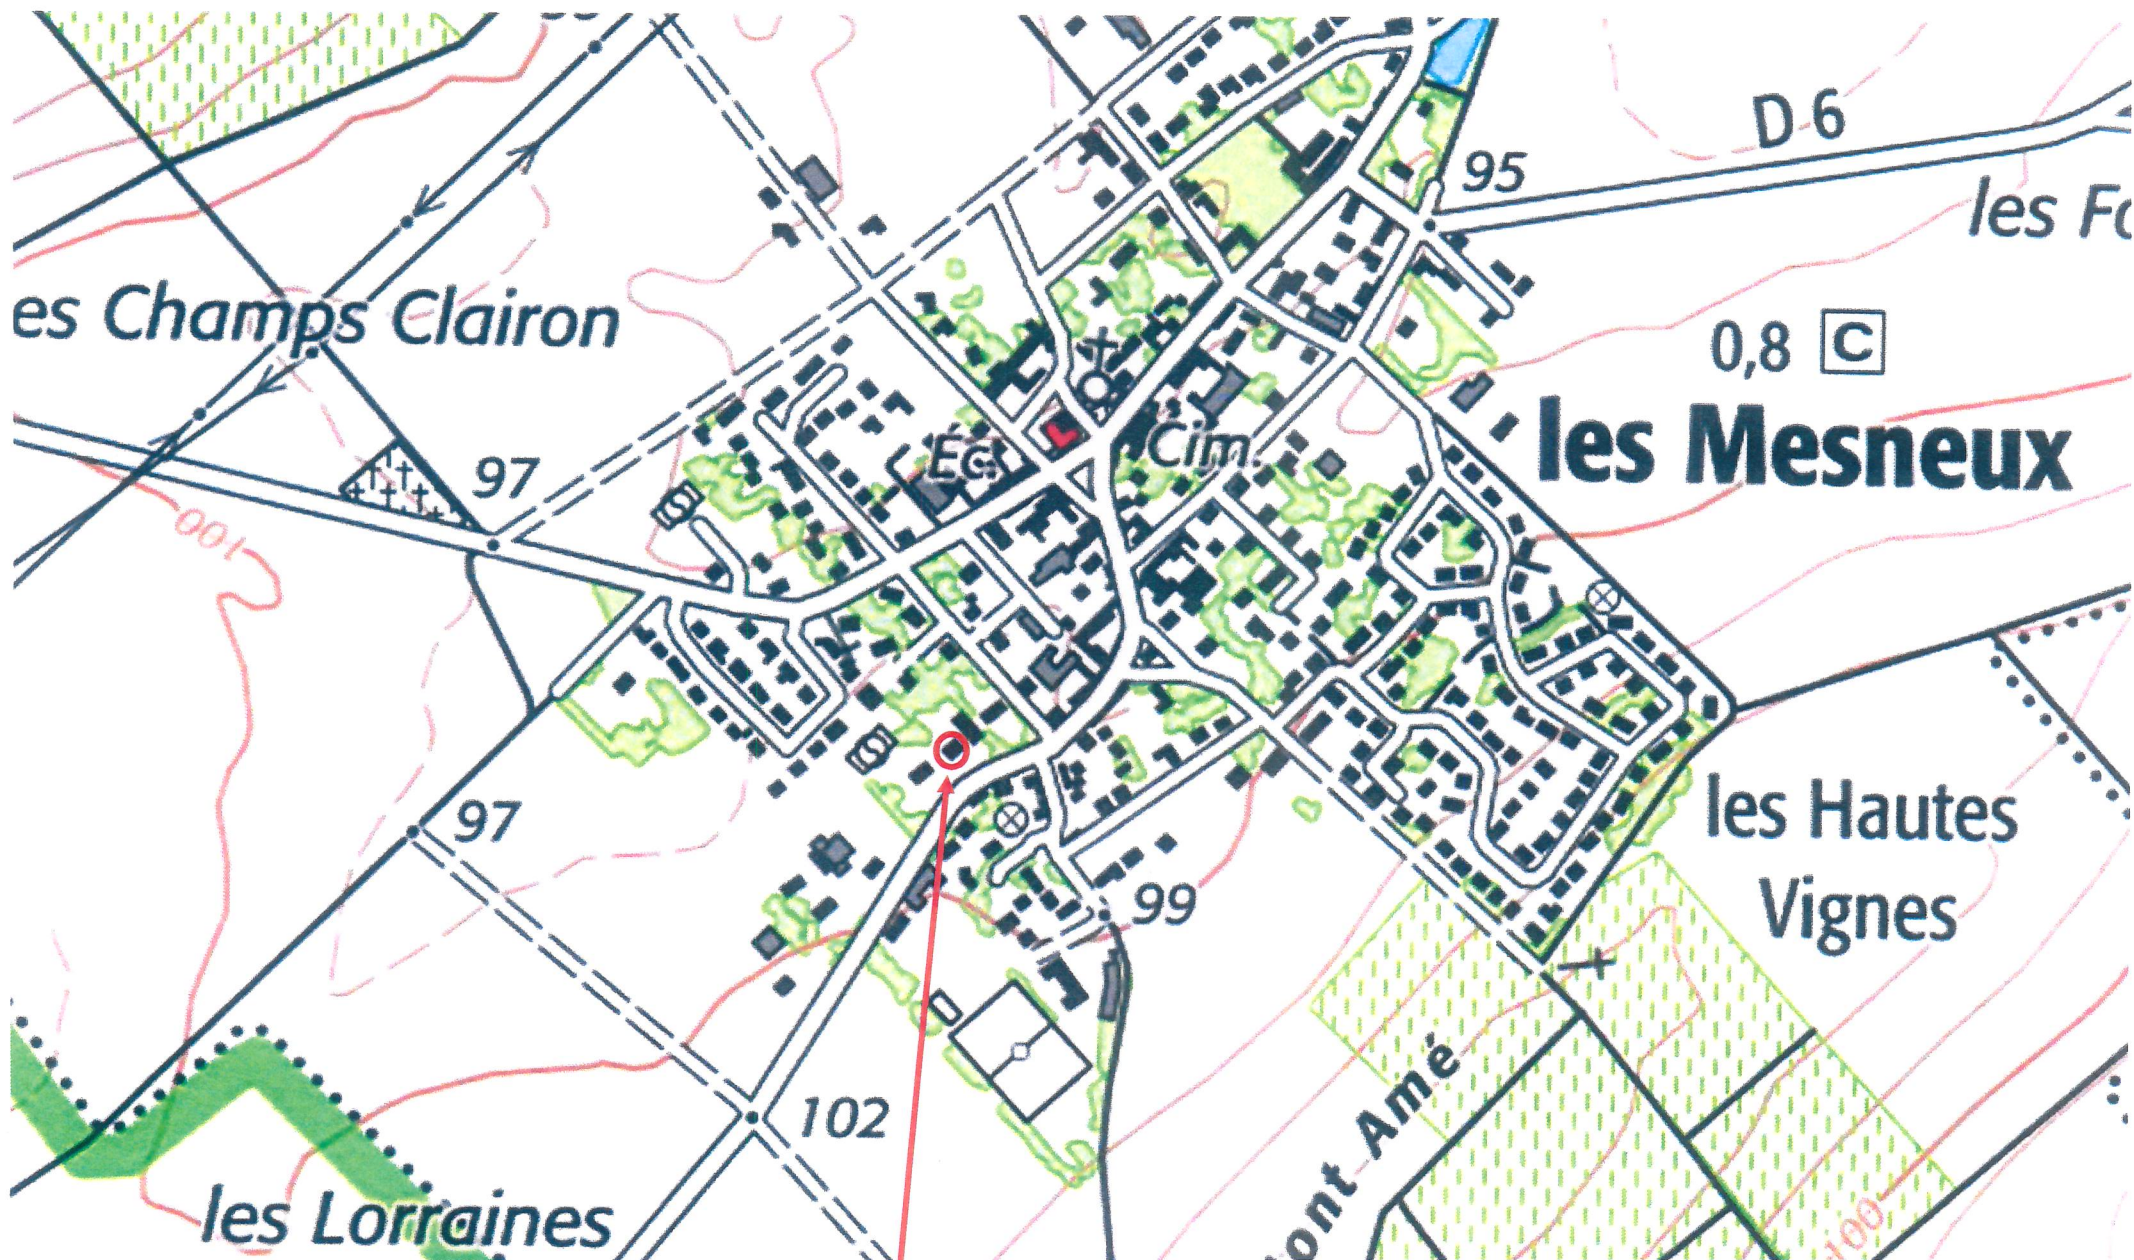

PROJET  
Alt : 98.50 m

BSS004AZQG

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b>	<b>Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b>	<b>TEL : 03.26.97.11.61</b>
<b>Client :</b>	<b>20 rue de Villedommange - 51370 Les Mesneux</b>	
<b>Date :</b>	<b>23/11/2020</b>	<b>n° DREAL : 2275/2020</b>
<b>Affaire suivie par :</b>		
<b>Type de chantier :</b>	<b>Forage d'eau pour les besoins domestiques</b>	
<b>Lieu du chantier :</b>	<b>Les Mesneux (51)</b>	

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	35,70
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	2,00	311	Tarière	à sec
2,00	35,70	180	Rotary	Eau

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	2,00	225	225/200	PVC		x
-0,50	7,00	140	140/126	PVC		x
7,00	35,70	140	140/126	PVC	x 2 mm	

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b> Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		<b>TEL :</b> 03.26.97.11.61
<b>Client :</b>	20 rue de Villedommange - 51370 Les Mesneux	
<b>Date :</b>	23/11/2020	<b>n° DREAL :</b> 2275/2020
<b>Affaire suivie par :</b>		
<b>Type de chantier :</b>	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
<b>Lieu du chantier :</b>	Les Mesneux (51)	

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	2,00	CPJ45	x		311	225
0,00	6,50	CPJ45	x		180	140
6,50	7,00	Jupe			180	140

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	20,15	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	SP 19
----------------	----------	-------	-----------------	------	---------	-------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
25,43	11,00	0h15
25,51	11,00	0h30
25,53	11,00	1h00
Pompe à -34 m		
Acidification :	-	tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
21,90	6,50	1h30
22,03	6,50	16h
Pompe à -24 m		
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
Arrêts / démarrages : 2		
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m <sup>3</sup> )	Temps
22,03	6,50	16h
Débit spécifiques		
Q' =	3,46	m <sup>3</sup> / h / m

**Coordonnées :**

- X : 3.958209 °
- Y : 49.217162 °
- Z : 98,60 m

**Observations :** ce forage peut être exploité à 5 m³/h sans sur pompage ni démarrages rapprochés (pas plus de 12 démarrages à l'heure selon les normes des constructeurs des pompes).

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	20 rue de Villemommange - 51370 Les Mesneux	
Date :	23/11/2020	n° DREAL : 2275/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Les Mesneux (51)	

