

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Monsieur LANDUYT Olivier, 17 Grande Rue - 02270 Couvron et Aumencourt	
Date :	17/09/2021	n° DRIRE : 234/02/2021
Affaire suivie par :	Monsieur LANDUYT Olivier	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Couvron et Aumencourt, Remies (02)	

POMPAGE PAR PALIERS


Date :	23/09/2021	Forage	F Ferme	F Pivot	Riv. Broyon
Heure déb :	9h34	Niveau départ :	- 5,27 m	- 3,29 m	- 8,38 m
Heure fin :	14h35	Hauteur du repère :	+ 0,50 m	0,00 m	0,00 m
		Refoulement :			

Palier 1					
Temps	ND Forage	Débit	F Ferme	F Pivot	Broyon
3mn	5,588	48,20	3,289	8,380	2,001
4mn	5,592	48,07	3,293	8,380	2,001
6mn	5,600	47,58	3,289	8,380	2,001
8mn	5,606	47,83	3,293	8,380	2,002
10mn	5,612	47,45	3,289	8,380	2,000
15mn	5,622	47,45	3,289	8,380	2,002
20mn	5,632	47,32	3,289	8,380	2,004
30mn	5,657	47,45	3,293	8,380	2,002
40mn	5,663	47,95	3,293	8,380	2,003
50mn	5,669	48,45	3,293	8,380	2,003
60mn	5,674	47,58	3,293	8,380	2,003

Palier 2 <i>Niv. Départ : 5,33 m</i>					
Temps	ND Forage	Débit	F Ferme	F Pivot	Broyon
3mn	6,034	93,73	3,293	8,380	2,003
4mn	6,031	93,73	3,293	8,380	2,001
6mn	6,049	93,73	3,293	8,380	2,001
8mn	6,066	93,12	3,293	8,380	2,001
10mn	6,079	94,22	3,293	8,380	2,000
15mn	6,095	94,73	3,293	8,380	1,994
20mn	6,106	93,73	3,293	8,380	1,999
30mn	6,123	93,73	3,293	8,380	2,002
40mn	6,124	94,10	3,293	8,380	2,003
50mn	6,137	94,73	3,293	8,380	2,001
60mn	6,146	93,50	3,293	8,380	2,001

Palier 3 <i>Niv. Départ : 5,36 m</i>					
Temps	ND Forage	Débit	F Ferme	F Pivot	Broyon
3mn	6,426	136,07	3,293	8,380	1,993
4mn	6,460	137,43	3,293	8,380	1,995
6mn	6,522	136,58	3,293	8,380	1,993
8mn	6,538	136,95	3,293	8,380	1,995
10mn	6,554	136,95	3,293	8,380	1,993
15mn	6,576	136,45	3,293	8,380	1,993
20mn	6,601	135,82	3,293	8,380	1,990
30mn	6,622	135,10	3,293	8,380	1,988
40mn	6,642	136,07	3,293	8,380	1,985
50mn	6,654	136,70	3,293	8,380	1,984
60mn	6,655	136,58	3,293	8,380	1,984

Pompage par paliers sur le forage de Mr LANDUYT à Couvron-et-Aumencourt le 23/09/2021

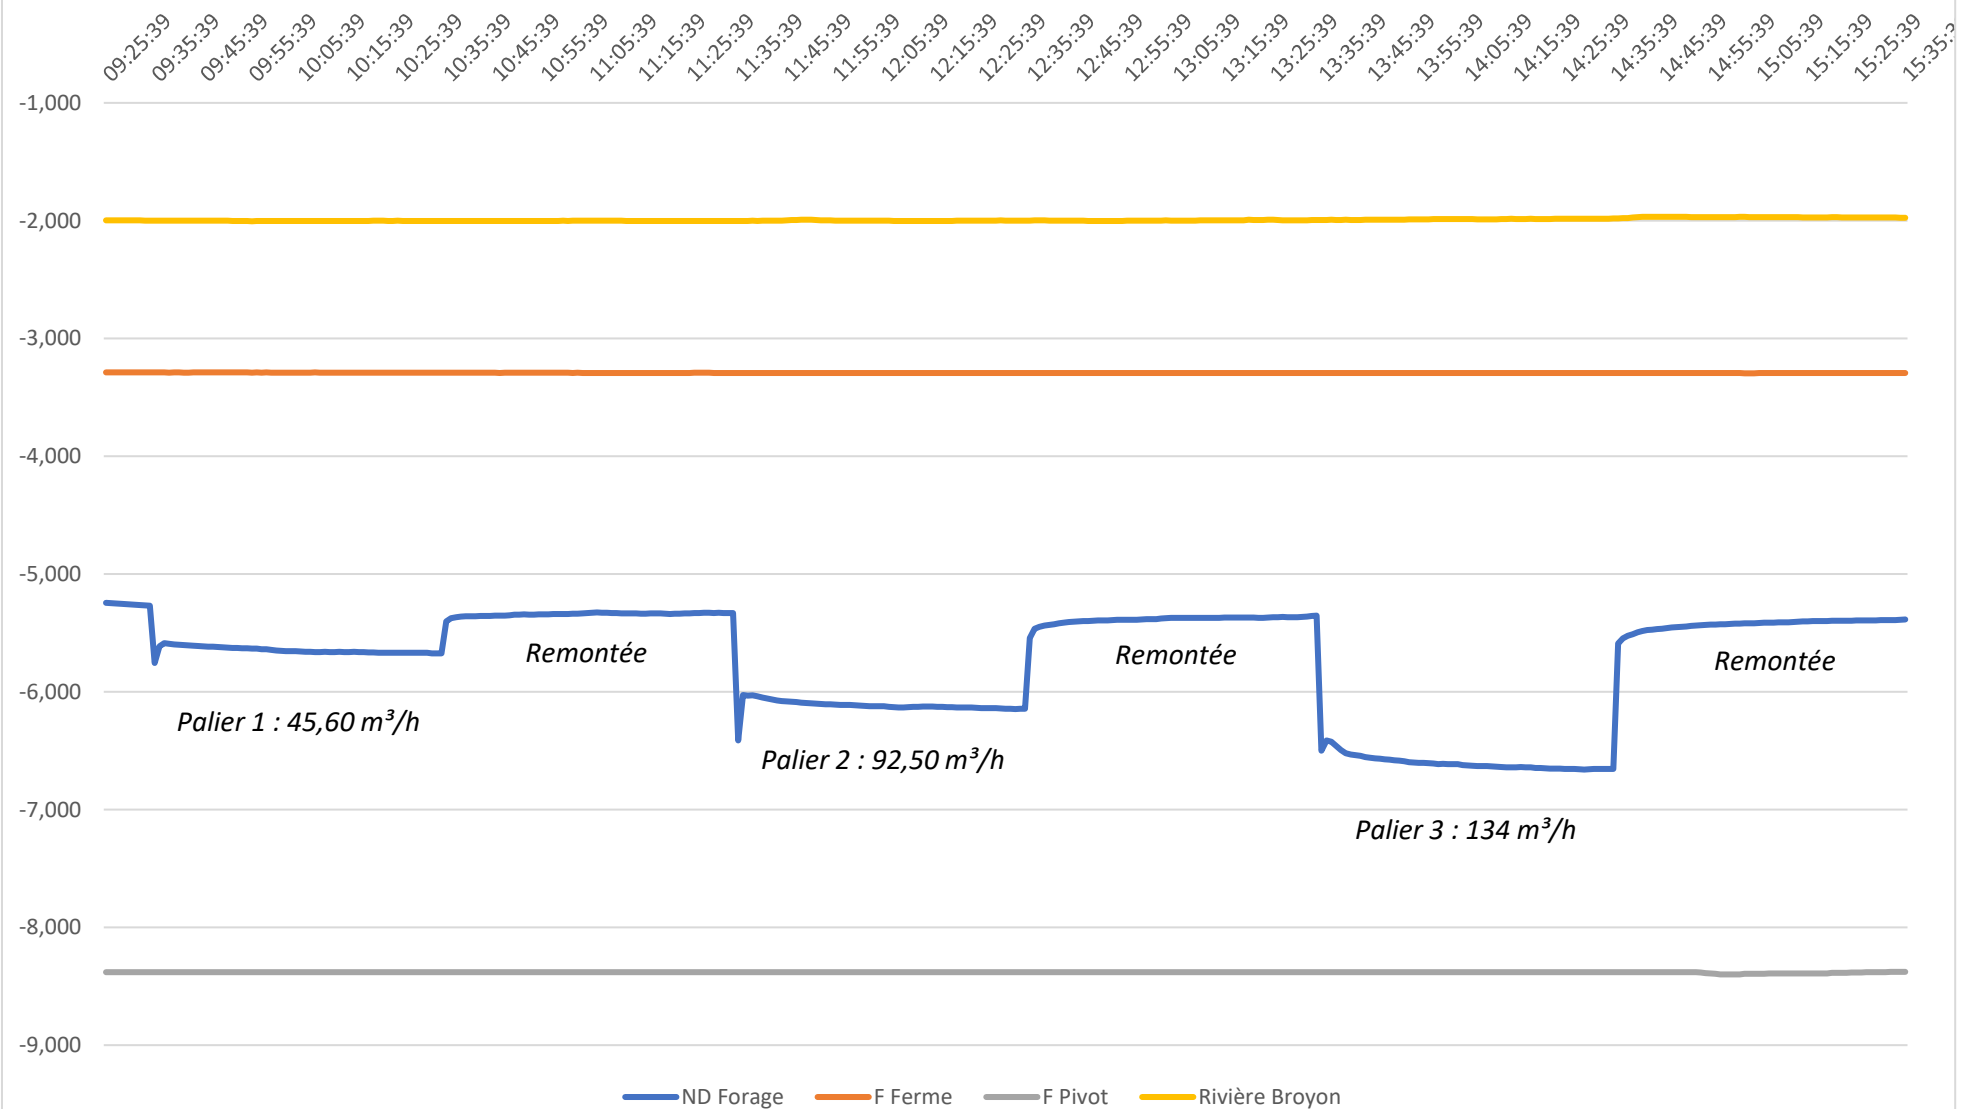

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Monsieur LANDUYT Olivier, 17 Grande Rue - 02270 Couvron et Aumencourt	
Date :	17/09/2021	n° DRIRE : 234/02/2021
Affaire suivie par :	Monsieur LANDUYT Olivier	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Couvron et Aumencourt, Remies (02)	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	27/09/2021	Forage	F Ferme	F Pivot	Riv. Broyon
Heure déb :	9h39	Niveau départ :	- 5,25 m	- 3,12 m	- 8,39 m
Heure fin :	15h40	Hauteur du repère :	+ 0,50 m	0,00 m	0,00 m
	le 28/09	Refoulement :	250,00 m	-	-

Descente (pompage)

Temps	ND Forage	Debit	F Ferme	F Pivot	Riv. Broyon	Obs.
1mn	6,420		3,317	8,388	1,989	
1mn30						
2mn	6,231		3,317	8,388	1,989	
2mn30						
3mn	6,231	121,80	3,317	8,388	1,987	
3mn30						
4mn	6,258		3,317	8,388	1,987	
4mn30						
5mn	6,291		3,317	8,388	1,988	
6mn	6,317		3,317	8,388	1,989	
7mn	6,332		3,317	8,388	1,987	
8mn	6,342		3,317	8,388	1,987	
9mn	6,351		3,317	8,388	1,989	
10mn	6,356	121,00	3,317	8,388	1,989	
12mn	6,371		3,317	8,388	1,989	
14mn	6,381		3,317	8,388	1,988	
16mn	6,390		3,317	8,388	1,988	
18mn	6,397		3,317	8,388	1,990	
20mn	6,403		3,317	8,388	1,990	
25mn	6,417		3,317	8,388	1,990	
30mn	6,423		3,317	8,388	1,991	
45mn	6,445		3,317	8,388	1,987	
1h	6,459	121,00	3,317	8,388	1,987	
1h30	6,481		3,317	8,388	1,987	
2h	6,497		3,317	8,388	1,989	
3h	6,517		3,317	8,388	1,989	
4h	6,530		3,317	8,388	1,985	
5h	6,539		3,317	8,388	1,983	
6h	6,550		3,317	8,392	1,980	
7h	6,563		3,321	8,392	1,981	
8h	6,566		3,321	8,392	1,978	
9h	6,572		3,321	8,395	1,977	
10h	6,575	121,00	3,321	8,395	1,978	
12h	6,589		3,321	8,400	1,981	
15h	6,601		3,325	8,400	1,982	
18h	6,613		3,329	8,404	1,985	
21h	6,622		3,325	8,400	1,986	
24h	6,632		3,685	8,404	1,990	
27h	6,641		3,371	8,404	1,990	
30h	6,642	121,00	3,330	8,404	1,984	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Monsieur LANDUYT Olivier, 17 Grande Rue - 02270 Couvron et Aumencourt	
Date :	17/09/2021	n° DRIRE : 234/02/2021
Affaire suivie par :	Monsieur LANDUYT Olivier	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Couvron et Aumencourt, Remies (02)	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	27/09/2021	Forage	F Ferme	F Pivot	Riv. Broyon
Heure déb :	9h39	Niveau départ :	- 5,25 m	- 3,12 m	- 8,39 m
Heure fin :	15h40	Hauteur du repère :	+ 0,50 m	0,00 m	0,00 m
	le 28/09	Refoulement :	250,00 m	-	-

Remontée (Arrêt)

Temps	ND Forage	Débit	F Ferme	F Pivot	Riv. Broyon	Obs.
1mn	5,650	-	3,330	8,404	1,984	
1mn30		-				
2mn	5,631	-	3,330	8,404	1,985	
2mn30		-				
3mn	5,612	-	3,330	8,404	1,984	
3mn30		-				
4mn	5,603	-	3,330	8,404	1,984	
4mn30		-				
5mn	5,596	-	3,330	8,404	1,984	
6mn	5,586	-	3,330	8,404	1,982	
7mn	5,580	-	3,330	8,404	1,982	
8mn	5,577	-	3,330	8,404	1,979	
9mn	5,572	-	3,330	8,404	1,979	
10mn	5,564	-	3,330	8,404	1,979	
12mn	5,549	-	3,330	8,404	1,982	
14mn	5,540	-	3,330	8,404	1,982	
16mn	5,536	-	3,330	8,404	1,981	
18mn	5,531	-	3,330	8,404	1,981	
20mn	5,531	-	3,330	8,404	1,979	
25mn	5,517	-	3,330	8,404	1,983	
30mn	5,497	-	3,326	8,404	1,980	
45mn	5,491	-	3,326	8,404	1,980	
1h	5,472	-	3,326	8,400	1,978	
1h30	5,456	-	3,326	8,400	1,978	
2h	5,440	-	3,326	8,400	1,980	
3h	5,427	-	3,326	8,400	1,977	
4h	5,417	-	3,325	8,395	1,977	
5h	5,419	-	3,325	8,395	1,978	
6h	5,420	-	3,325	8,400	1,979	
7h	5,422	-	3,324	8,400	1,979	
8h	5,425	-	3,328	8,400	1,982	
9h	5,426	-	3,329	8,400	1,980	
10h	5,427	-	3,329	8,400	1,983	
12h	5,432	-	3,330	8,400	1,984	
15h	5,439	-	3,331	8,400	1,983	
18h	5,455	-	3,332	8,404	1,974	
19h	5,459	-	3,336	8,404	1,974	
24h		-				

Pompage de 30h à 121 m³/h sur le forage de Mr LANDUYT à Couvron et Aumencourt les 27 et 28/09/2021

