



## TRONCONS de L'OUVRAGE

HTZ\_01

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Rue du Berceau

95700

ROISSY EN FRANCE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblai
1.00	18.00	Calcaire de Saint Ouen
18.00	18.40	Sables de Monceau

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.40	5"7/8	150.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

## REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.50	Rebouc	0.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
0.50	7.90	Rebouc	0.00	Billes-argile	Oregonite				
7.90	18.40	Rebouc	0.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Autre		

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Bouchon
0.00	0.00	Capot
18.40	18.40	Bouchon

Code BSS : BSS004ASMM / HTZ0

HTZ\_01

Travaux réalisés :  
du : 04/08/2020 au : 04/08/2020

1/1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Rue du Berceau

95700

ROISSY EN FRANCE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 665 662


Latitude (Y): 6 878 600

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/92

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

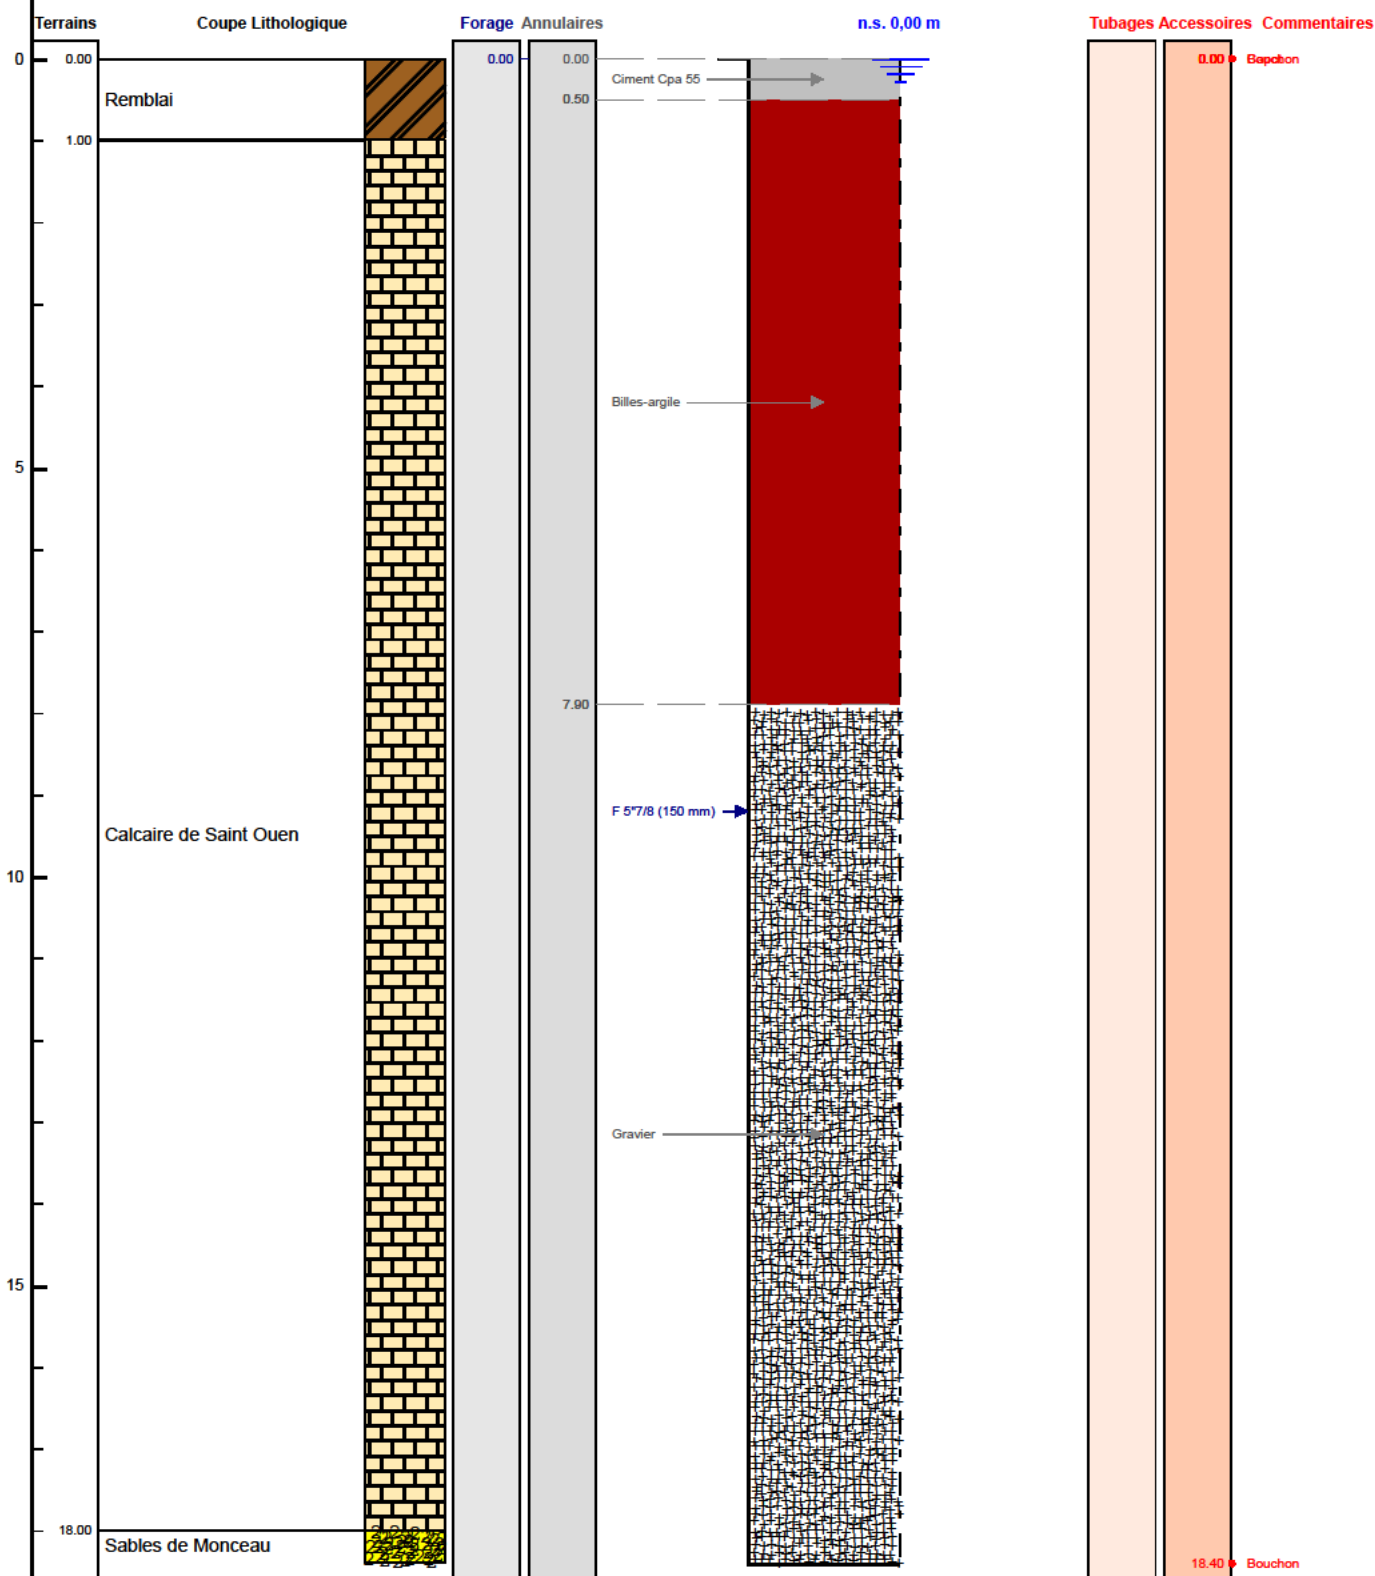

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique    Long.: 665 662    Lat.: 6 878 600    Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
