

FORAGE D'EAU

Entreprise: SARL PROSPER FORAGES

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004FYTU

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Sur le rive de la Gave d'Oloron
64270 ESCOS

Coordonnées : **Longitude** 375 619 **Latitude** 6 269 837 **Altitude :** 27.21 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 26/10/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 27/10/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE XL 140

Resp. Chantier :

Date début pompage : 02/11/2022

Niveau statique non perturbé : 5.21 m

Date fin de pompage : 02/11/2022

Débit Maxi. d'essai : 46.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 0.51 m

Notes : TEST DE POMPAGE

16m3/hr ND = 5,29m // 25m3/hr ND = 5,37m // 35m3/hr ND = 5,53m // 46m3/hr ND = 5,72m // 55m3/hr ND = 5,90 - Niveau pas stable

Notes (suite) :

Notes

Mercredi 26/10/2022

08H00 à 10h00 : Preparation chantier

10h00 : Depart Seignosse

11h30 : Mise en place à Escos

12h30 : Début foration

15h00: 12m forés, retour au depot

27/10/2022

08h30 : Depaert atelier

09h30 : Foration de 12m à 15m

10h00 : Equipement forage

12h00 à 12h30 : Pause repas

14h00: Fin de l'equipement et rangement chantier

14h45: Replis du materiel



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Sur le rive de la Gave d'Oloron

64270 ESCOS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE MARRON
1.00	2.50	TERRE MARRON ET CAILLOU
2.50	4.00	GRAVE SECHES ET TERRES MARRON
4.00	6.50	TERRE MARRON ET GRAVES
6.50	8.00	GRAVES ARGILEUSES HUMIDES
8.00	13.00	GRAVES ET SABLE + EAU
13.00	15.00	MARNE ARGILEUSE GRISE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	12"1/8	307.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	11.00	7"1/8	180.00	6.50		P.v.c.	Tube-plein		
11.00	15.00	7"1/8	180.00	605.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	8
15.00	15.10	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	7"1/8	180.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
3.00	3.70	7"1/8	180.00	Billes-argile	Sopranite				
3.70	15.00	7"1/8	180.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socle beton 1,75m x 1,75m x 0,30m
0.00	0.30	Tube de protection de 1m en 244mm

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111
du : 26/10/2022 au : 27/10/2022

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Sur le rive de la Gave d'Oloron

64270 ESCOS

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 375 619


Latitude (Y): 6 269 837

Altitude sol (Z): +27,210 m

Echelle : 1/76

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

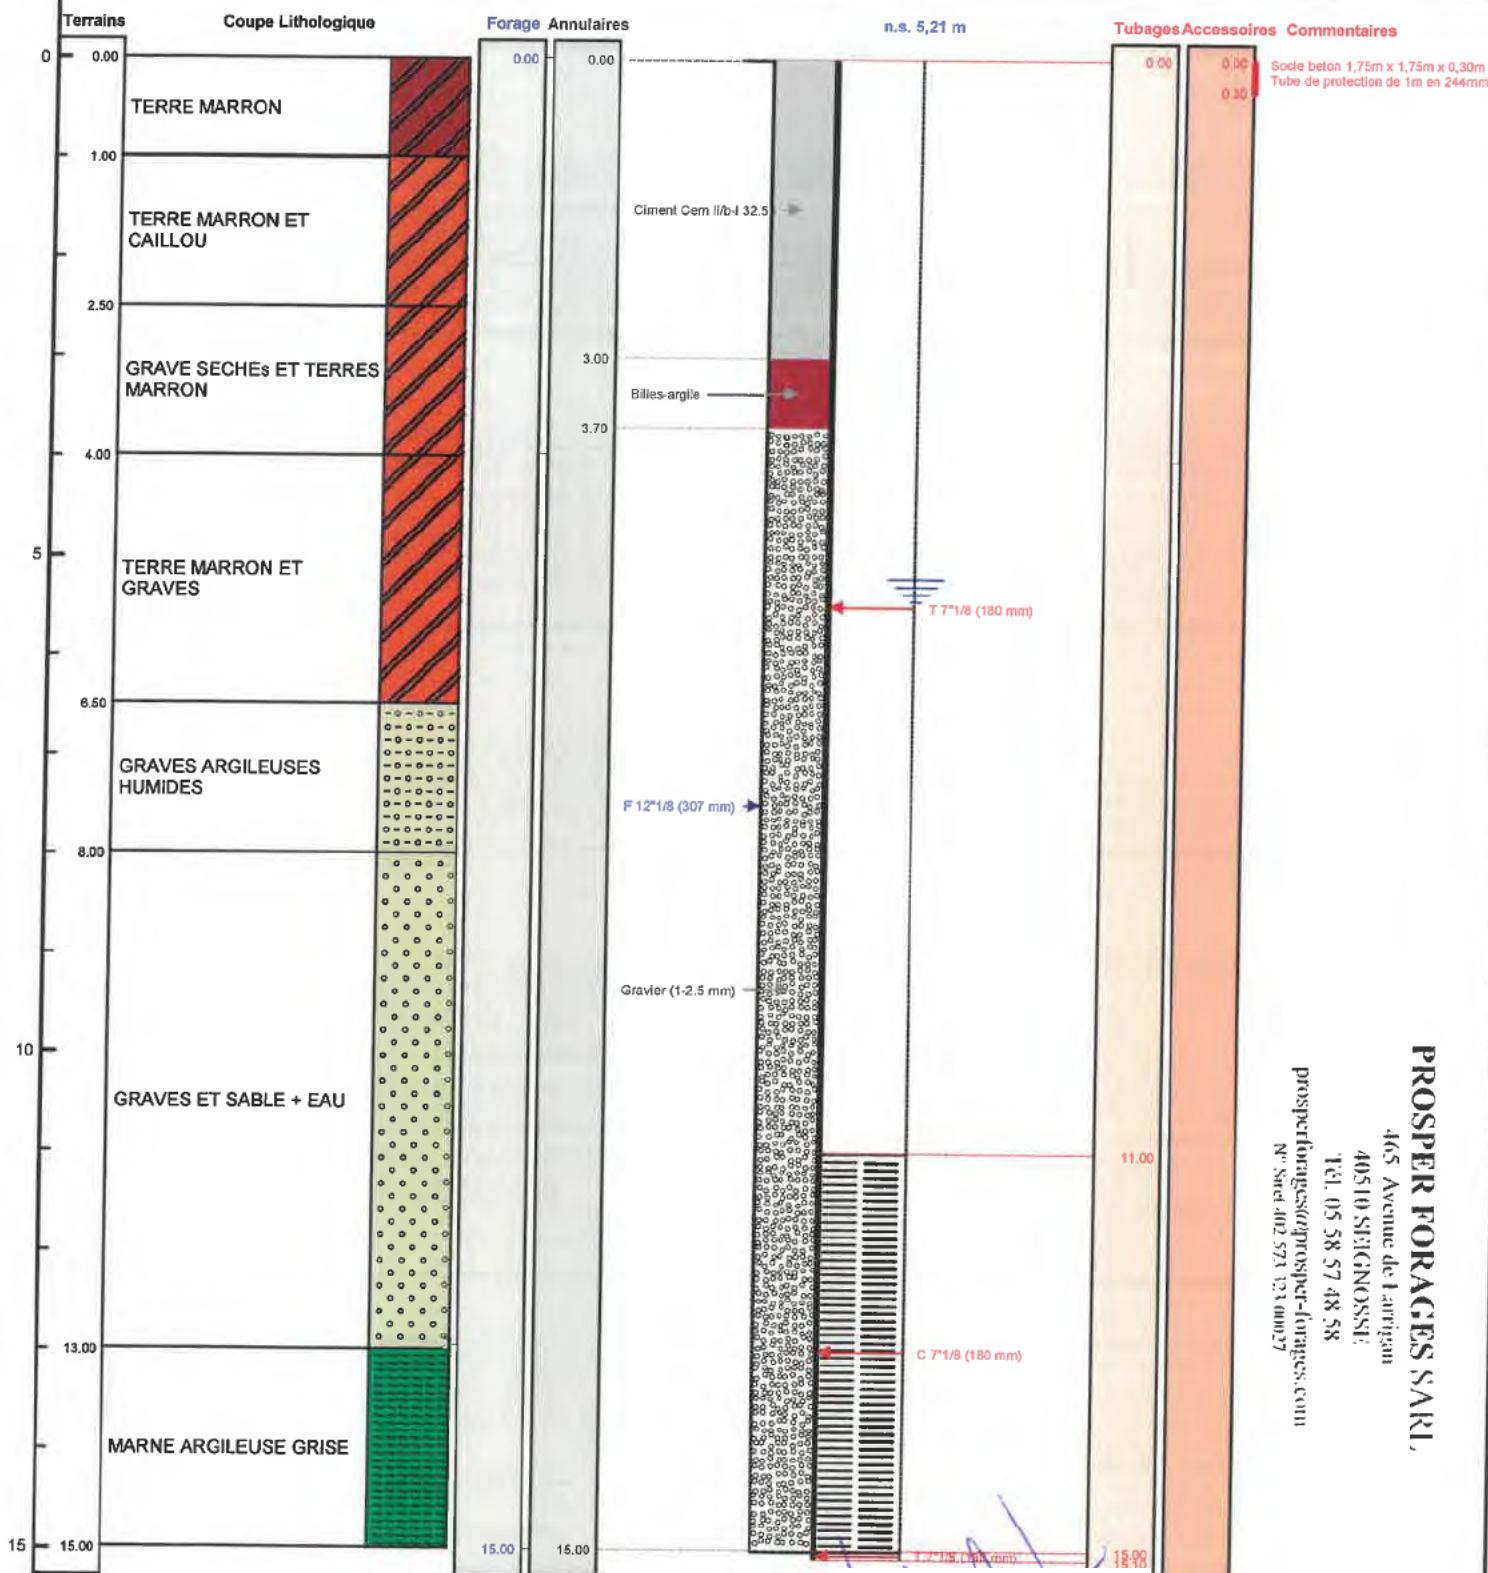

Le 3.11.2022 à SEIGNOSSE
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 375 619 Lat.: 6 269 837 Alt.: +27,210 m

PAGE: 4
