

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BOURGEOIS FORAGE
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

10100 ROMILLY SUR SEINE

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/11/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 04/11/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 5.26 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 3.24 m

Notes : REALISATION D'UN FORAGE DE POMPAGE DE 28 METRES

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	
Maître d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage :	10100 ROMILLY SUR SEINE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.40	TERRE VEGETALE
0.40	28.00	CRAIE BLANCHE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	28.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
12.00	28.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.70	8.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.14
8.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
10.00	28.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.36

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
28.00	28.00	Bouchon

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111
du : 03/11/2022 au : 04/11/2022

Client : _____
Maitre d'oeuvre : _____
Localisation de l'ouvrage : _____


10100 ROMILLY SUR SEINE

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/141

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

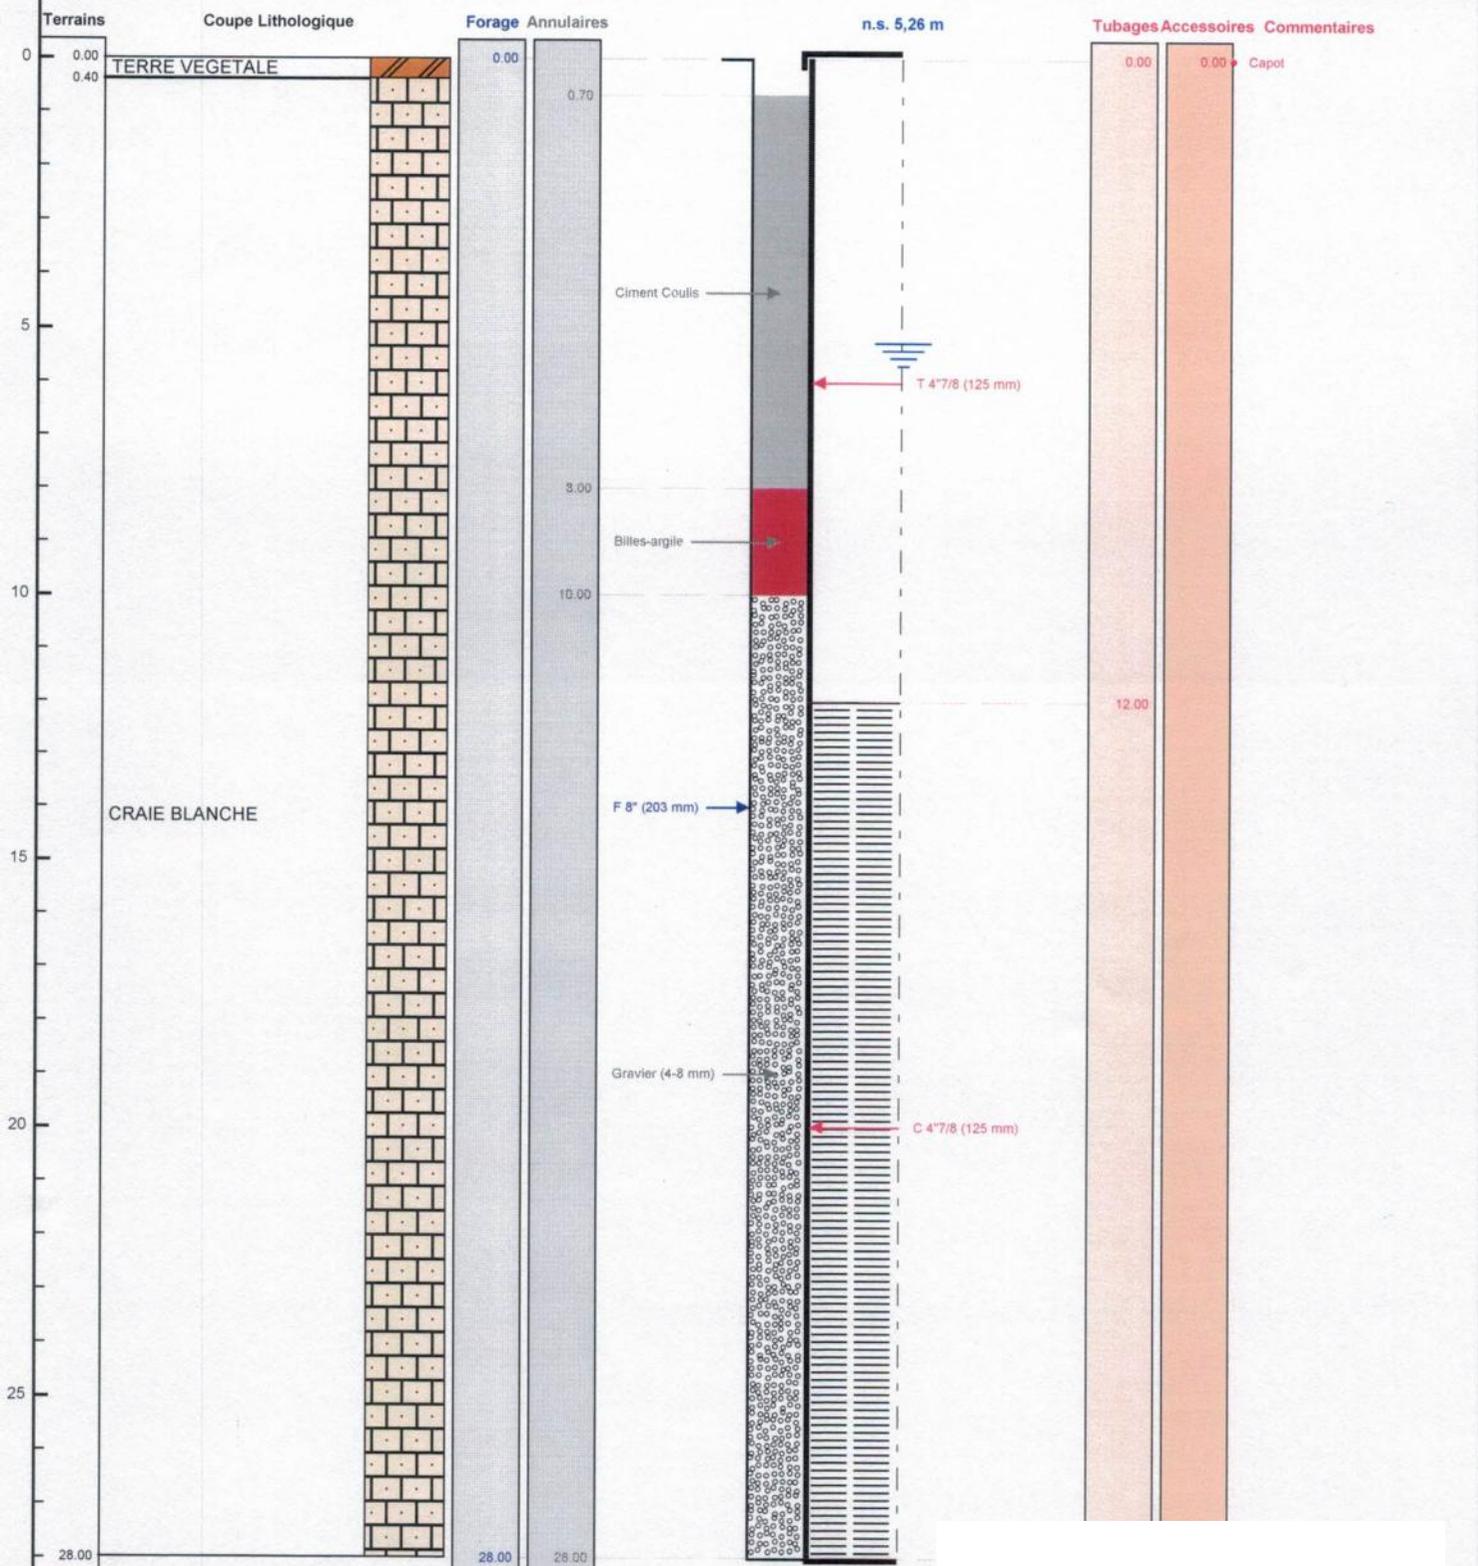

Le 14.11.2022 à *Arny de Valen*
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
