

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: BOURGEOIS FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

10280 FONTAINE LES GRES

Coordonnées :      Longitude      0      Latitude      0      Altitude :      0.00 m  
Zone      Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/06/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/06/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440

Resp. Chantier :

Date début pompage :      Niveau statique non perturbé : 1.60 m

Date fin de pompage :      Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :      Rabattement correspondant : 0.50 m

Notes : REALISATION D'UN FORAGE DE REINJECTION DE 20 METRES

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

10280

FONTAINE LES GRES

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.40	TERRE VEGETALE
0.40	2.50	CRAIE JAUNE
2.50	20.00	CRAIE BLANCHE

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
12.00	20.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
1.00	6.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.10
6.00	8.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
8.00	20.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.24

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
20.00	20.00	Bouchon



## FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :  
du : 30/06/2022 au : 30/06/2022

1/1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

10280 FONTAINE LES GRES

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle 1/101

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

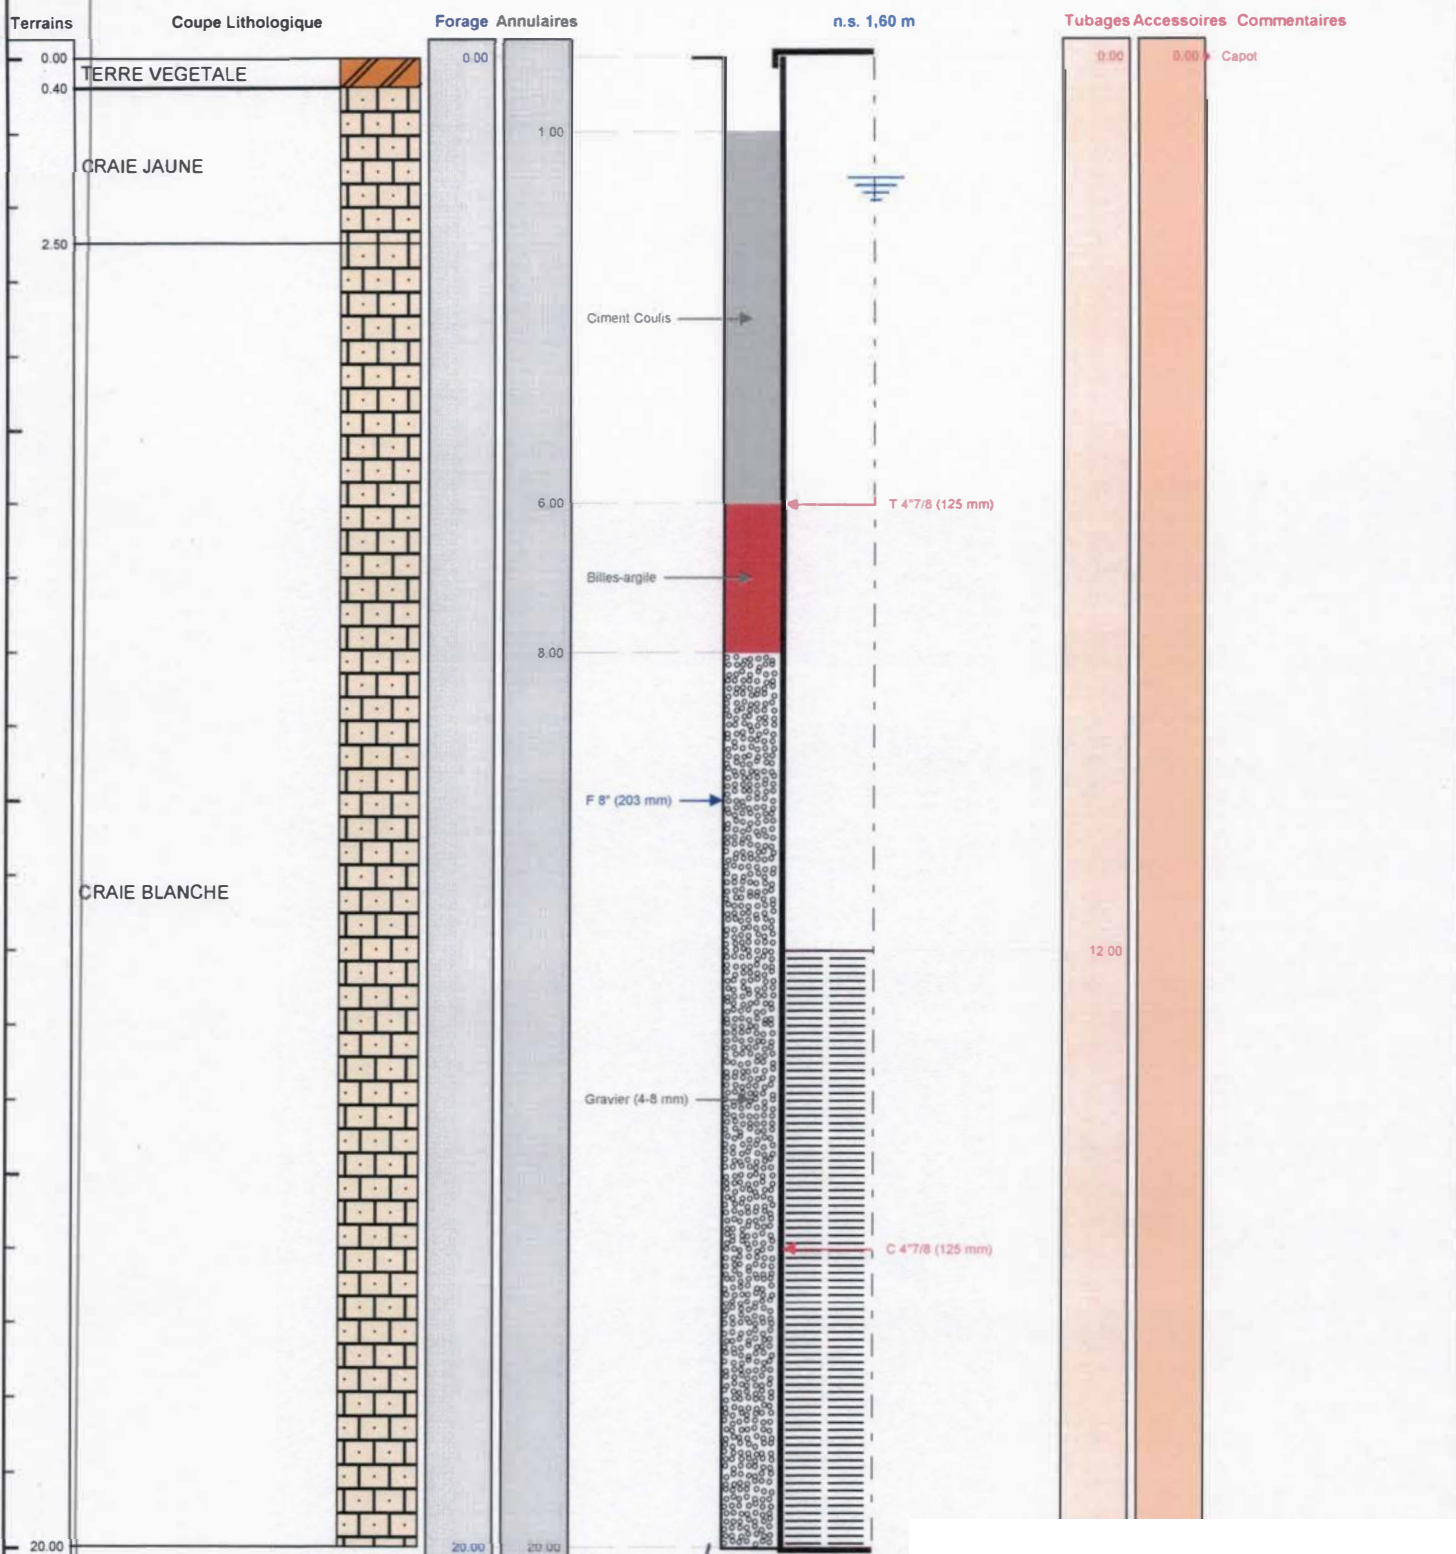

Le 30.06.2022 à Châteauneuf  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt:
