

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 49 ML

Entreprise:	SARL BREBANT FORAGE
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Quathoule

50210 MONTPINCHON

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 20/02/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 20/02/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 3.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM: 10 M3 / HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 49 ML

Client:			
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE		
Lieu de l'ouvrage :	Quathoule		
	50210	MONTPINCHON	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	10.00	SCHISTE MARRON
10.00	49.00	SCHISTE BLEU PASSAGE MARRON

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
25.00	5.00
40.00	20.00
49.00	20.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	21.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
21.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
29.00	37.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
37.00	41.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
41.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

FORAGE D'EAU 49 ML

Travaux réalisés :

1/1

du : 20/02/2023 au : 20/02/2023

Client :

Localisation de l'ouvrage : Quathoule

50210 MONTPINCHON

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

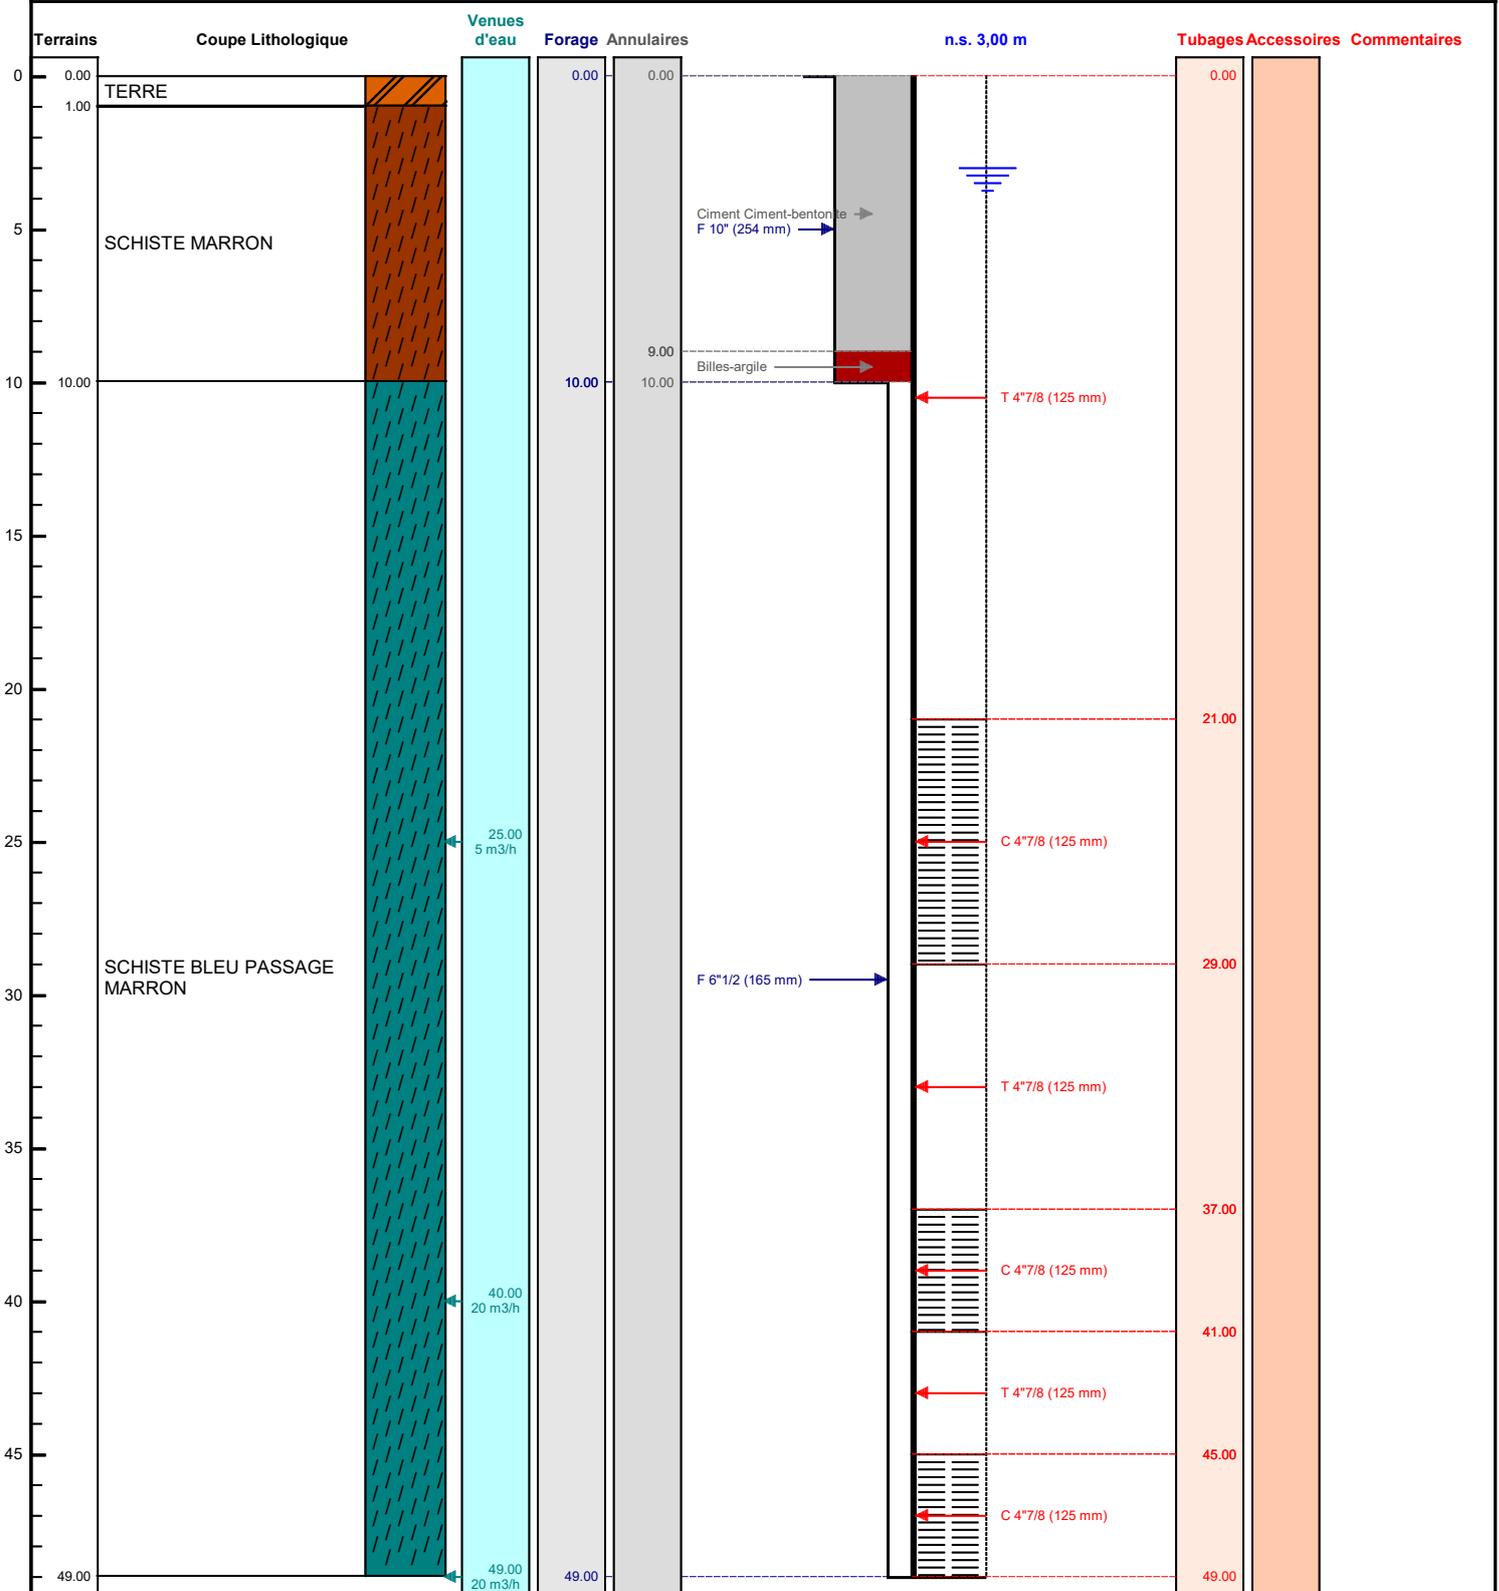

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
