

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

<b>Entreprise:</b>	<b>LES FORAGES DU GATINAIS</b>
<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>LES FORAGES DU GATINAIS</b> 10 ter, rue de Vimory 45200 MONTARGIS
<b>Exploitant:</b>	

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :**

45450 FAY AUX LOGES

**Coordonnées :**    **Longitude**    0    **Latitude**    0    **Altitude :**    0.00 m  
**Zone**    Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 15/05/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 17/05/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 17/05/2023

**Niveau statique non perturbé :** 1.60 m

**Date fin de pompage :** 17/05/2023

**Débit Maxi. d'essai :** 5.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** 1

**Rabatement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale
0.50	3.00	Sable argileux humide
3.00	16.00	Calcaire

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	6"5/8	168.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	12.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
12.00	16.00	6"5/8	168.00	0.00		Acier-api	Crepine fentes		
12.00	16.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

#### REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	6"5/8	168.00	Ciment	Ciment-bentonite	Autre			
1.00	2.00	6"5/8	168.00	Billes-argile	Compactonite				
2.00	16.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Travaux réalisés : 111  
du : 15/05/2023 au : 17/05/2023


Client :

Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/80

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

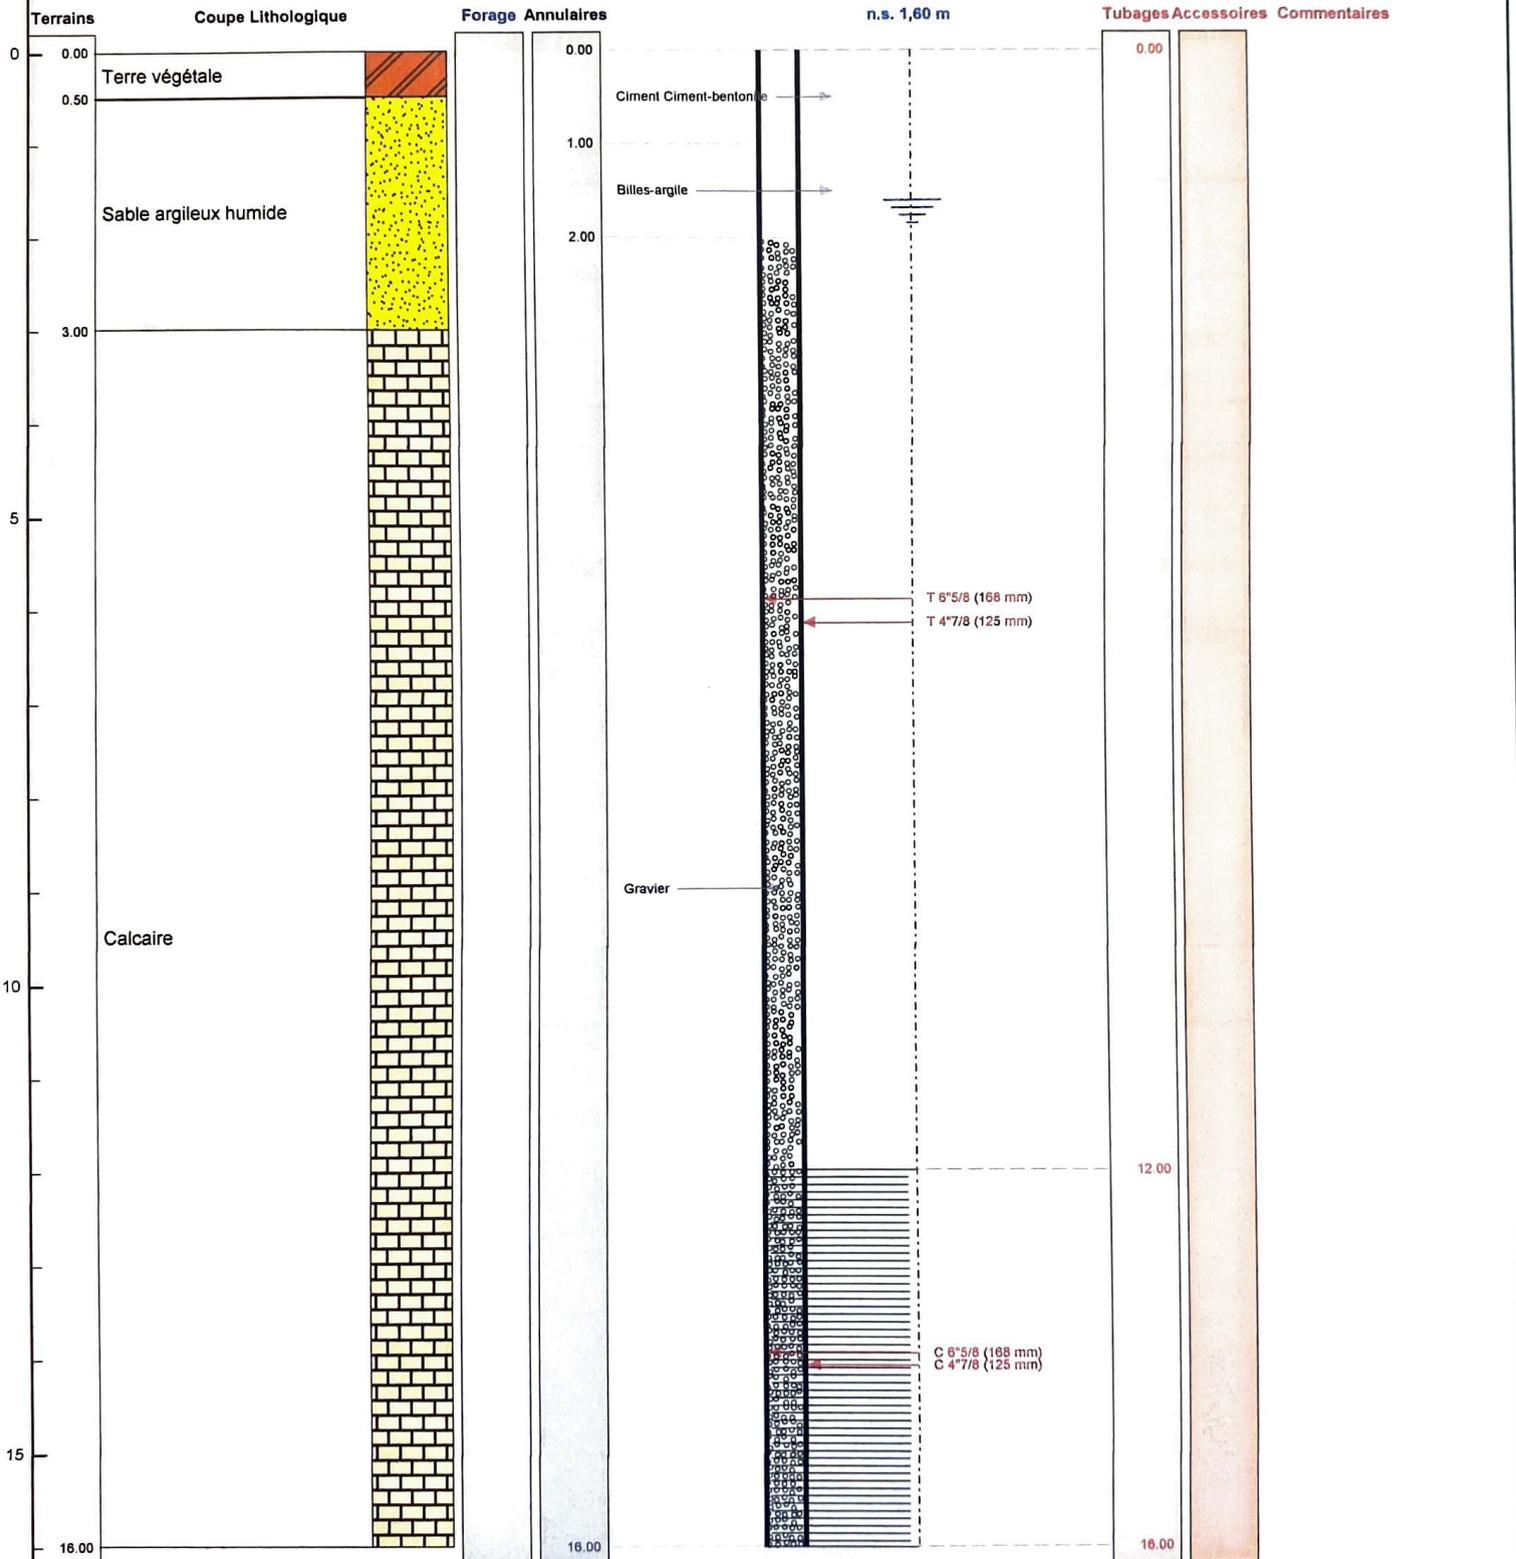

Le ..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

## POMPAGE D'ESSAI

### FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

#### Pompage d'essai

<b>Client:</b>					
Profondeur utile du forage:	16.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	168	mm	Niveau statique/sol:	1.60	m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m <sup>3</sup> /h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **17/05/2023** à **00:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
17/05/2023	10:10	10h10	5.50	1.90	1.90	0.30	
	10:15	10h15		1.90	1.90	0.30	
	10:20	10h20		1.90	1.90	0.30	
	10:25	10h25		1.90	1.90	0.30	
	10:35	10h35		1.90	1.90	0.30	
	10:45	10h45		1.90	1.90	0.30	
	11:00	11h00		1.90	1.90	0.30	
	11:30	11h30		1.90	1.90	0.30	
	12:00	12h00		1.90	1.90	0.30	
	13:30	13h30		1.90	1.90	0.30	
