

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU 46 ML

<b>Entreprise:</b>	<b>SARL BREBANT FORAGE</b>
<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>BREBANT FORAGE</b> ZA DU CLOS DES MARES 50290 BREHAL
<b>Exploitant:</b>	

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** La Banque à Jeunets  
50470 LA GLACERIE

**Coordonnées :** **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m  
**Zone** Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 10/05/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 10/05/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 10.00 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** POMPAGE MAXIMUM 1.75 M3/HEURE

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU 46 ML

Client:	
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE
Lieu de l'ouvrage :	La Banque à Jeunets
	50470 LA GLACERIE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	GRANITE TENDRE
6.00	46.00	GRANITE BLEU JAUNE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	46.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
46.00	3.50

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
14.00	22.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
22.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	38.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
38.00	42.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
42.00	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
10.00	11.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

# FORAGE D'EAU 46 ML

**Travaux réalisés :**

1/1

du : 10/05/2022 au : 10/05/2022

**Client :**

**Maitre d'oeuvre :**

**BREBANT FORAGE**

**Localisation de l'ouvrage :** La Banque à Jeunets

**50470 LA GLACERIE**

**Coordonnées de l'ouvrage :**

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/231

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

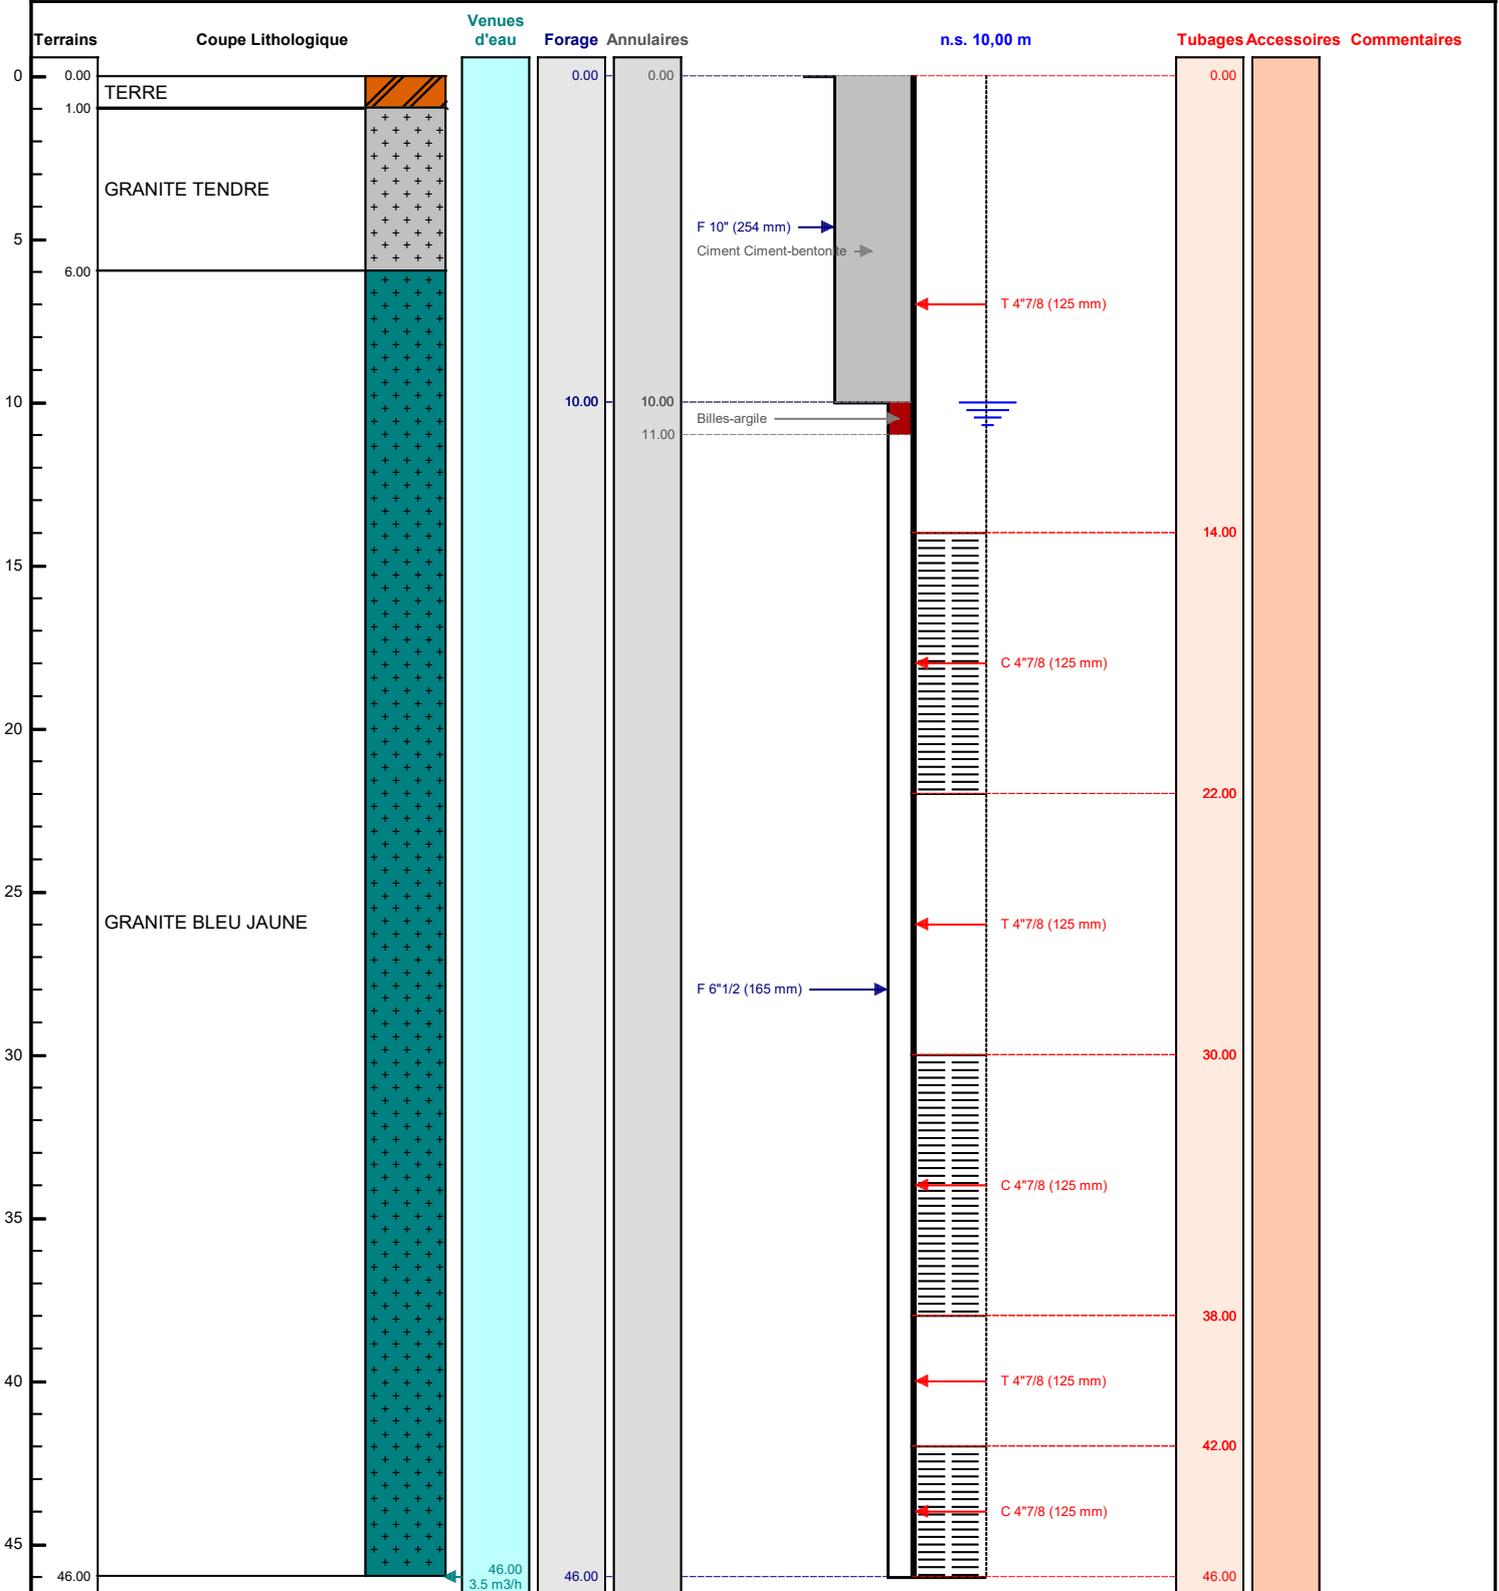

Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise
