

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 47ML

Entreprise: **SARL BREBANT FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA DU CLOS DES MARES
50290 BREHAL

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 10 Le Manoir du Vivier
50530 BACILLY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 08/05/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 08/05/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXI 4 M3/Heure

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 47ML

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

10 Le Manoir du Vivier

50530

BACILLY

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.00 | 1.00 | TERRE |
| 1.00 | 4.00 | SCHISTE MARRON TENDRE |
| 4.00 | 16.00 | SCHISTE MARRON |
| 16.00 | 47.00 | SCHISTE GRIS |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 12.00 | 10" | 254.00 | M.f.t. | Air |
| 12.00 | 47.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 47.00 | 8.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 23.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 23.00 | 27.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 27.00 | 31.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 31.00 | 39.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 39.00 | 43.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 43.00 | 47.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 11.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Ciment-bentonite | Sous pression | | | |
| 11.00 | 12.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactionite | | | | |


| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|------------|--|
| | | FORAGE D'EAU 47ML | | Travaux réalisés : | | 111 | |
| Client : | | | | du : 08/05/2023 au : 08/05/2023 | | | |
| Maitre d'oeuvre : | | BREBANT FORAGE | | Coordonnées de l'ouvrage : | | | |
| Localisation de l'ouvrage : | | 10 Le Manoir du Vivier | | Lambert 1 carto métrique | | | |
| | | 50530 BACILLY | | Longitude (X): | | | |
| | | | | Latitude (Y): | | | |
| | | | | Altitude sol (Z): | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|-------|---------|
| 50530 | BACILLY |
|-------|---------|

1\1

Altitude sol (Z): +0,000 m

Nombre de forages : 1

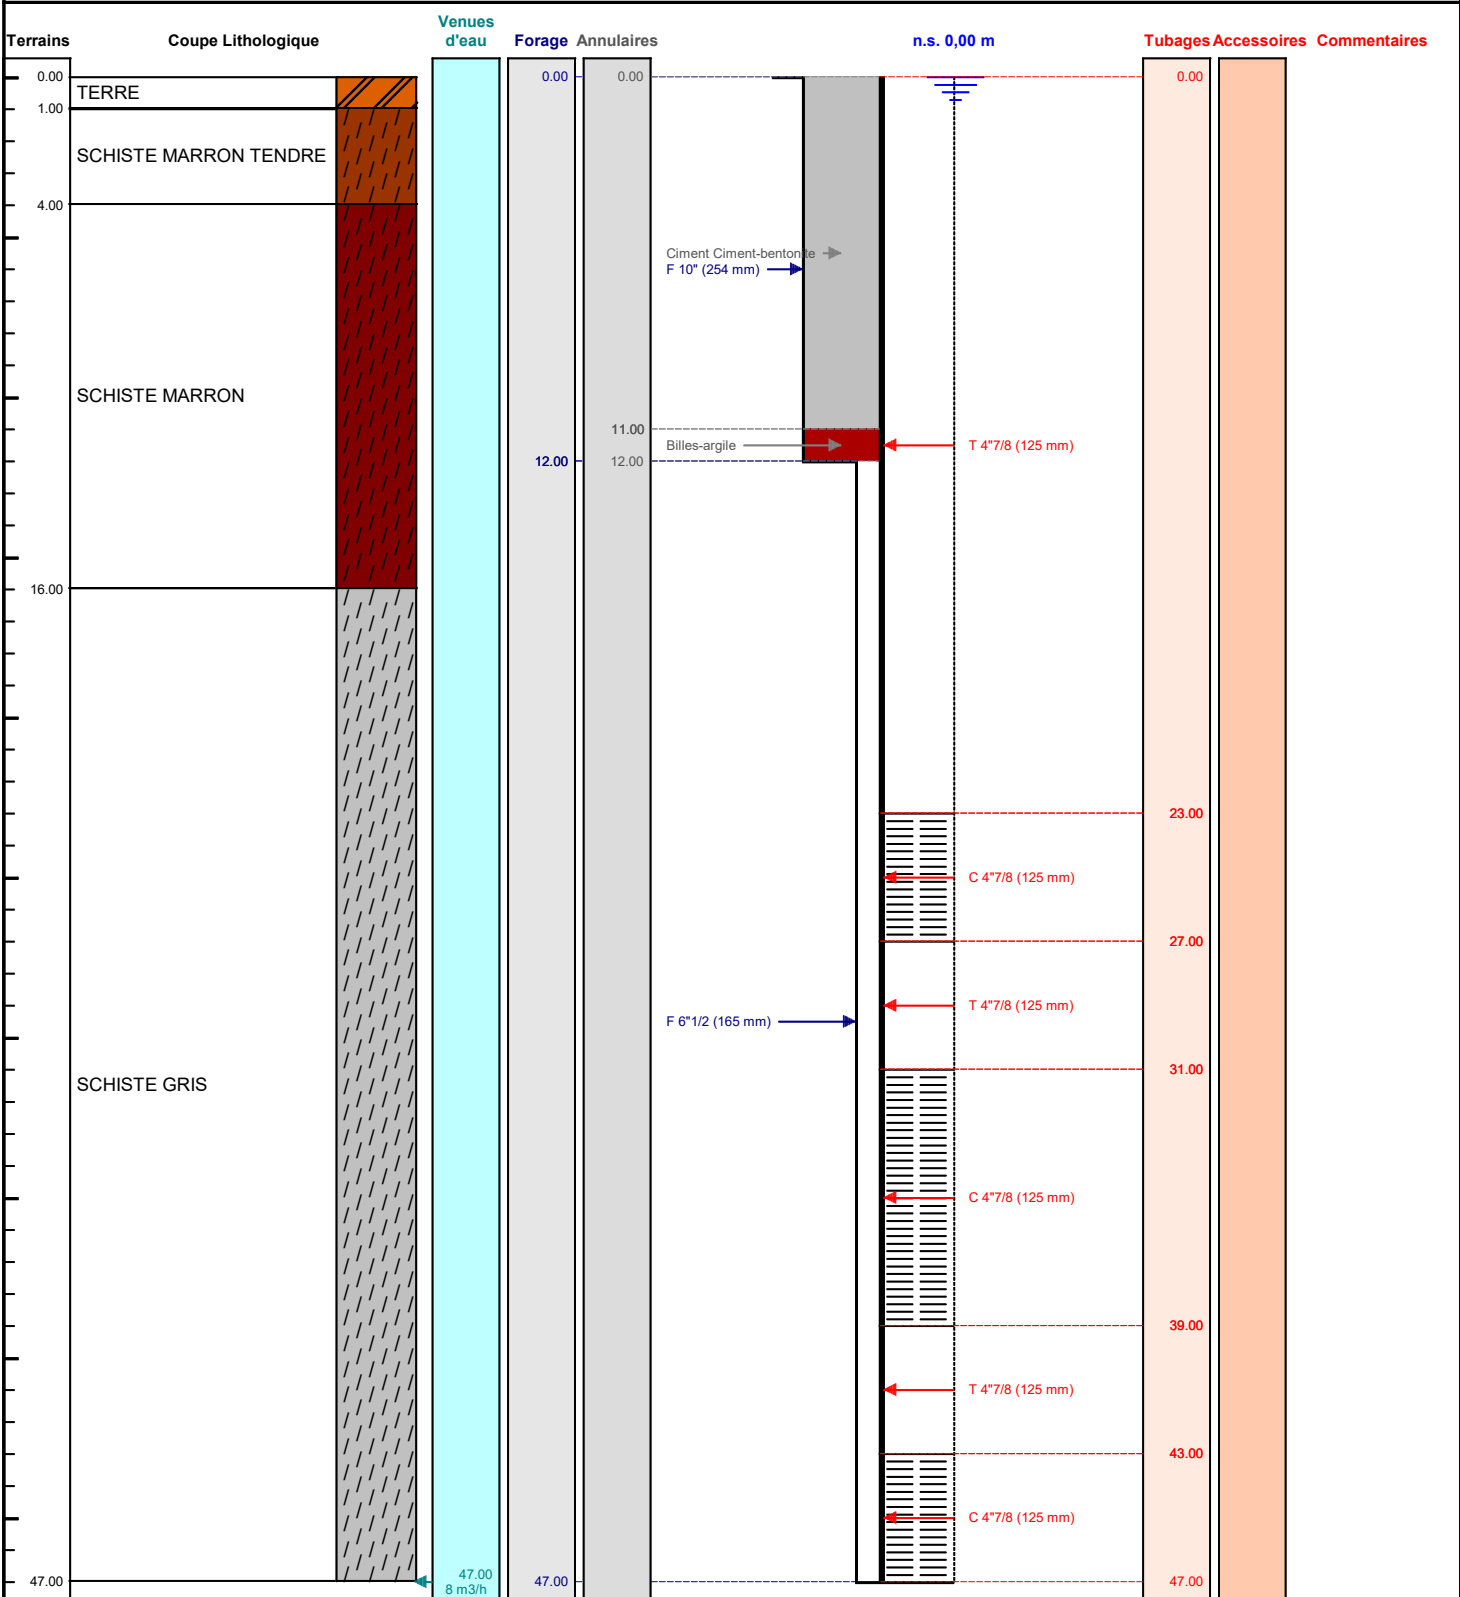

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
