

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

**Entreprise:** NORMANDIE FORAGE .

**Client:**

**Maître d'oeuvre:**

**Exploitant:**

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :** 147955

**Police de l'eau \* :** 2022 01333

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 3 ROUTE DE SAINT PIERRE SUR DIVES  
14620 MORTEAUX COULIBOEUF

**Coordonnées :** **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 51.00 m  
**Zone** Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 23/05/2022

**Resp. M. Ouvrage :** BISSON

**Date fin de l'ouvrage :** 23/05/2022

**Resp. M. Oeuvre :** GAUTIER

**Machine :** ECOFORE

**Resp. Chantier :** GODEY

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 9.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 8.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 3 ROUTE DE SAINT PIERRE SUR DIVES  
14620 MORTEAUX COULIBOEUF

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	TERRE
0.50	10.00	CALCAIRE BLANC
10.00	13.00	CALCAIRE JAUNE PASSAGE SABLE
13.00	22.00	CALCAIRE BLANC GRIS + SABLE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	22.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
9.00	1.50

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
10.00	18.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
18.00	22.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
12.00	22.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU

Client : \_\_\_\_\_  
 Maître d'oeuvre : \_\_\_\_\_  
 Localisation de l'ouvrage : **3 ROUTE DE SAINT PIERRE SUR DIVES**  
**14620 MORTEAUX COULIBOEUF**

Travaux réalisés : du : 23/05/2022 au : 23/05/2022 11  
1  
 Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): 0  
 Latitude (Y): 0  
 Altitude sol (Z): +51,000 m

Echelle : 1/111 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

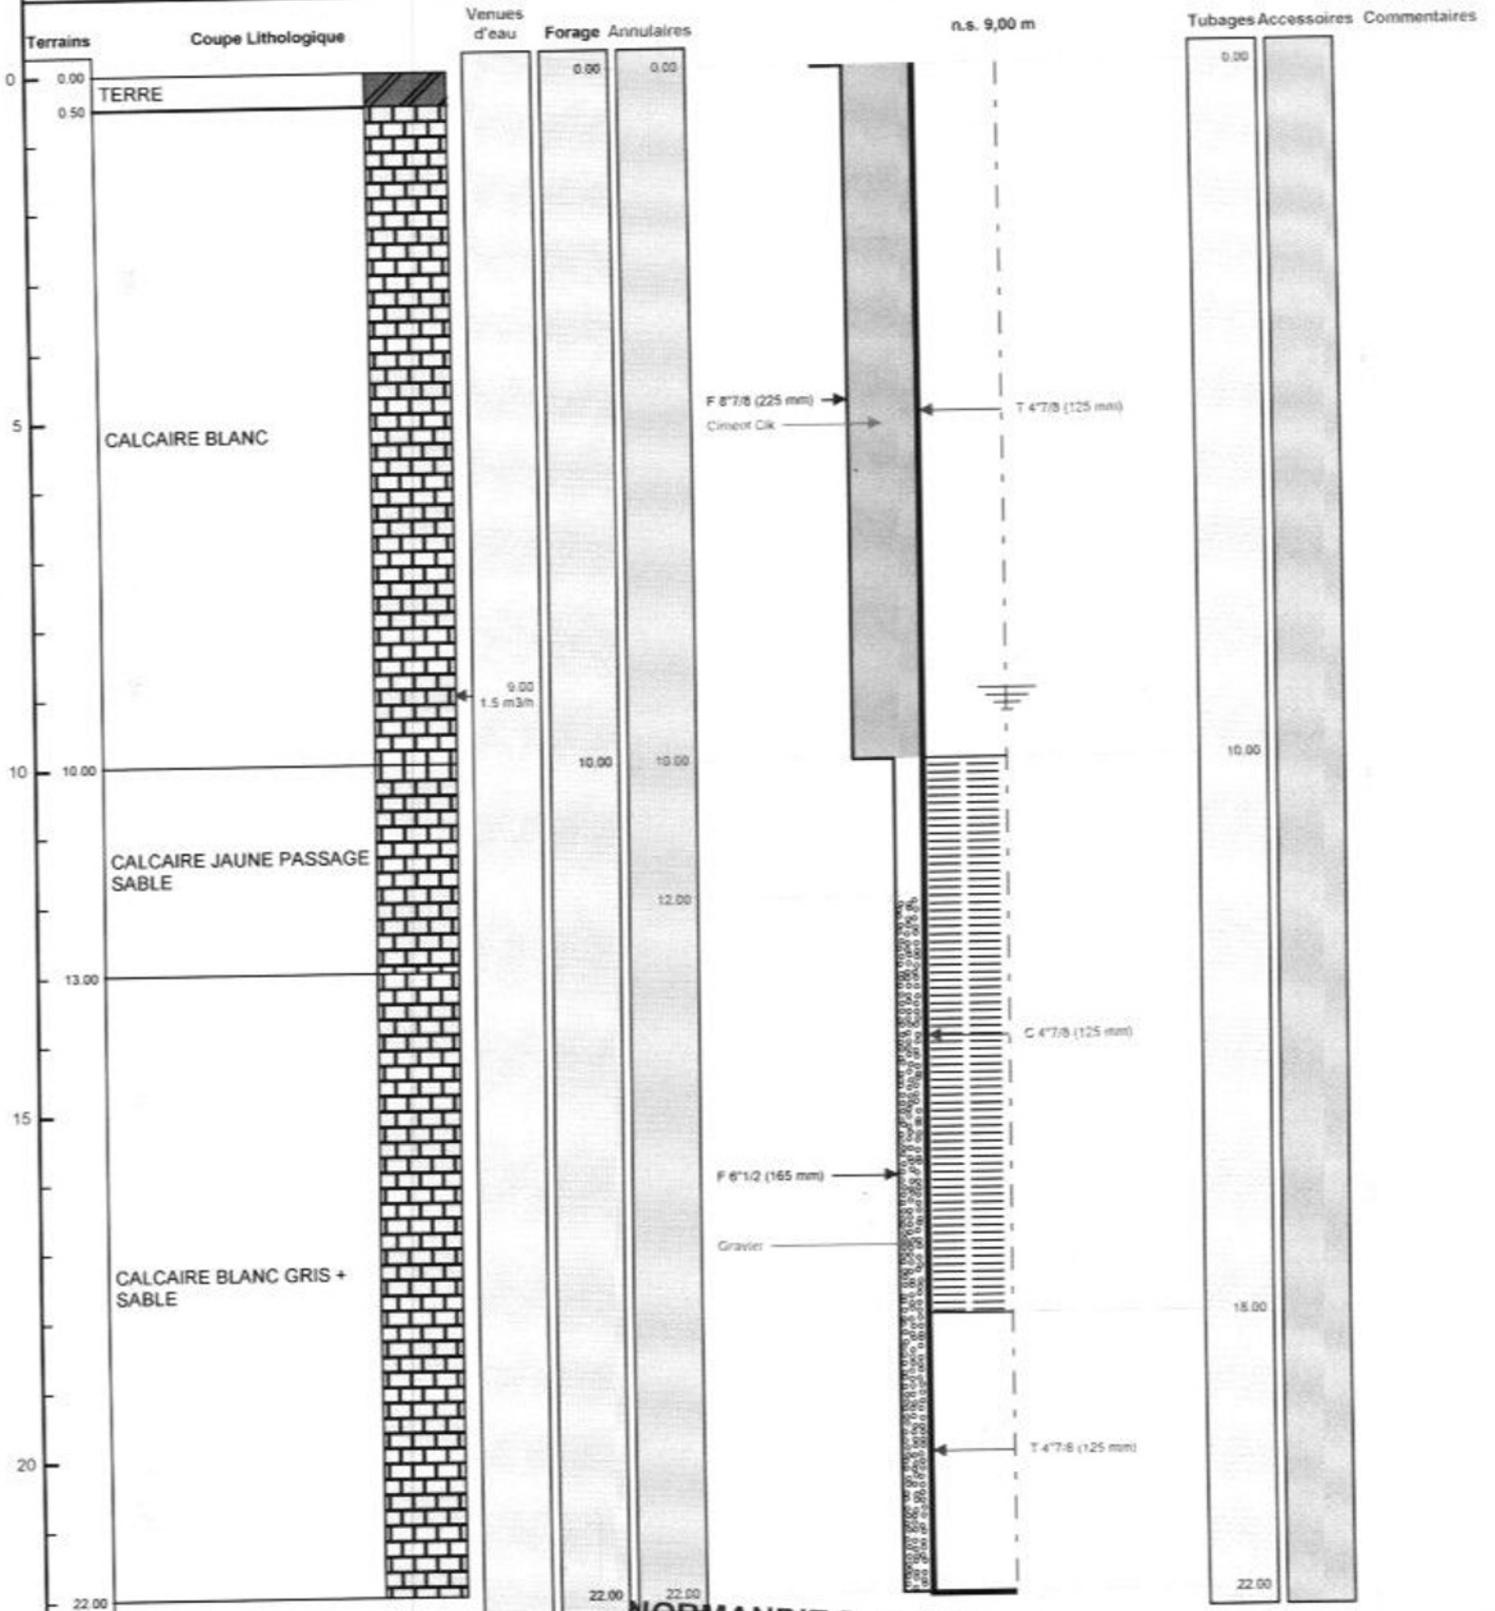

**NORMANDIE FORAGE**

Le *23/05/2022* à *15h30*  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE  
 Tampon et signature du chef d'entr

PERSON  
 5 05 68 74  
 30.fr
