

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: **NORMANDIE FORAGE .**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 55804

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 4 LES CLOTINS  
28270 BEAUCHE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 197.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 09/02/2021

Resp. M. Ouvrage : DANIEL-LACOMBE

Date fin de l'ouvrage : 16/02/2021

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machines : ECOFORE

Resp. Chantier : TRIBOULET

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 40.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 40.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'œuvre:

Lieu de l'ouvrage : 4 LES CLOTINS

28270 BEAUCHE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	10.00	ARGILE A SILEX
10.00	20.00	ARGILE ORANGEE SILEX
20.00	30.00	ARGILE MARRON SILEX
30.00	35.00	CRAIE ALTEREE A SILEX
35.00	45.00	CRAIE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8 7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	45.00	6 1/2	165.00	M.f.l.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
40.00	3.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	25.00	4 7/8	125.00	6.00	8	P.v.c.	Tube-plein		
25.00	41.00	4 7/8	125.00	6.00	8	P.v.c.	Crepine fontes		50
41.00	45.00	4 7/8	125.00	6.00	8	P.v.c.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texturé	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4 7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés du 09/02/2021 à 16/02/2021  
 Coordonnées de l'ouvrage:  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X) : 0  
 Latitude (Y) : 0  
 Altitude sol (Z) : +197,000 m


Cliant :  
 Maître d'œuvre :  
 Localisation de l'ouvrage :

4 LES CLOTINS  
 28270 BEAUCHE

Echelle : 1/226

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

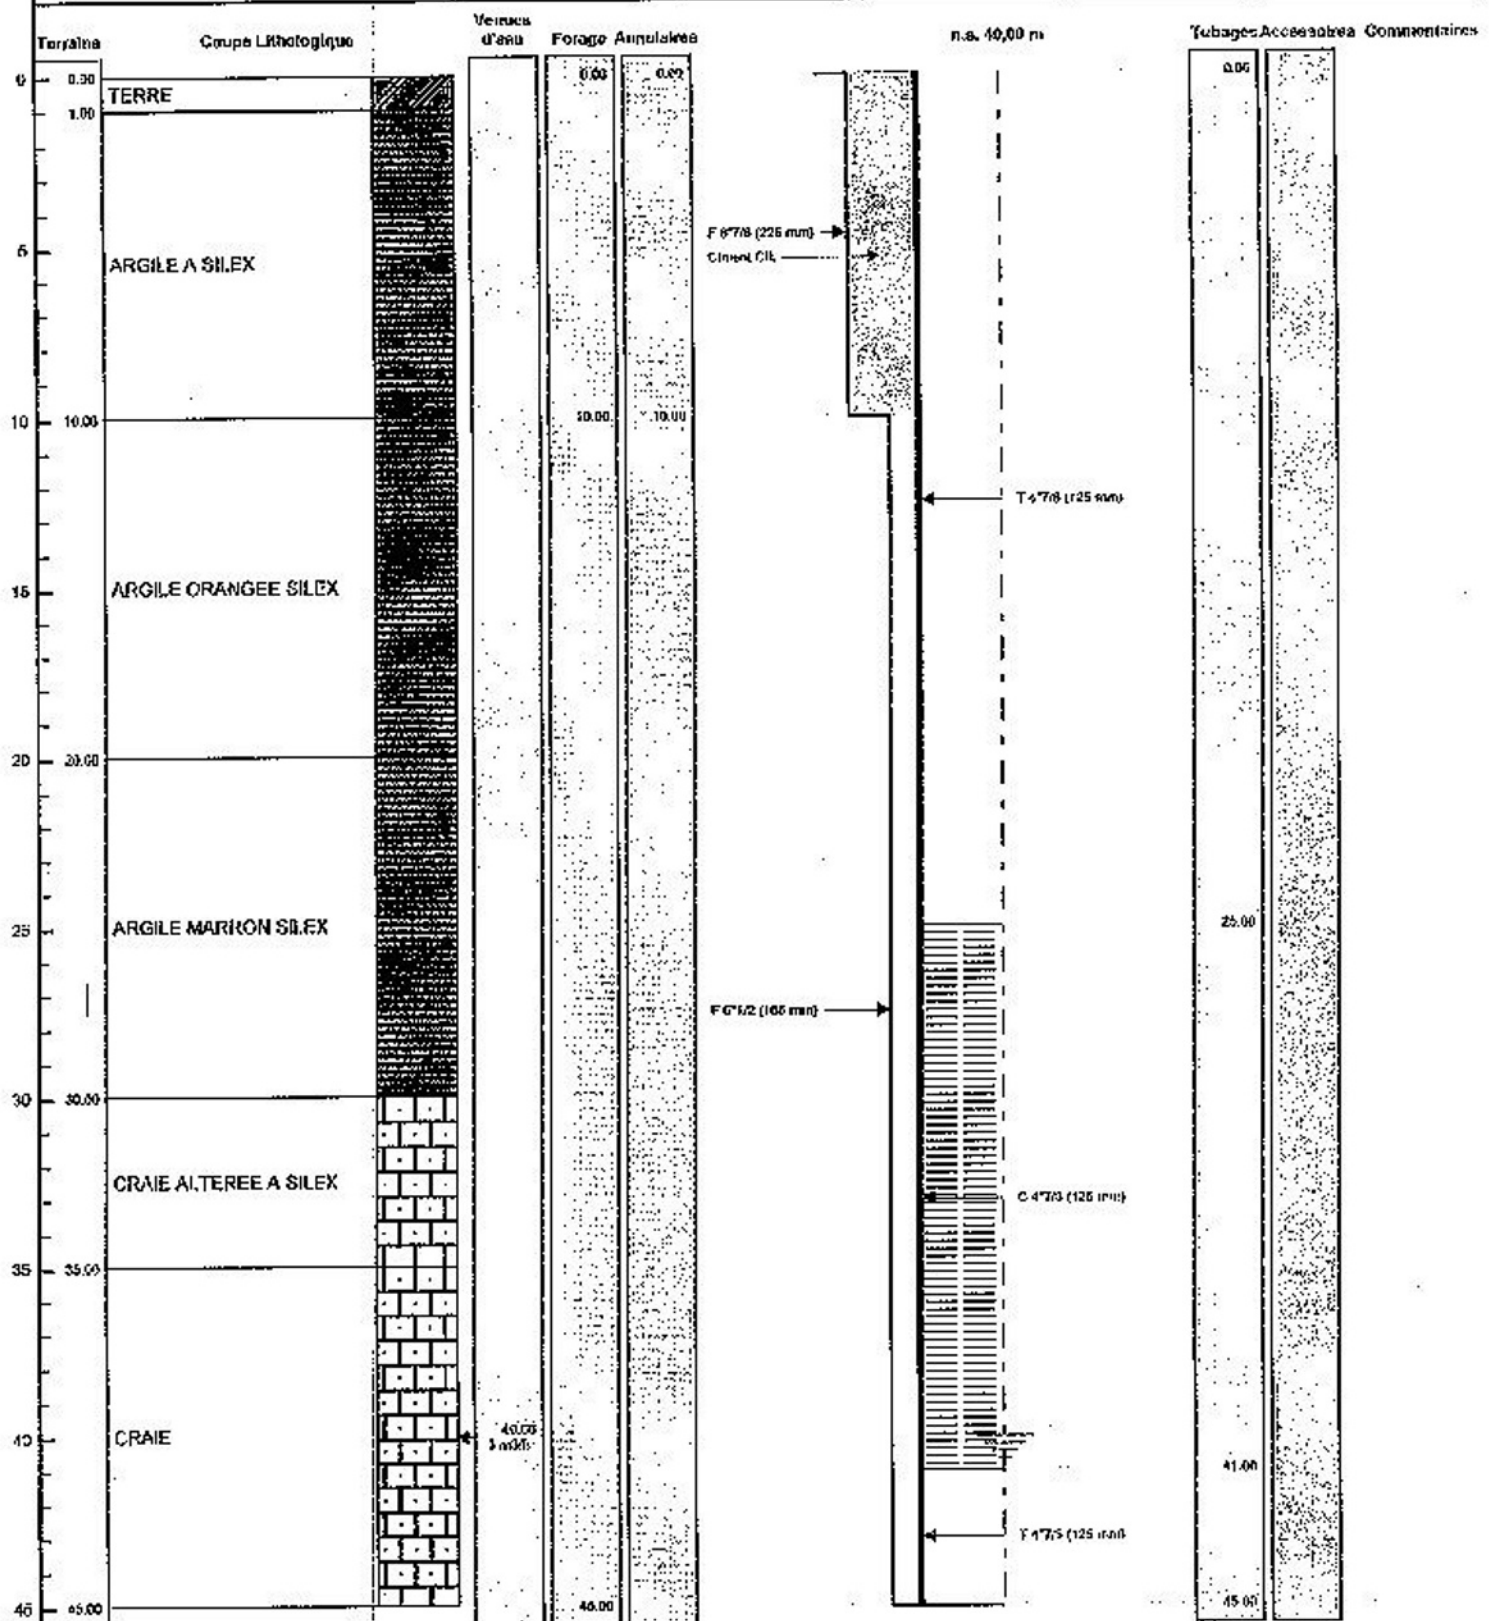

Le ..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise
