

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU 40 ML

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** HOTEL POULAIN  
50450 LENGRONNE

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 22/02/2022

**Resp. M. Ouvrage :** TRAVERS

**Date fin de l'ouvrage :** 22/02/2022

**Resp. M. Oeuvre :** PRUDENCE

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :** PRUDENCE

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 10.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** POMPAGE MAXIMUM 3.90 M3/HEURE

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU 40 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : HOTEL POULAIN

50450

LENGRONNE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	REMBLAI
1.00	8.00	SCHISTE MARRON
8.00	40.00	SCHISTE BLEU

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	40.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
4.50	2.00
34.00	7.00
40.00	7.80

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein	1.00	
24.00	32.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
32.00	36.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				


		<b>FORAGE D'EAU 40 ML</b>		<b>Travaux réalisés :</b> du : 22/02/2022 au : 22/02/2022		<b>111</b>	
<b>Client :</b>				<b>Coordonnées de l'ouvrage :</b>			
<b>Maitre d'oeuvre :</b>				Lambert 1 carto métrique			
<b>Localisation de l'ouvrage :</b>		<b>HOTEL POULAIN</b>		Longitude (X):		0	
		<b>50450 LENGRONNE</b>		Latitude (Y):		0	
				Altitude sol (Z):		+0,000 m	

50450 LENGRONNE

1\1

+0,000 m

Nombre de forages : 1

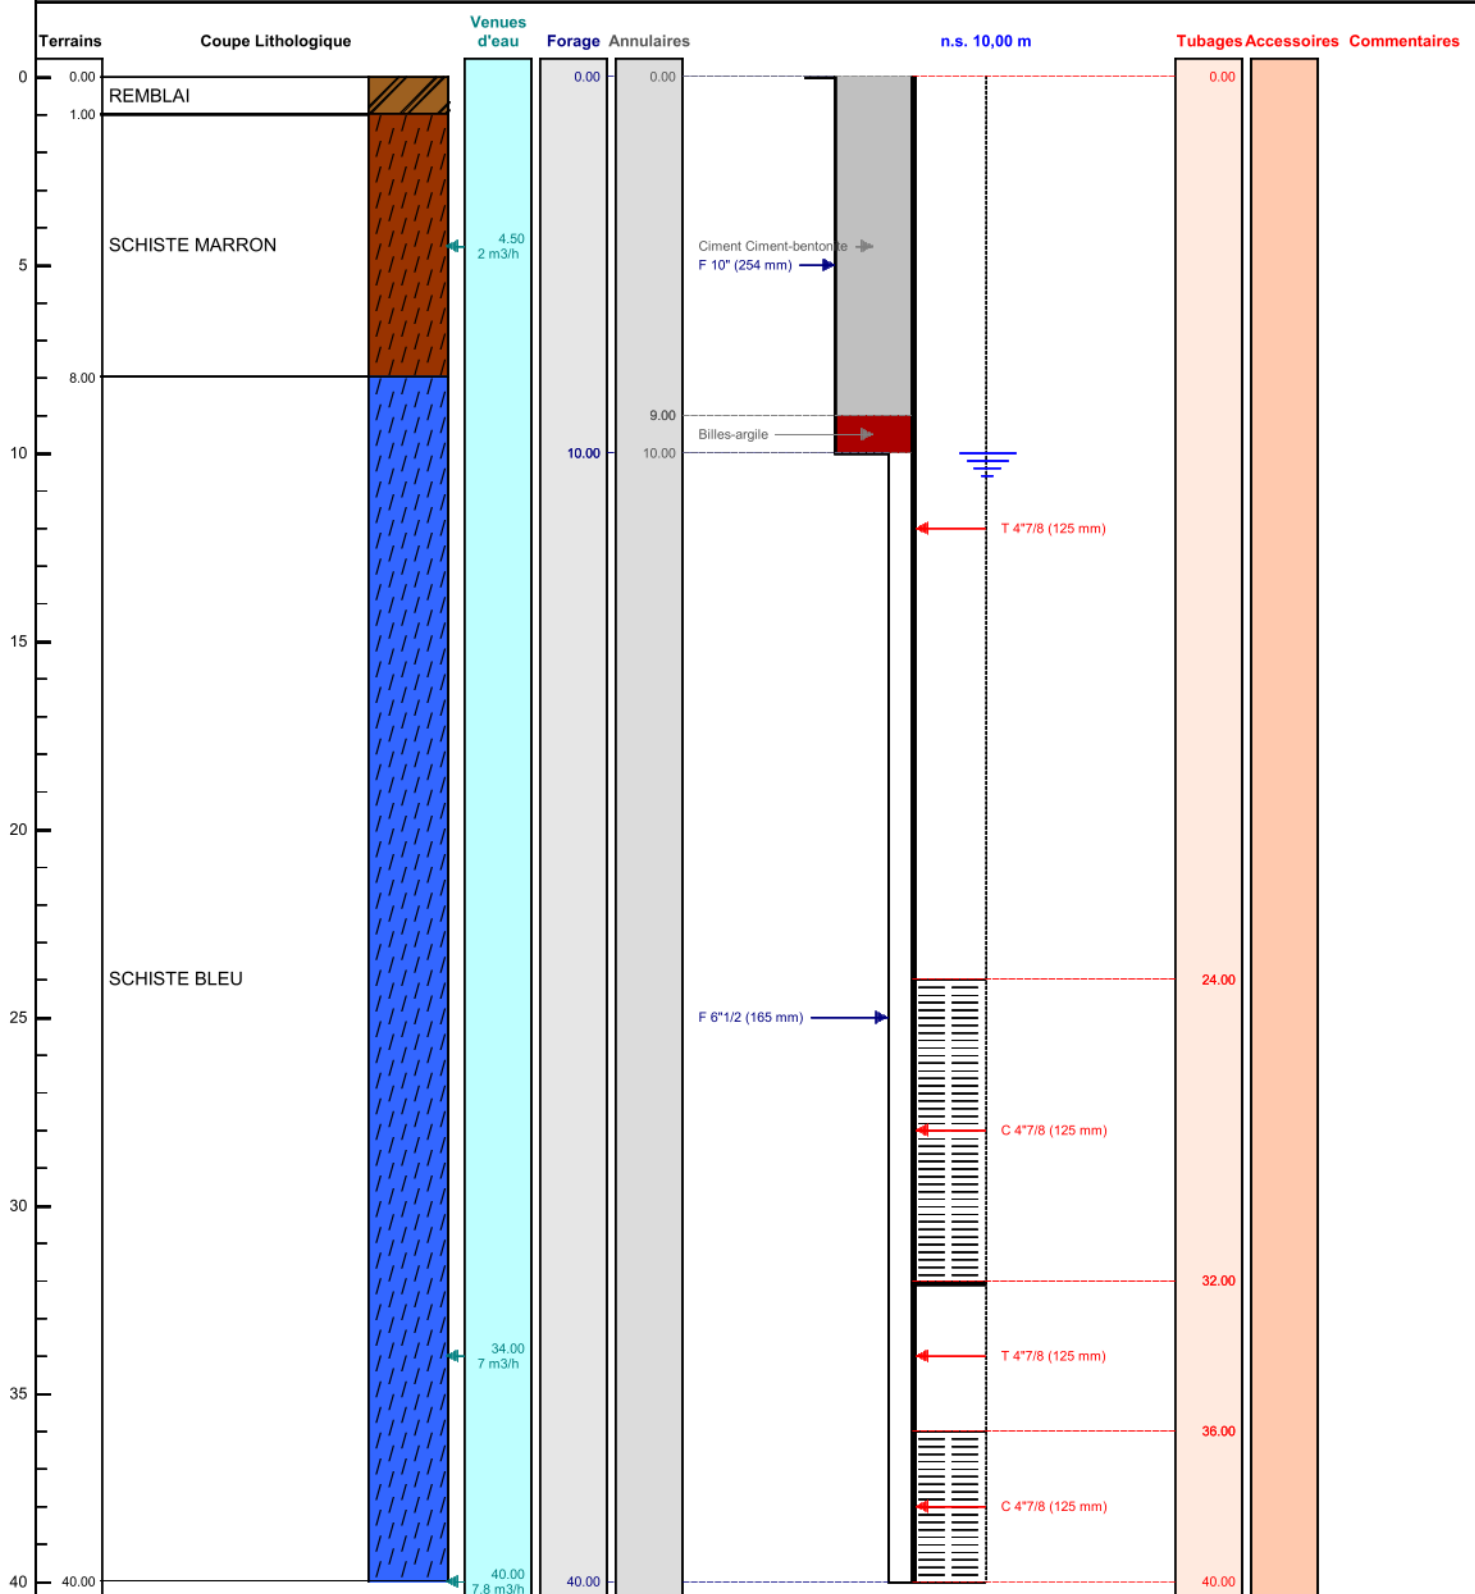

Tampon et signature du chef d'entreprise
