

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU AGRICOLE

Entreprise: **SARL PROSPER FORAGES**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : CAMPAGNE DE HAUT
64400 GERONCE

Coordonnées : Longitude 400 571 Latitude 6 244 830 **Altitude :** 186.62 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/02/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 24/03/2202

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI P30

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 15.85 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 7.35 m

Notes : DENSITE LAITANCE: 1,82kg/l

TEST DE POMPAGE / 4M3/HR 21,5m // 5M3/HR 23,2m

Notes (suite) : 22/02/2023:

10h45 à 12h00:

Arrivée à Géronce

Mise en place de la machine et du camion

Déchargement du tubage, du fourgon et de la remorque

13h30 à 15h00:

Mise en place du tube et du marteau sur la machine

Difficultés à démarrer le compresseur

15h00 à 17h30:

Foration de 15m en 279mm

Mise en place de 15m à 18m

23/02/2023:

8h00 à 12h00:

Foration de 18m à 30m

Sortie tige et MFT

Préparation du PVC 180mm

Descente du PVC

13h30 à 17h00:

Arrachage du tubage de 30m à 12m

24/02/2023:

8h00 à 10h30:

Terminer d'arracher le tubage

Sortie du matériel

Chargement de la machine et du tubage

Retour au dépôt



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU AGRICOLE



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : **CAMPAGNE DE HAUT**
64400 GERONCE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Terre végétale + cailloux
2.00	14.00	Gravier + sable argileux sec
14.00	24.00	Gravier + sable gris argileux +eau
24.00	30.00	Schist marron + eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	30.00	11"	279.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
24.00	30.00	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	8
30.00	30.20	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	7"1/8	180.00	Ciment	Béton	Annulaire			
1.00	4.00	7"1/8	180.00	Ciment	Cem II/B-I 32.5n	Annulaire			
4.00	5.00	7"1/8	180.00	Billes-argile	Sopranite				
5.00	30.00	7"1/8	180.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

FORAGE D'EAU AGRICOLE

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : **CAMPAGNE DE HAUT**

64400 GERONCE

Travaux réalisés :

du : 22/02/2023 au : 24/03/2023

11

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

400 571

Latitude (Y):

6 244 830


Altitude sol (Z):

+186,620 m

Echelle : 1/152

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

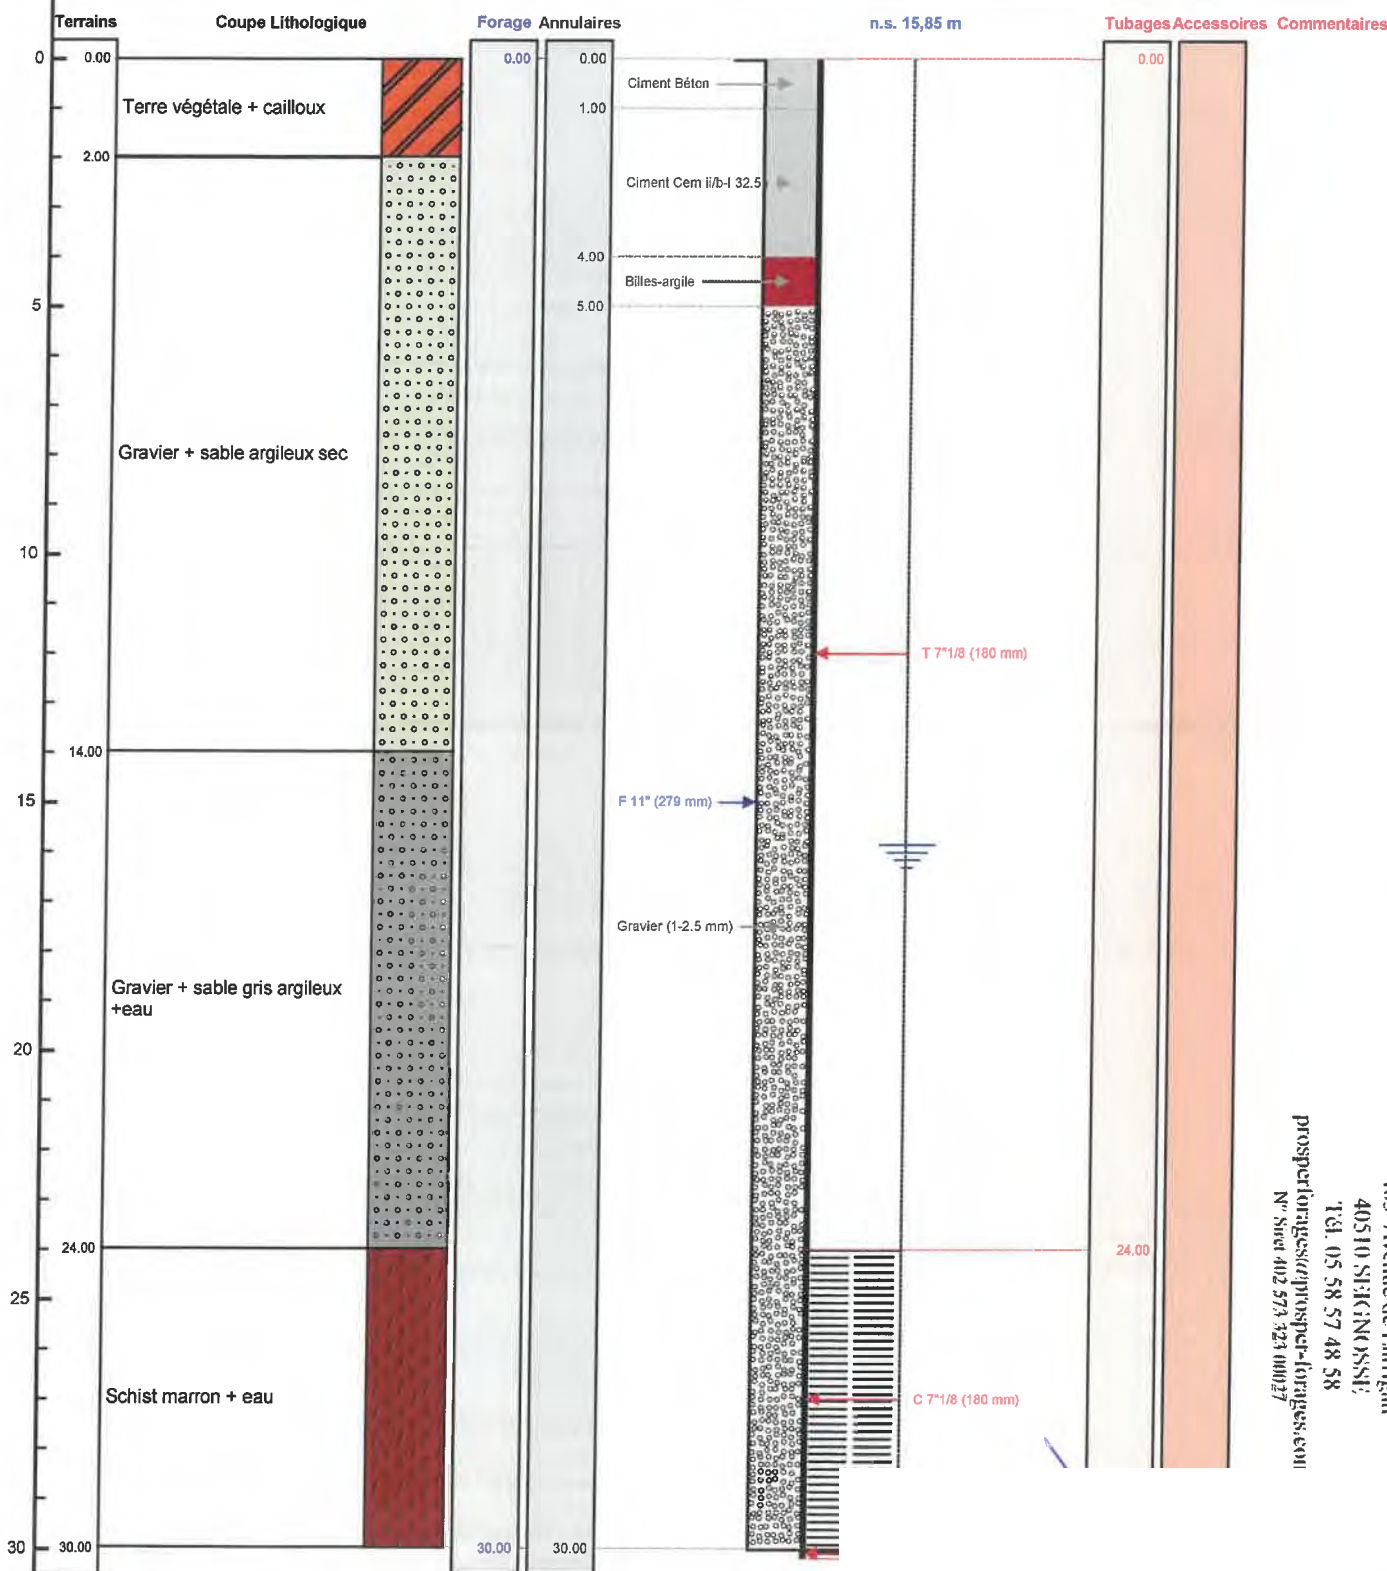

PROSPER FORAGES S.A.R.L.

465 Avenue de l'arrigon

40510 SIEKINGE (SSS)

Tél. 05 58 57 48 58

prosperforages/prosper-forages.com
N° Siret 402 574 324 00027



Le 8/3/2023 à SCIG NASSIC

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 400 571 Lat.: 6 244

