

COUPE DE FORAGE D'EAU AGRICOLE

Entreprise: **SARL PROSPER FORAGES**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

64510 ANGAIS

Coordonnées :

Longitude 435 007

Latitude 6 242 631

Altitude : 228.60 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 20/03/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 22/03/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI P30

Resp. Chantier :

Date début pompage : 22/03/2023

Niveau statique non perturbé : 7.42 m

Date fin de pompage : 22/03/2023

Débit Maxi. d'essai : 60.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabatement correspondant : 1.28 m

Notes :

NS: 7,42m

ND: 7,55m - 10m3/h 7,67m - 20m3/h 7,90m - 33m3/h 8,10m - 45m3/h 8,70m - 60m3/h

DENSITE LAITANCE: 1,813kg/l

20 MARS 2023:

11h00 à 12h00:

Arrivée à Bordes

Chargement de la machine

Trajet vers Angais

Déchargement et mise en place du matériel

13h00 à 17h00:

Problème avec l'alternateur du camion

Foration de 0 à 8m

Flexible air de la machine percé

Reparation camion par mécanicien Renault trucks

Démontage du flexible par Chronoflex

21 MARS 2023:

8h00 à 12h00:

Remontage du flexible par Chronoflex

Fin de la foration de 8m à 18m

Sortie tige

Préparation du PVC 180mm

13h00 à 18h00:

Descente du PVC

Arrachage du tubage

Pose de la Sobranite

Aller chercher le groupe électrogène chez Locadour

22 MARS 2023:

8h00 à 12h00:

Descente de la pompe de test

8h45 à 10h45: pompage de 2h

Cimentation

Sortie de la pompe

Chargement de la machine

14h00 à 17h00:

Ramener le groupe chez Locadoiur

Tube de protection et socle en béton

Départ du chantier

COUPE DE FORAGE D'EAU AGRICOLE

Travaux réalisés : 111
du : 20/03/2023 au : 22/03/2023

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

64510 ANGAIS

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 435 007


Latitude (Y): 6 242 631

Altitude sol (Z): +228,600 m

Echelle : 1/91

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

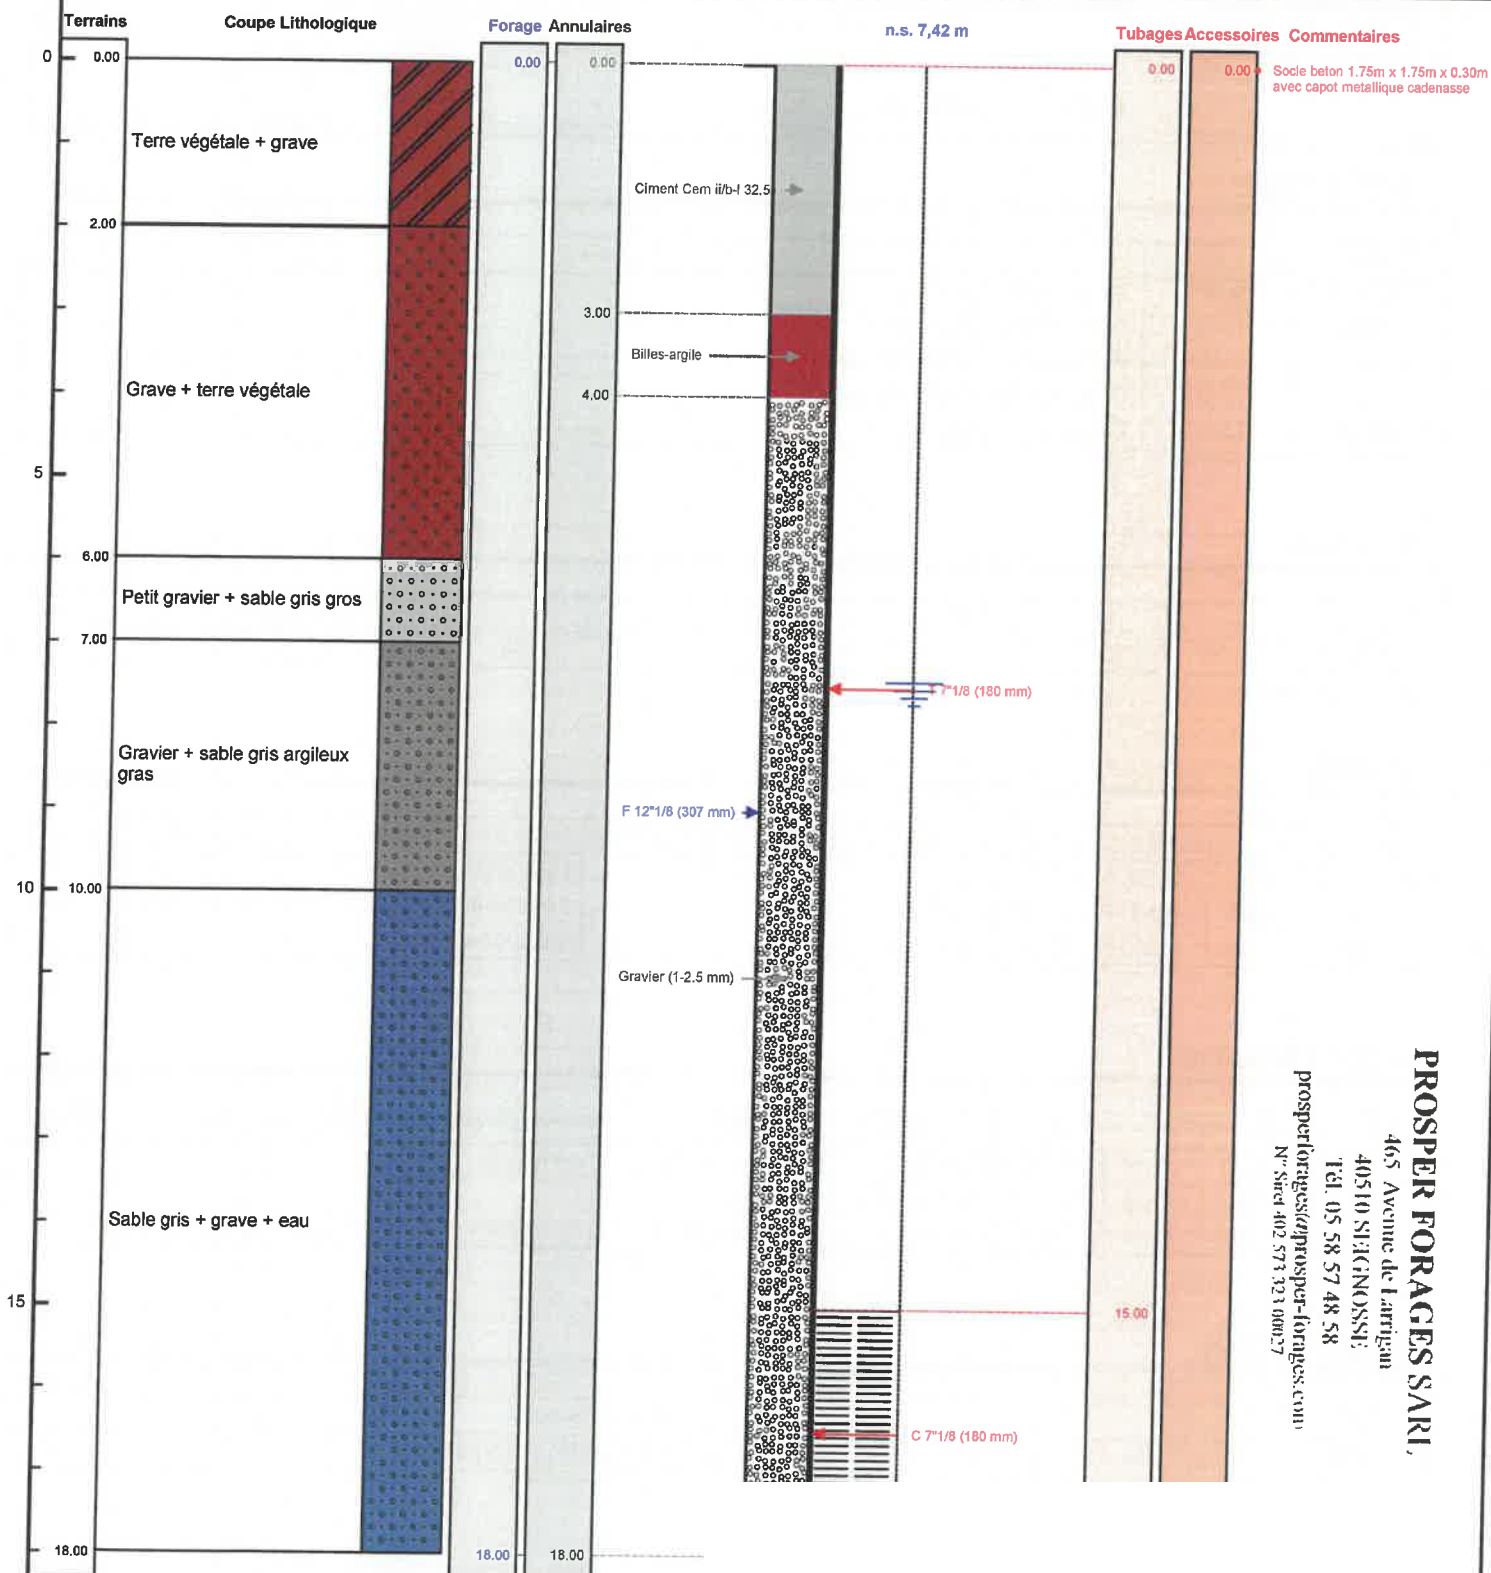

PROSPER FORAGES S.A.R.L.
465 Avenue de Larrigan
40510 SIEGNOSSIE
Tél. 05 58 57 48 58
prospertforages@prospertforages.com
N° Siret 402 573 323 00027




Le 28/3/2023 à SIEGNOSSIE
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXEC
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 435 007



TRONCONS de L'OUVRAGE

COUPE DE FORAGE D'EAU AGRICOLE



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

64510 ANGAIS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Terre végétale + grave
2.00	6.00	Grave + terre végétale
6.00	7.00	Petit gravier + sable gris gros
7.00	10.00	Gravier + sable gris argileux gras
10.00	18.00	Sable gris + grave + eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	12"1/8	307.00	Autre	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
15.00	18.00	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	8
18.00	18.10	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	7"1/8	180.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
3.00	4.00	7"1/8	180.00	Billes-argile	Sopranite				
4.00	18.00	7"1/8	180.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socle beton 1.75m x 1.75m x 0.30m avec capot metallique cadenas

43 234251 - A. P. 00000
64510 angais
Parcelle : 000 / ZA / 00059
Altitude : 228.6 m
v07er - débiteur pour éventail

PANCIELLE CADASTRALE
N° parcelle : 0059
Feuille : 1
Section : ZA
N° INSEE commune : 64023
Commune : 15050.0

FORAGE

ZA 0059

AFFICHER DES COORDONNÉES
X : 435006.59 m
Y : 6242630.96 m
Altitude : 228.6 m

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

Lambert 93
mètres

QUADRILLAGE

Attacher

