

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE NEGATIF

Entreprise: SARL PROSPER FORAGES

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 382 chemin Pelut
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX

Coordonnées : Longitude 344 846 Latitude 6 283 714 **Altitude :** 48.19 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1**Date début de l'ouvrage :** 05/12/2022**Resp. M. Ouvrage :****Date fin de l'ouvrage :** 06/12/2022**Resp. M. Oeuvre :****Machine :** FRASTE 140**Resp. Chantier :****Date début pompage :****Niveau statique non perturbé :** 0.00 m**Date fin de pompage :****Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m³/h**Nombre de nappes identifiées :****Rabattement correspondant :** 0.00 m**Notes :** Densité laitance: 1.83 kg/L

5 DECEMBRE 2022

Après-midi:

Arrivée sur site
Mise en place du matériel de forage (+ d'1h)
Calage de la machine
Préparation du tubage et de l'outil
Retour au dépôt

6 DECEMBRE 2022:

Matin:

Foration avec tubage de 0 à 12m
Foration de reconnaissance sans tubage jusqu'à 18m
Aucun signe d'eau

Après-midi:

Sortie des tiges
Sortie du tubage
Rangement du matériel
Comblement du forage avec le terrain naturel, la Sobranite et la cimentation
Chargement du matériel et de la foreuse
Retour au dépôt



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE NEGATIF



Charte qualité

Client:**Maître d'oeuvre:**

Lieu de l'ouvrage : 382 chemin Pelut
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre argileuse
0.50	3.50	Argile jaune + graves
3.50	9.50	Argile rouge + graves
9.50	10.50	Argile grise
10.50	18.00	Marne grise

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	8"5/8	219.00	Autre	Air

* Reconnaissance

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.50	Rebouc	0.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
2.50	3.00	Rebouc	0.00	Billes-argile	Sopranite				
3.00	18.00	Rebouc	0.00	Remblai					

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE NEGATIF

Travaux réalisés : 111
du : 05/12/2022 au : 06/12/2022

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 382 chemin Pelut

40390 ST MARTIN DE SEIGNANX

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 344 846


Latitude (Y): 6 283 714

Altitude sol (Z): +48,190 m

Echelle : 1/90

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

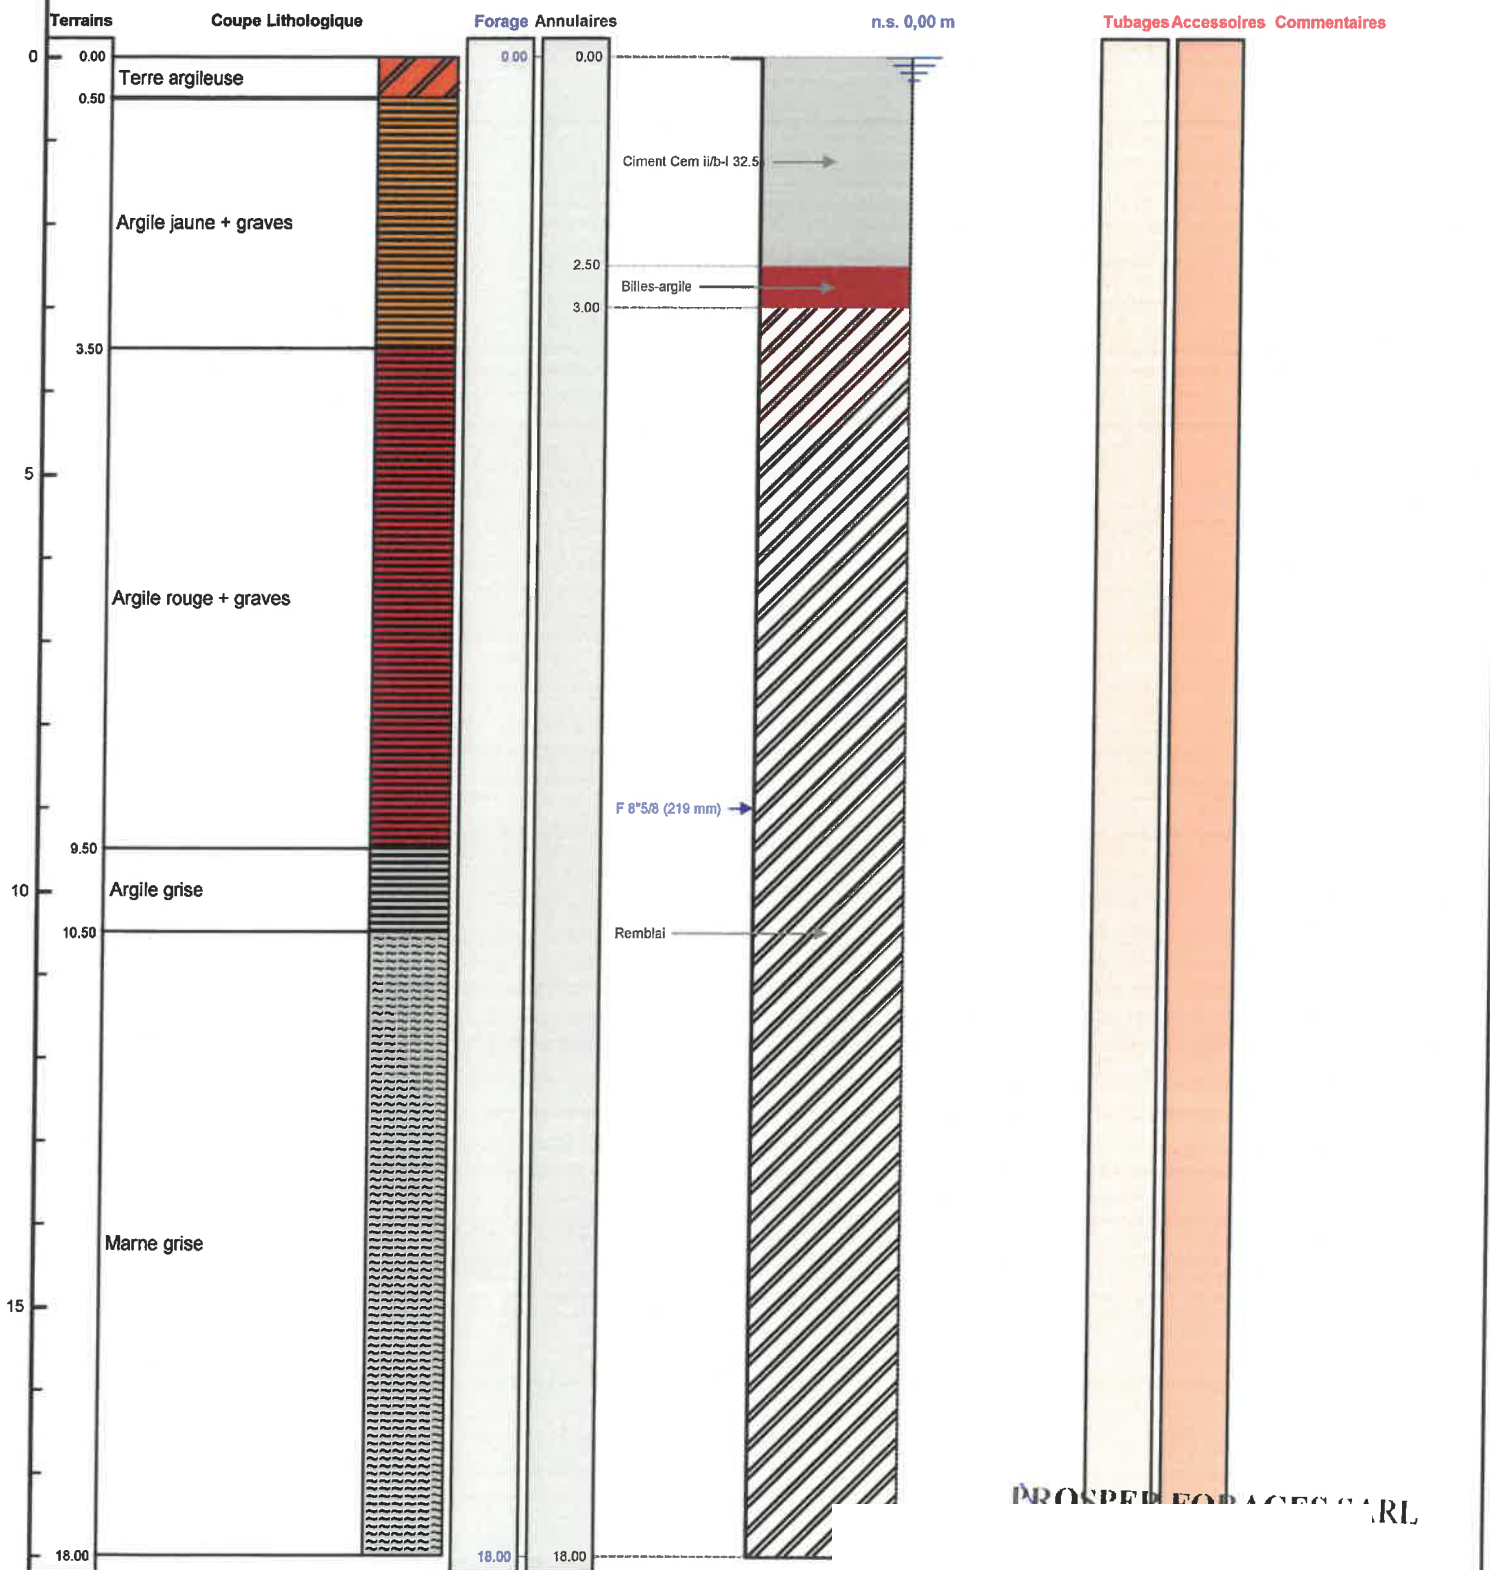

Le 9/12/2022 à SEIGNANX

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

111



