

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°2

Entreprise: **SAS FORAQUITAINE**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

40120 RETJONS

Coordonnées :

Longitude 437 765

Latitude 6 341 410

Altitude : 0.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 05/10/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 13/10/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Failing 1500

Resp. Chantier :

Date début pompage : 13/10/2023

Niveau statique non perturbé : 1.95 m

Date fin de pompage : 13/10/2023

Débit Maxi. d'essai : 11.30 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 6.57 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°2

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

40120 RETJONS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale
0.50	27.00	Sable gris grossier plus ou moins gras
27.00	28.40	Sable fauve gras avec quelques coquilles
28.40	28.50	Argile marron

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	1.00	12"3/4	323.00	Tariere	Eau-claire
1.00	28.50	10"3/4	273.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	1.00	10"3/4	273.00	6.30		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.50	22.50	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
22.50	28.40	7"1/8	180.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	10"3/4	273.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			0.10
0.00	28.50	7"1/8	180.00	Gravier	Graviers de silacq	Circulation inverse	Roule	1.00-2.50	0.96

FORAGE D'EAU N°2

Travaux réalisés :
du : 05/10/2023 au : 13/10/2023

111

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

40120 RETJONS

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 437 765


Latitude (Y): 6 341 410

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/146

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

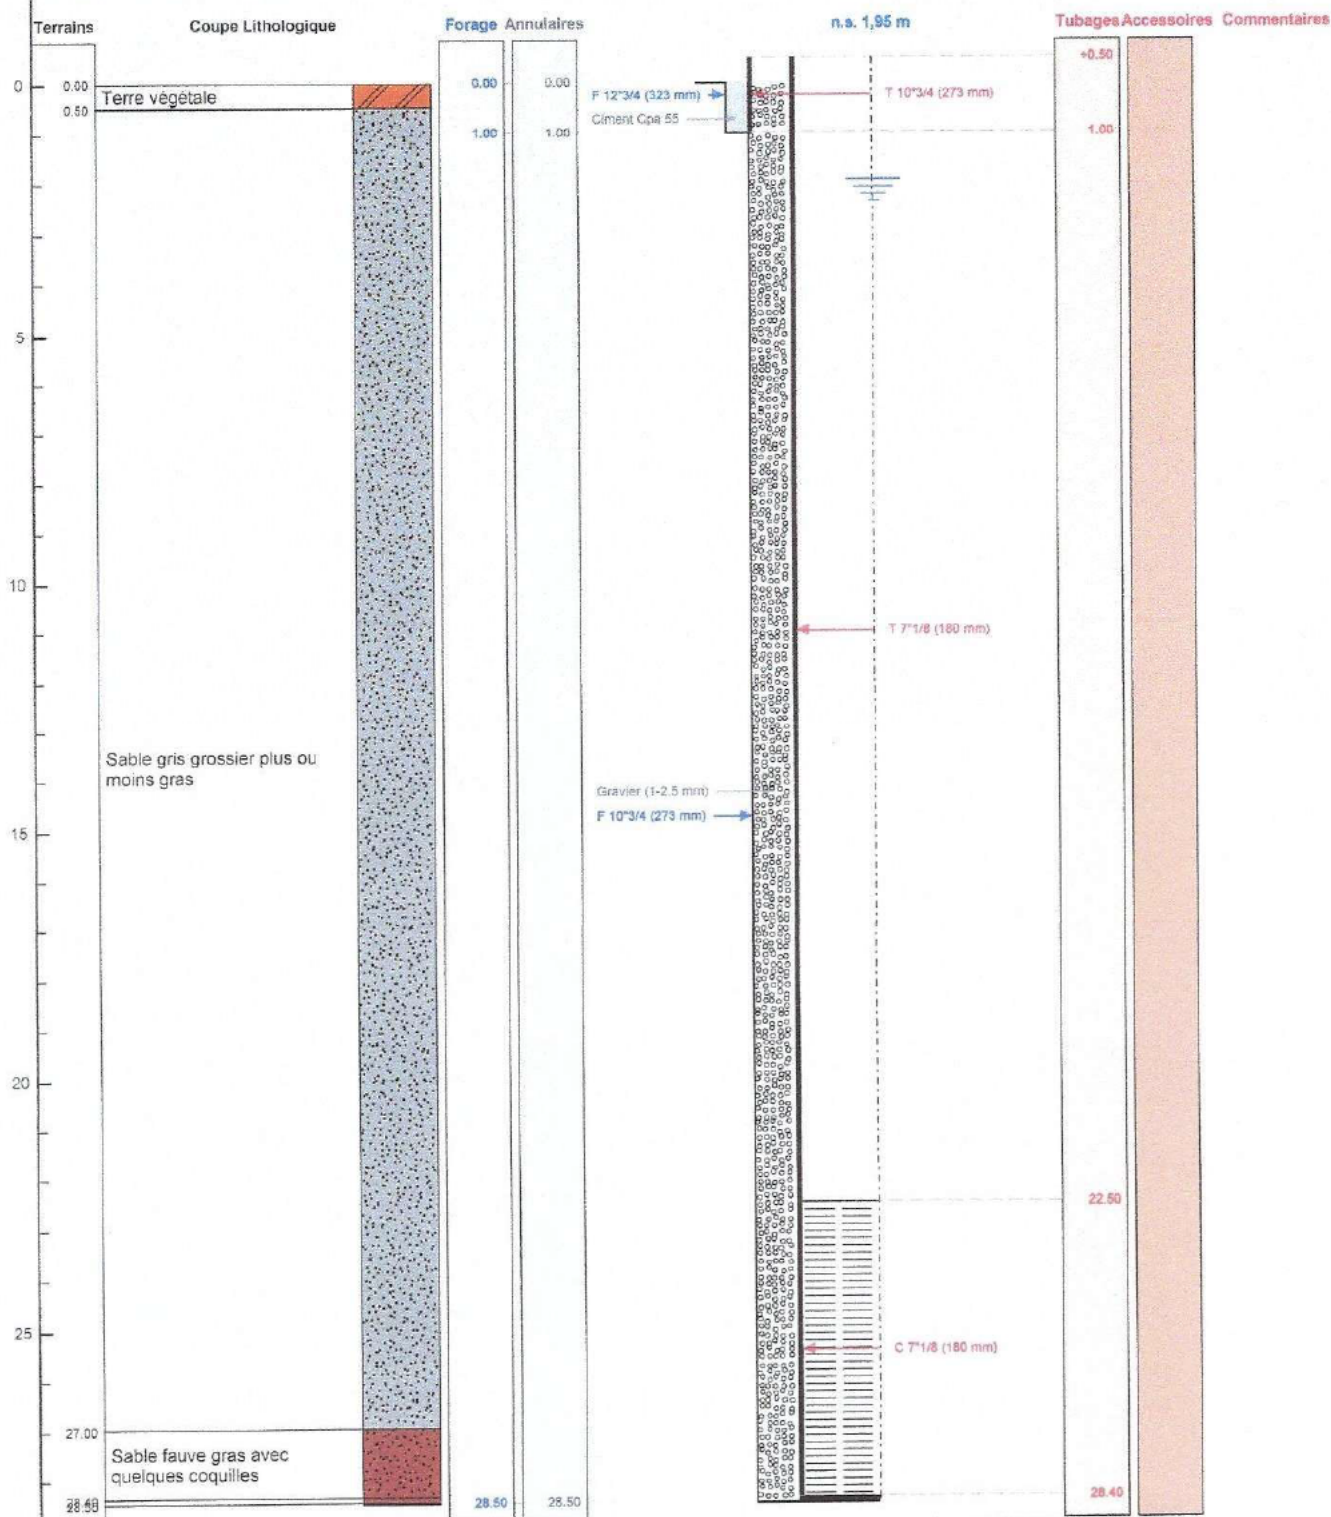

Le 25.10.2023 à Retjons
CERTIFIÉ CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

EARL JOUANILLON
