

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 390819

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 13 RUE DU PRESIDENT COTY
14170 HIEVILLE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 07/06/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 08/06/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 11.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 13 RUE DU PRESIDENT COTY

14170 HIEVILLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	4.00	CALCAIRE BLANC
4.00	14.00	ARGILE JAUNE
14.00	22.00	CALCAIRE BLANC EBOULANT GROS CAILLOUX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	22.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
16.00	1.00
20.00	4.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	18.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
18.00	22.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :
du : 07/06/2023 au : 08/06/2023

1/1

Client :

Maître d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 13 RUE DU PRESIDENT COTY
14170 HIEVILLE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0

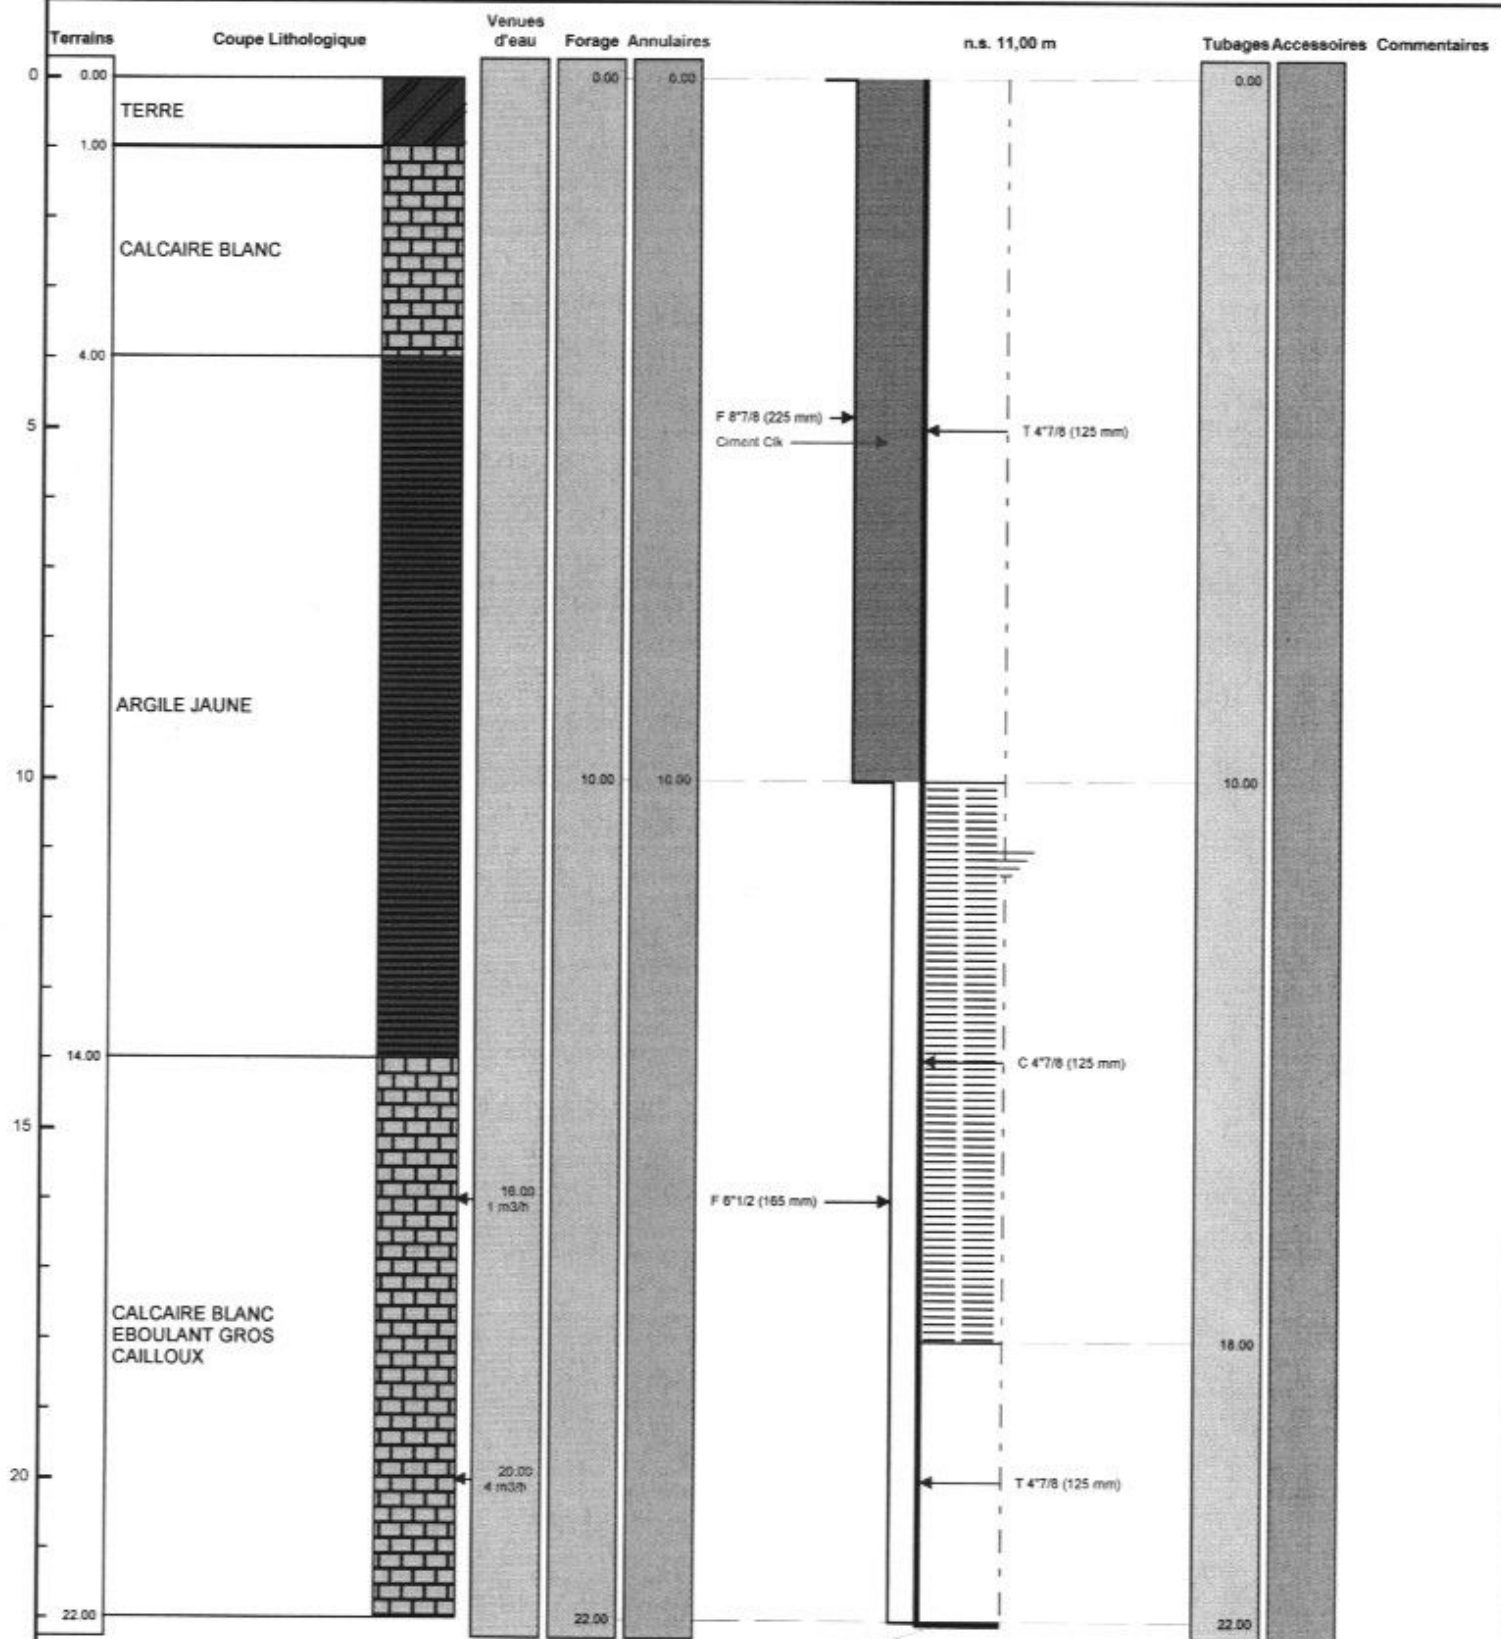
Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/111

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

Le 29.11.23... à
CERTIFIE CONFORME
Tampon et signature du

Lambert 1 carto m

: +0,000 m

PAGE: 3
