

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 821713

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 51 RUE DE BAYEUX
14740 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 29/01/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/01/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 15.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 2.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : FORAGE A COTE DU DEPOT DE LA VILLE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

51 RUE DE BAYEUX

14740

BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	TERRE
3.00	6.00	ARGILE ORANGE
6.00	8.00	CALCAIRE DEGRADE
8.00	40.00	ARGILE GRISE
40.00	49.00	CALCAIRE GRIS BLANC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 51 RUE DE BAYEUX

14740 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE

Travaux réalisés :
du : 29/01/2024 au : 29/01/2024

111

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0.000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

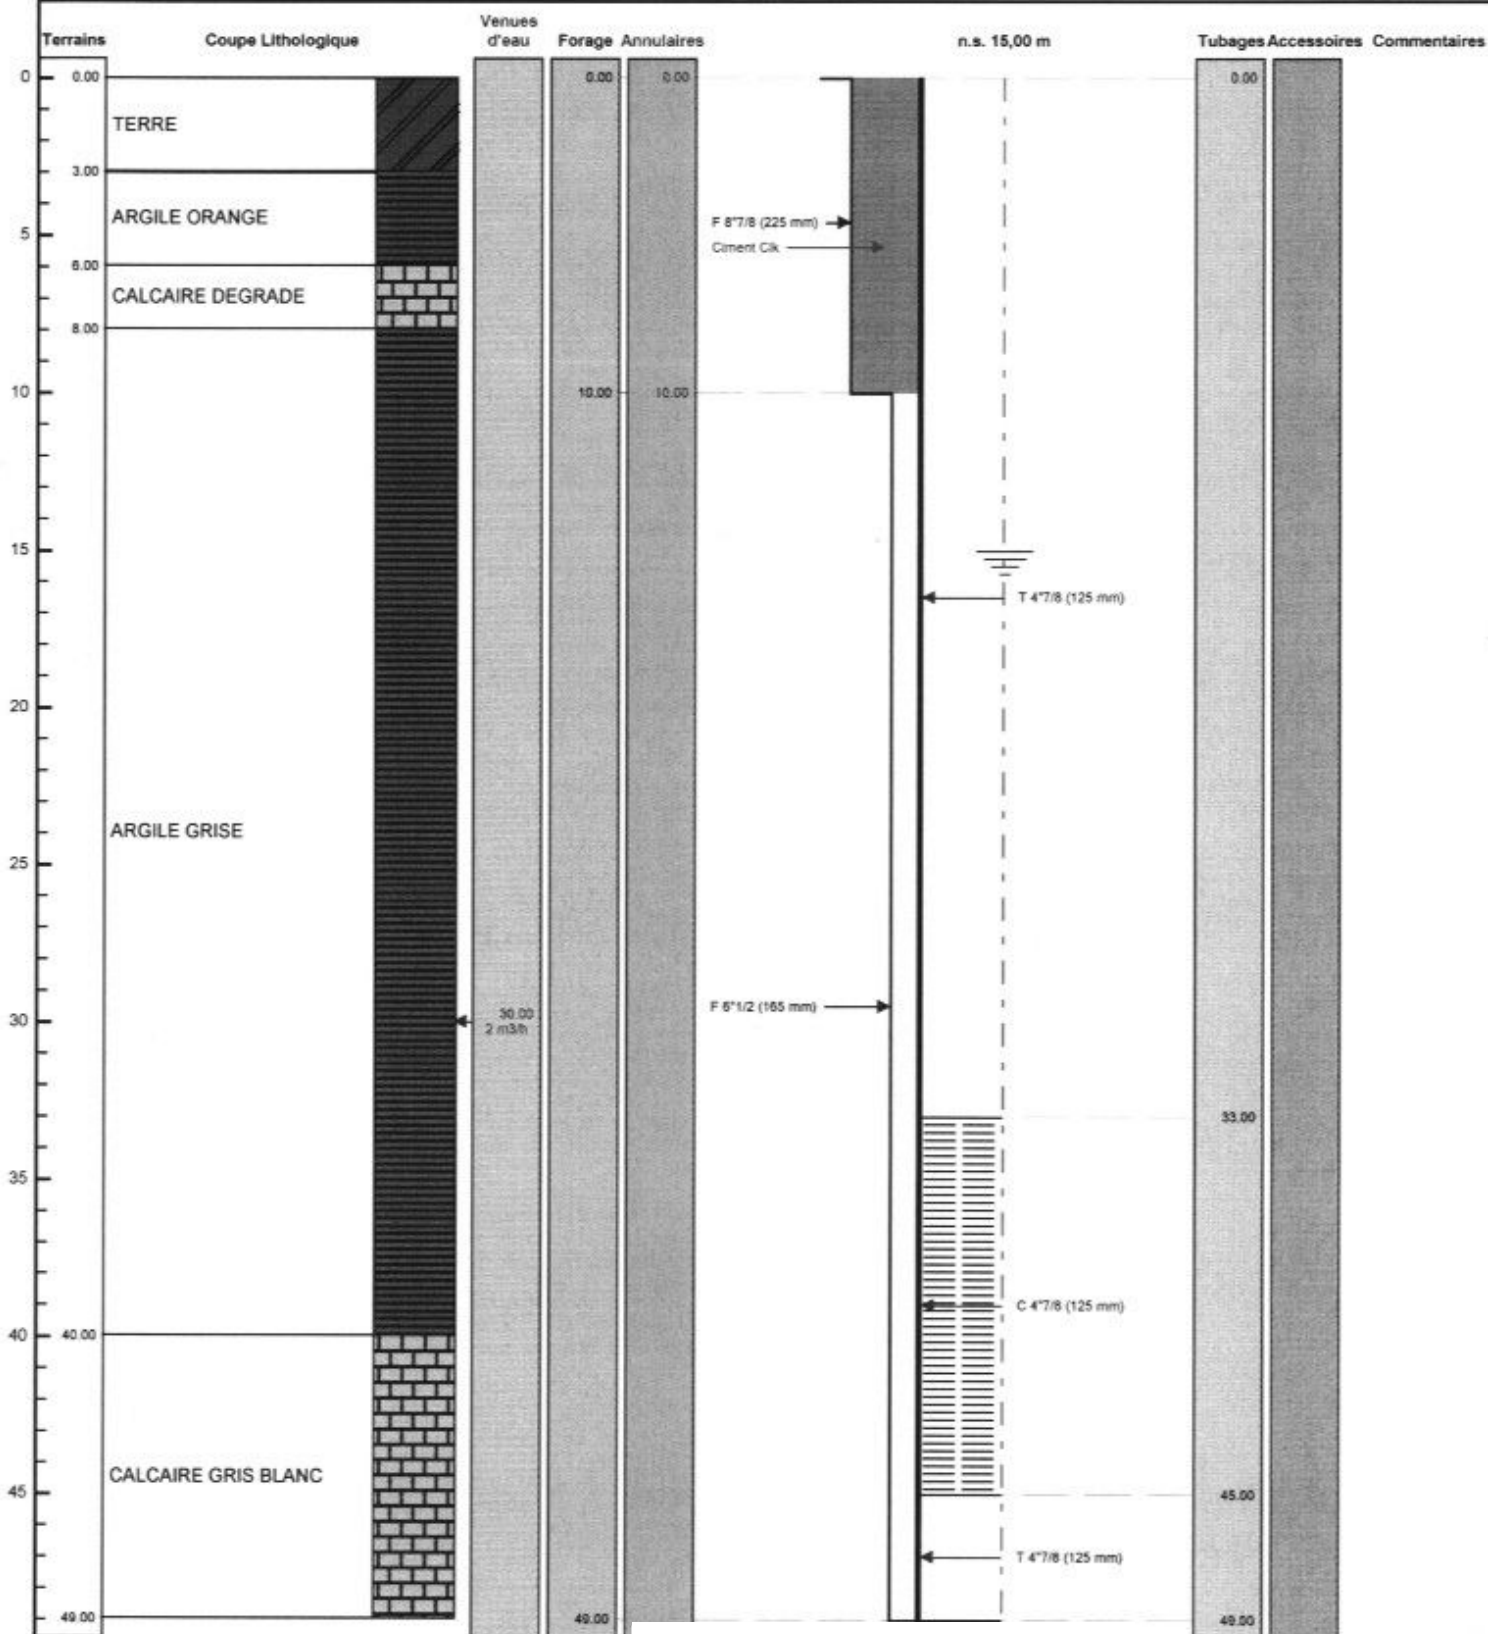

Le 08.02.2014 à 10h00
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRA
Tampon et signature du chef d'entre:

Lambert 1 carto métrique L
