


# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE DE PRODUCTION

Entreprise:	GTR FORAGES
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 18/07/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 28/07/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier : MR DREUX

Date début pompage : 25/07/2022

Niveau statique non perturbé : 75.00 m

Date fin de pompage : 27/07/2022

Débit Maxi. d'essai : 30.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Air lift double colonne pendant 2 heures  
Acidification sous pression ( 3 tonnes )  
Air lift double colonne pendant 4 heures



# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE DE PRODUCTION



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.60	Terre avec silex
0.60	5.50	Argile à silex
5.50	109.00	Craie blanche à silex ( perte d'injection à 90 m )

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	17"1/2	445.00	Rotary	Boue
20.00	109.00	12"1/4	311.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	12"3/4	323.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	73.72	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
73.72	108.50	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	3.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	12"3/4	323.00	Ciment	Clk	Sous pression			1.20
0.00	60.00	9"7/8	250.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	6.00-10.00	4.50

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot de fermeture
10.00	10.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
30.00	30.00	Centreur
40.00	40.00	Centreur
50.00	50.00	Centreur
60.00	60.00	Centreur
70.00	70.00	Centreur
80.00	80.00	Centreur



## ACCESSOIRE (suite)

De	à	Type d'accessoire
90.00	90.00	Centreur
100.00	100.00	Centreur

## FORAGE DE PRODUCTION

**Client :**  
**Maitre d'oeuvre :**  
**Localisation de l'ouvrage**


**Travaux réalisés :** 1\1  
du : 18/07/2022 au : 28/07/2022

**Coordonnées de l'ouvrage :**  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): 0  
 Latitude (Y): 0  
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/548

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

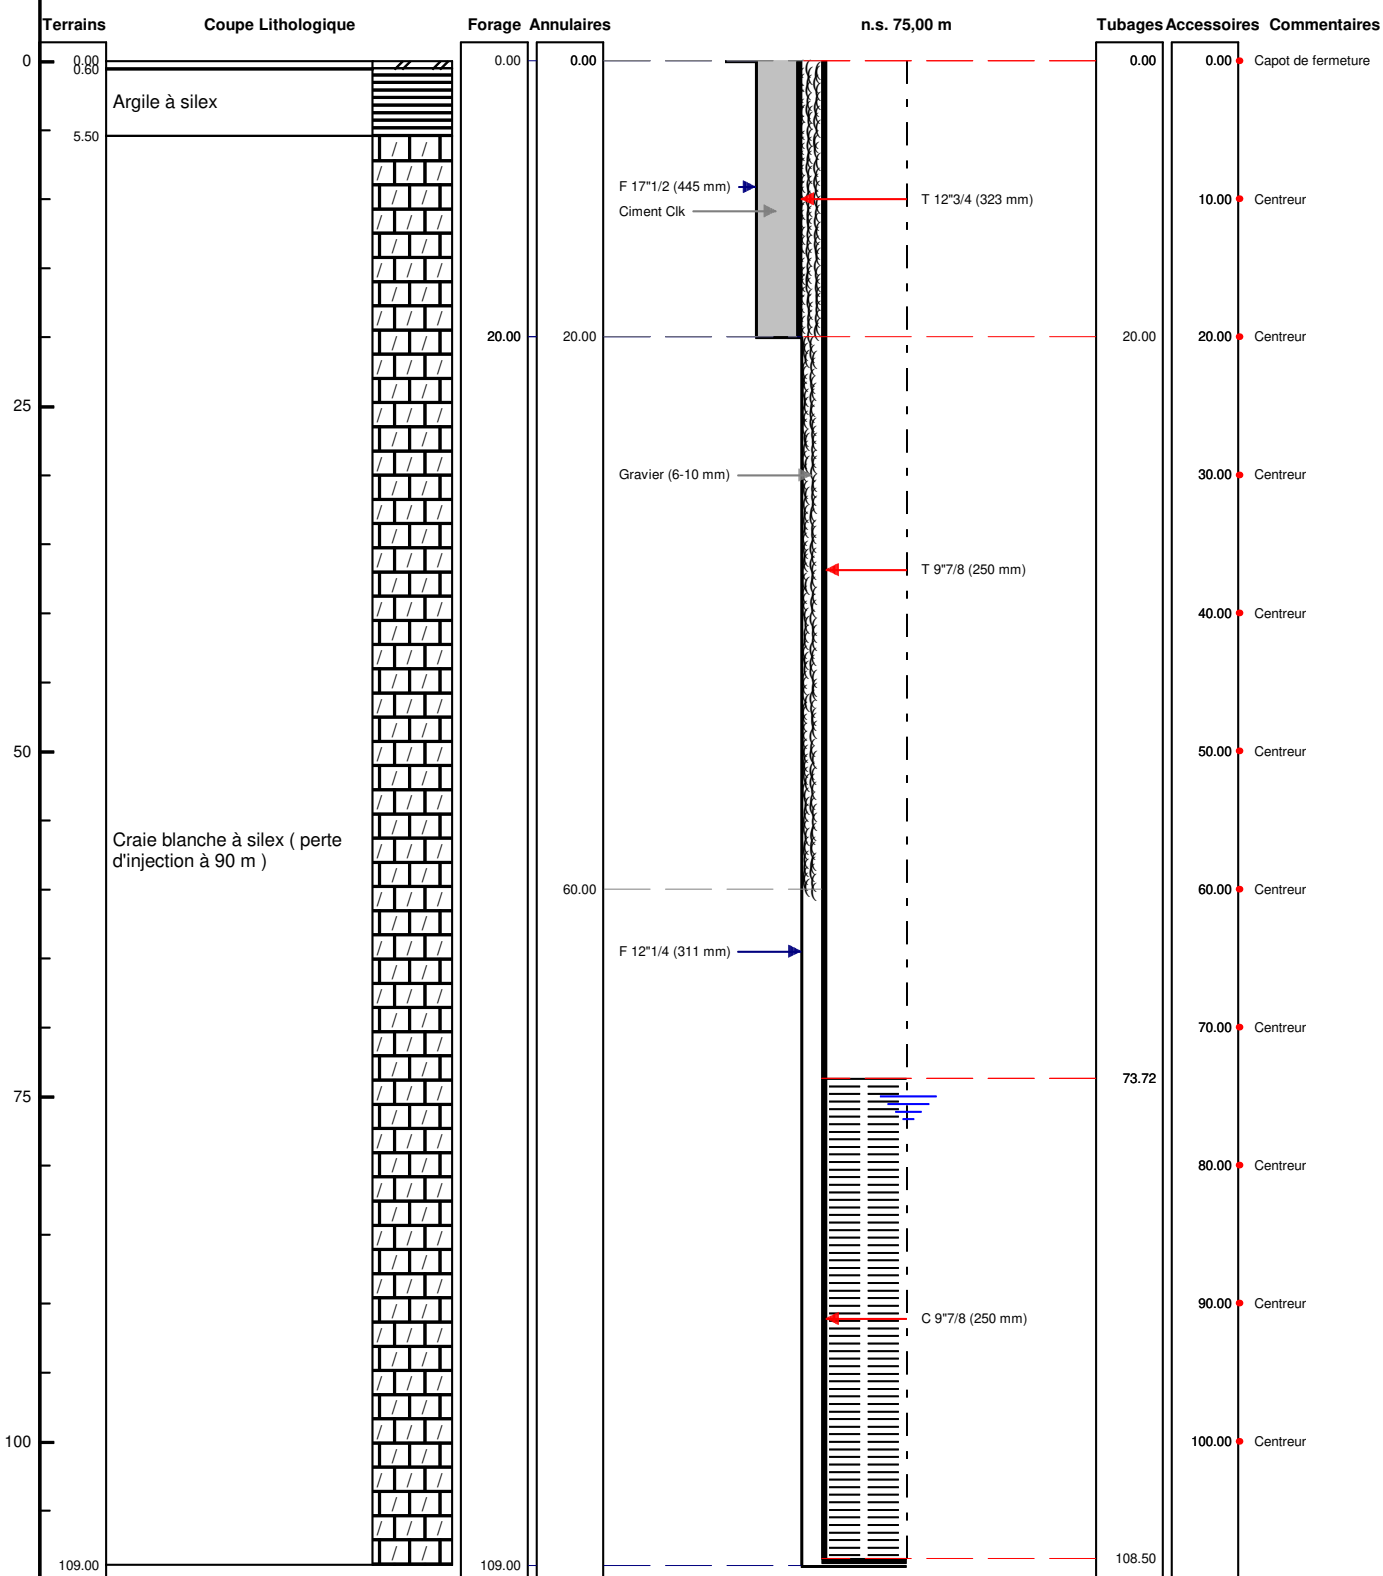

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
