

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/04/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 28/04/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	ALL
6.00	10.00	CAL
10.00	30.00	ARG
30.00	40.00	MAR
40.00	65.00	MAR
65.00	70.00	ARG

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	70.00	8"7/8	225.00	Roto-percussion	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
38.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	7"5/8	193.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	66.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
66.00	70.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Gravitaire			
0.00	15.00	7"5/8	193.00	Ciment	Autre	Gravitaire			
15.00	17.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				
17.00	70.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Concasse		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
70.00	70.00	Bouchon

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111

du : 27/04/2021 au : 28/04/2021

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/352

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

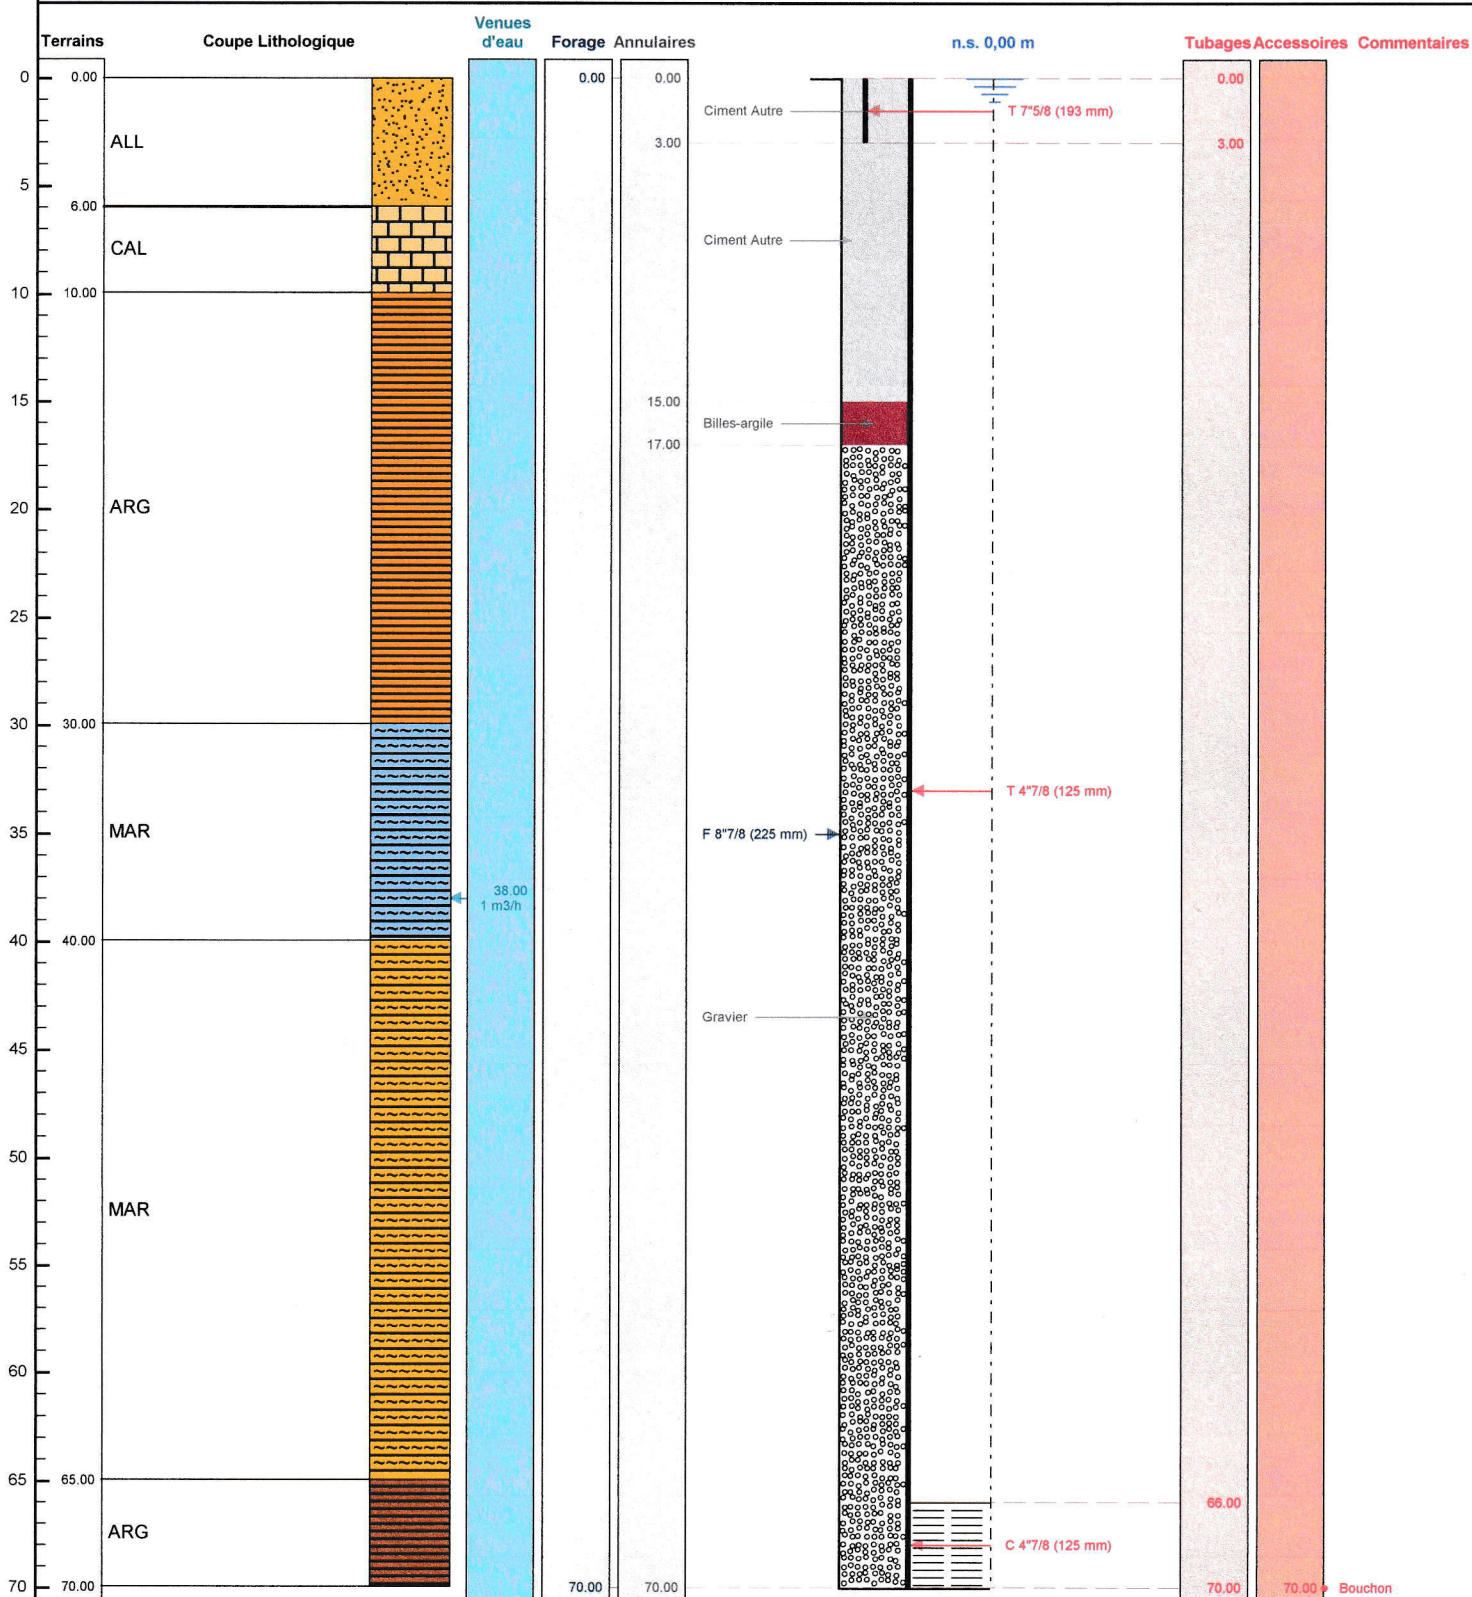

Le 28/04/2021 à Pauhan
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0

PAGE: 4
