


# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

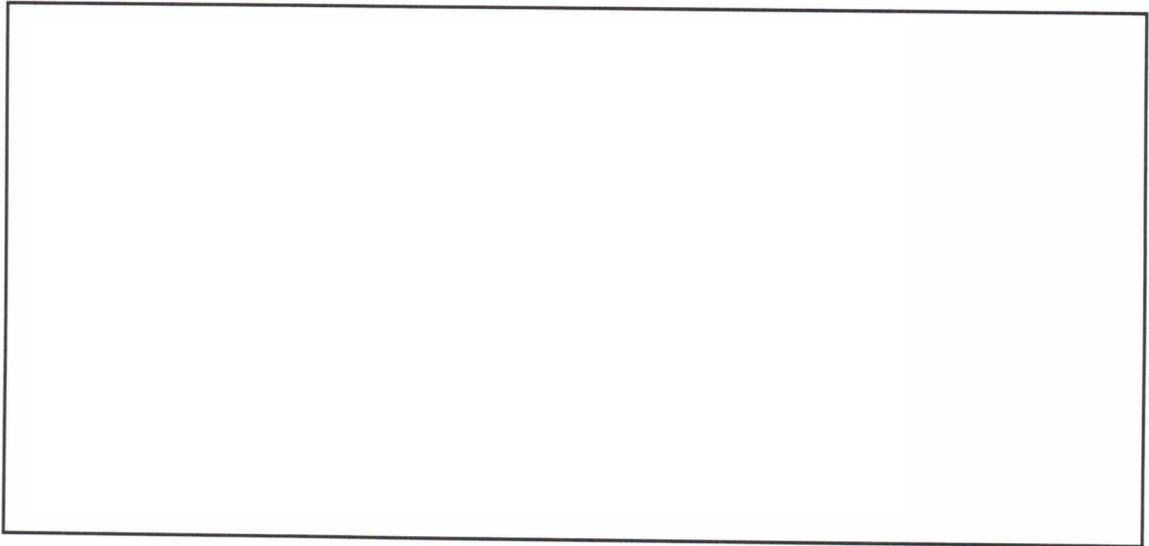

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :** 735760

**Police de l'eau \* :** 0100040273

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 1490 ROUTE D'LOUDALLE  
76430 ST AUBIN ROUTOT

**Coordonnées :** **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 110.00 m  
**Zone** Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 09/04/2024

**Resp. M. Ouvrage :** ODIEVRE

**Date fin de l'ouvrage :** 15/04/2024

**Resp. M. Oeuvre :** GAUTIER

**Machine :** ECOFORE

**Resp. Chantier :** GODEY

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 50.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 1.00 m<sup>3</sup>/h


**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU



### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	LIMON
6.00	18.00	ARGILE ROUGE MARRON A SILEX
18.00	25.00	CRAIE BLANCHE A SILEX + ARGILE NOIR
25.00	80.00	CRAIE BLANCHE A SILEX

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	80.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	64.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
64.00	76.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
76.00	80.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111  
du : 09/04/2024 au : 15/04/2024

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +110,000 m

Echelle : 1/402

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

