

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	PIJASSOU TP
Client:	
Maître d'oeuvre:	X
Exploitant:	
	87500 ST YRIEIX LA PERCHE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Route de Pauliac
24450 FIRBEIX

Coordonnées : Longitude 000°56'16,44"E Latitude 045°35'53,12"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 26/07/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 03/08/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MFT

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Route de Pauliac

24450 FIRBEIX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	14.00	TUFF
14.00	60.00	SCHISTE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	60.00	7"1/8	181.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	39.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
39.00	57.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine autre		
57.00	59.50	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-decanteur		
59.50	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Fond-conique		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	4"7/8	125.00	Ciment	Thermocem	Annulaire			
4.00	6.00	4"7/8	125.00	Billes-argile		Autre			
6.00	60.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.20

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :

1/1

du : 26/07/2022 au : 03/08/2022

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Route de Pauliac

24450 FIRBEIX

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X):

000°56'16,44"E

Latitude (Y):

045°35'53,12"N


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

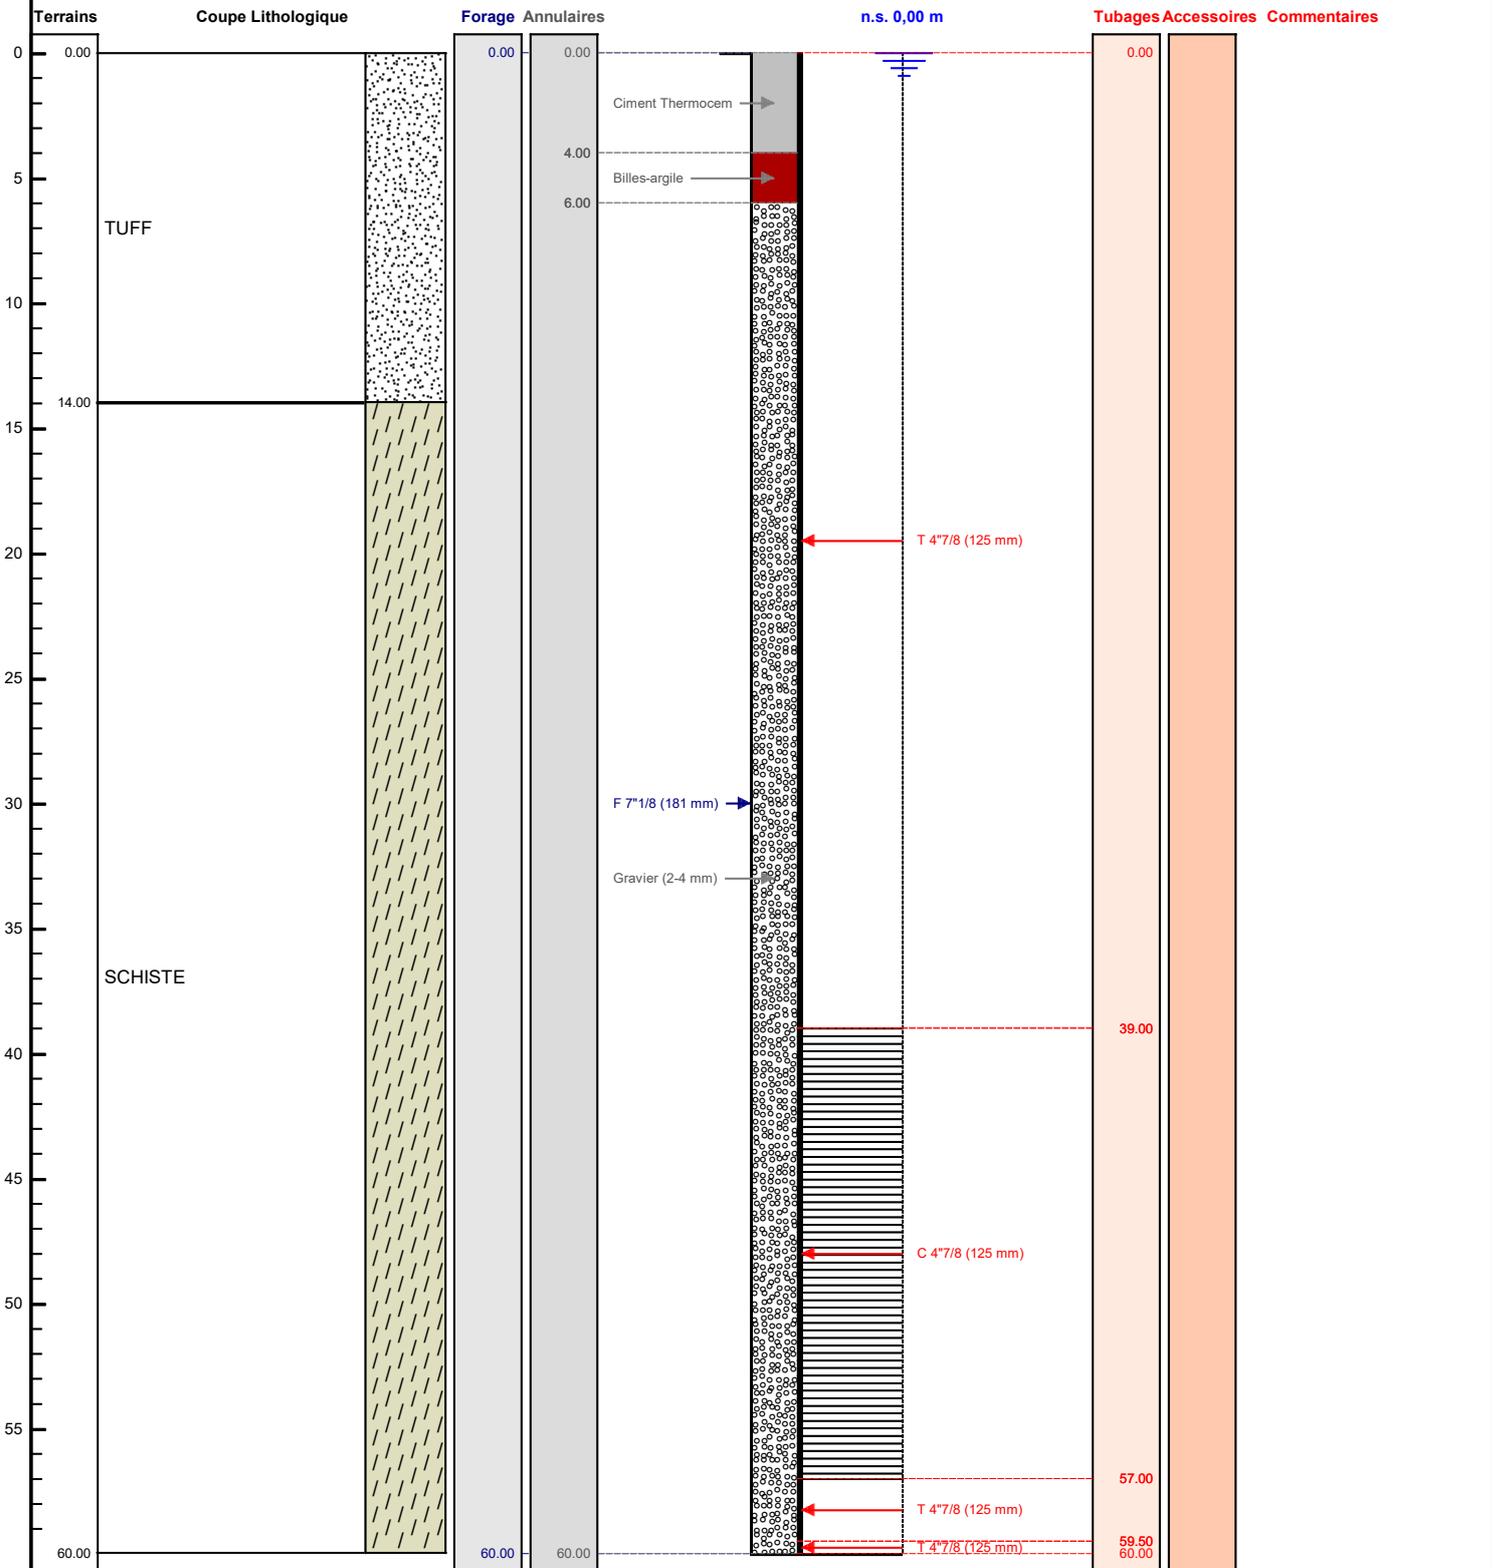

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : **Route de Pauliac**

24450 FIRBEIX

Travaux réalisés :

du : 26/07/2022 au : 03/08/2022

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

X: 000°56'16,44"E

Y: 045°35'53,12"N

Z altitude sol: +0,000 m

