

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Code National BSS :

BSS004KWBZ

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Ferme du pré bracot

68370 ORBEY

Coordonnées : Longitude 007°07'3,43"E Latitude 048°07'39,68"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 21/05/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/05/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Comachio

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

Ferme du pré bracot

68370

ORBEY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	ARGILE
3.00	18.00	GRE ROUGE
18.00	23.00	GRE + EAU
23.00	51.00	GRANIT

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	51.00	9"3/8	240.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
3.00	7.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
7.00	11.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
11.00	15.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
15.00	19.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
19.00	23.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
23.00	27.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
27.00	31.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
31.00	35.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
35.00	39.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
39.00	43.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
43.00	47.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Tube-plein		
47.00	51.00	5"1/2	140.00	7.00	11	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	

REMPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
17.00	18.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactionite				
18.00	51.00	5"1/2	140.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

Code BSS : / X	<b>FORAGE D'EAU</b>		<b>Travaux réalisés :</b> du : 21/05/2024 au : 23/05/2024	
<b>Client :</b>			<b>Coordonnées de l'ouvrage :</b> Géographique Longitude (X): 007°07'3,43"E Latitude (Y): 048°07'39,68"N Altitude sol (Z): +0,000 m	
<b>Maitre d'oeuvre :</b>				
<b>Localisation de l'ouvrage :</b>	<b>Ferme du pré bracot</b>			
	<b>68370</b>	<b>ORBEY</b>		

Echelle : 1/256

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

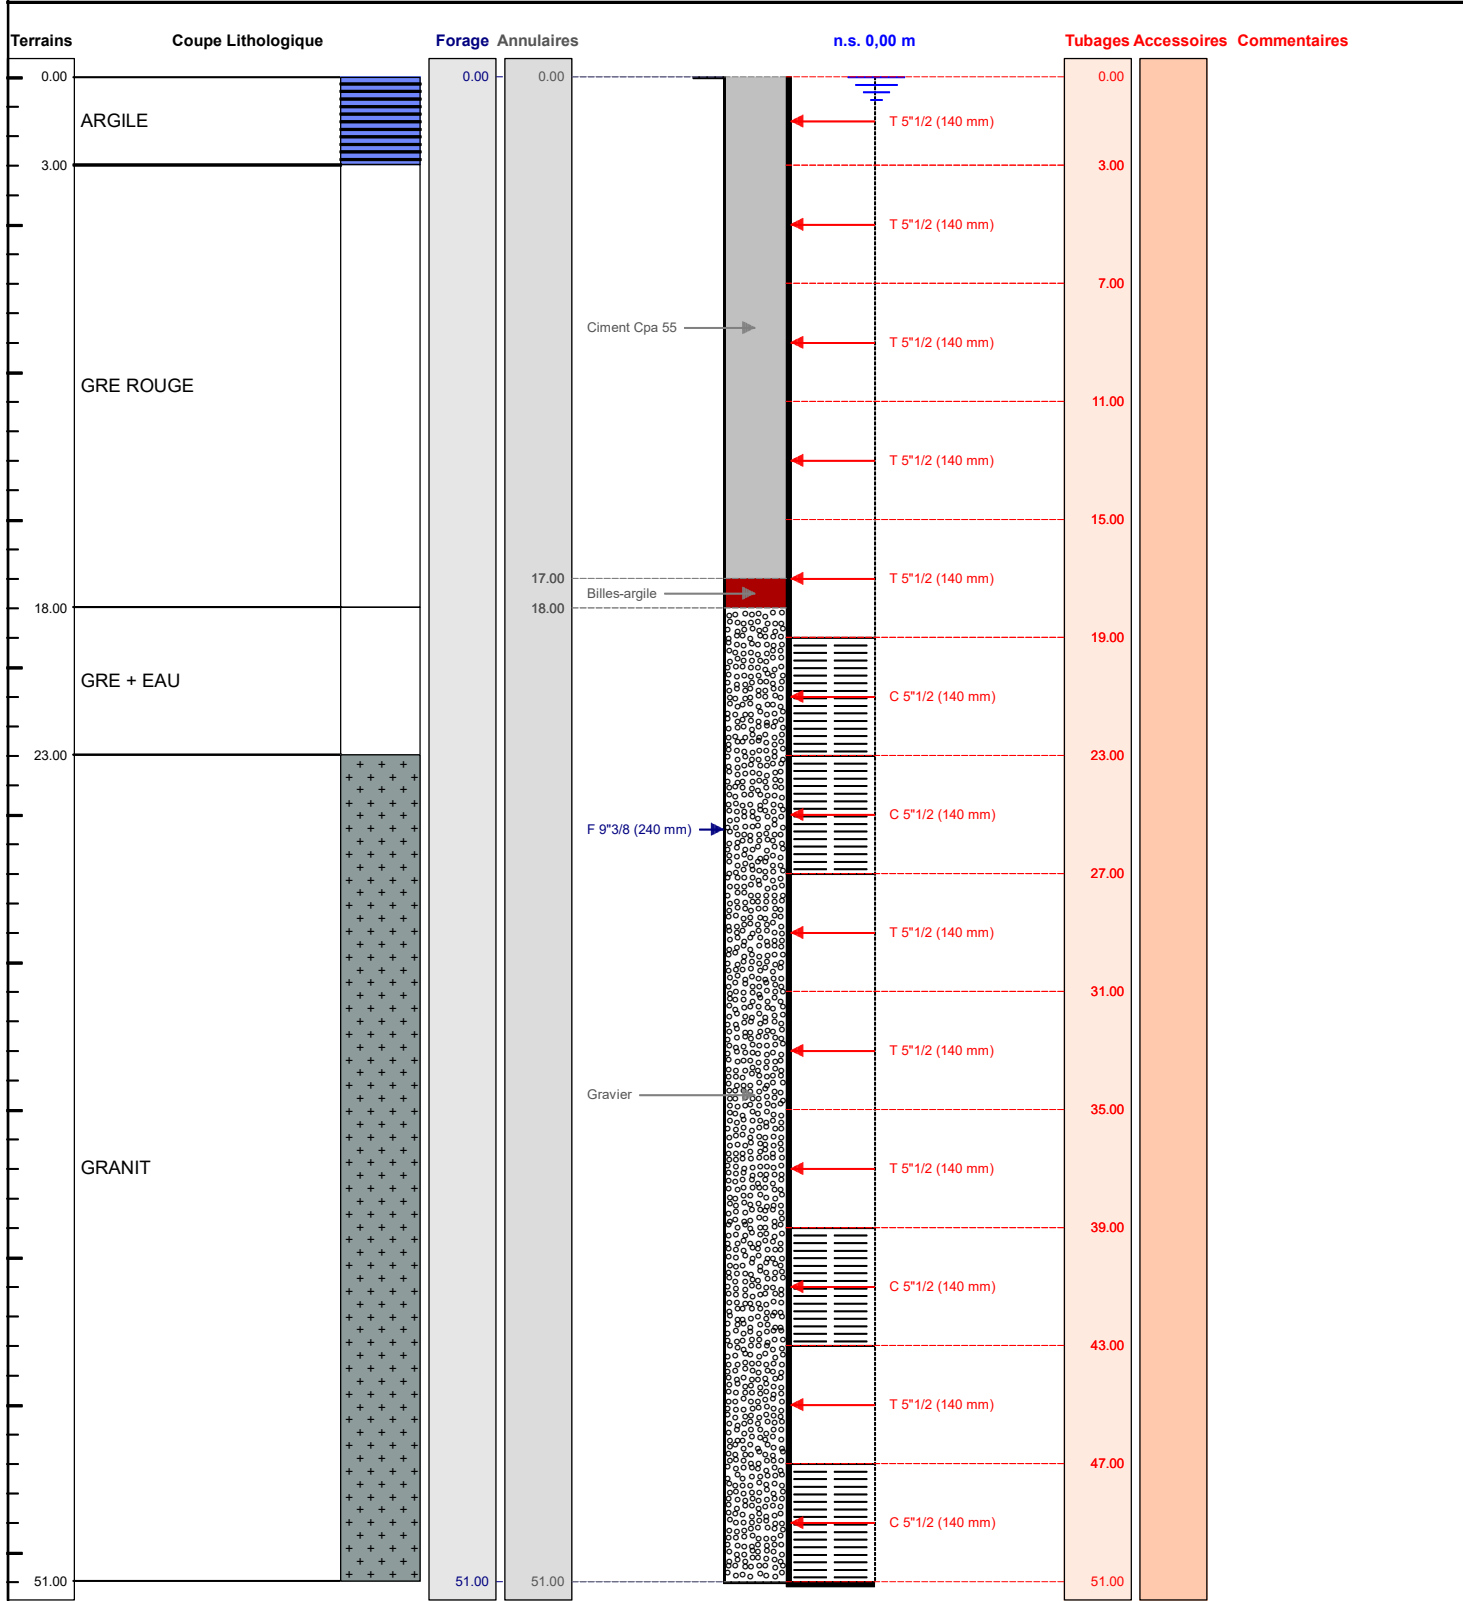

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
