



165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 – 95947 ROISSY CDG CEDEX

Tél. 33 (0) 1 48 63 08 08 − Fax 33 (0) 1 48 63 08 89 − E-mail : office@geofluid.fr S.A.R.L. au capital de 65 000,00 € - SIREN 794 554 782 RCS PONTOISE − APE 7112B



FORAGE D'EXPLORATION GEOTHERMIQUE A TAVERNY (95)

RAPPORT DE FIN D'OPERATIONS

DCE220083

QUALITE

Référence : DCE220083_IDEX_DOE_TAVERNY

Rédacteur	Vérificateur
François FREMONT	Julien GASSER-DORADO Pierre UNGEMACH

REVISION

Indice	Date	Chapitre concerné	Modification
V1	25/03/2022		

CLIENT

IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT

DIFFUSION

IDEX Croix Rouge Géothermie : Delphine DURIEUX, Stéphane AUFFRET, Yanis-Alexis HIRIDJEE, Clémentine JAFFRE & Larbi FASSI



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toute interprétation, recherche, analyse, données, résultats, estimations ou recommandation fournis avec les études, services ou autrement communiqués par Geofluid au client à tout moment en relation avec les services procèdent d'opinions basées sur des déductions de mesures, de relations empiriques et/ou des hypothèses, lesquelles déductions, relations empiriques et/ou hypothèses ne sont ni infaillibles, ni exemptes de différences d'interprétation de la part des professionnels du secteur. Par conséquent, Geofluid ne peut ni ne garantit l'exactitude, la justesse ou l'exhaustivité d'une telle interprétation, recherche, analyse, données, résultats, estimations ou recommandation. Le client reconnaît qu'il accepte les services "en l'état", que Geofluid ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte ou description à cet égard. Plus précisément, le client reconnaît que Geofluid ne garantit pas que l'interprétation, la recherche, l'analyse, les données, les résultats, les estimations ou les recommandations conviennent à un usage particulier, y compris, mais sans s'y limiter, la conformité à toute demande gouvernementale ou exigence réglementaire. Le client reconnaît également que ces services s'entendent au sens qu'ils sont produits avec la compréhension et l'accord explicites que toute action entreprise sur la base des services reçus le sera à ses propres risques et responsabilités et qu'aucune réclamation ne pourra être engagée contre Geofluid en conséquence.



SYNTHÈSE

IDEX Croix Rouge Géothermie avait pour projet de compléter l'actuelle chaufferie avec une boucle géothermale sur nappe, visant l'aquifère des Sables de Cuise. Toutefois, au vu des fortes incertitudes qui pesaient sur les caractéristiques pétrophysiques de l'aquifère yprésien au droit de Taverny, il a été décidé de procéder dans un premier temps à la réalisation d'un forage d'exploration (GTA1), afin de reconnaitre précisément le potentiel géothermique de la nappe.

Le présent document constitue le rapport de fin d'opérations de forage du puits GTA1, dont les travaux se sont tenus du 27/10/21 au 18/02/22.

Après complétion, le puits a longuement été développé, mais les performances de ce dernier restent faibles. De ce fait, le débit maximal d'exploitation du puits d'exploration de Taverny escompté sur le long terme s'élèverait à 21,5 m³/h.

La transmissivité de l'aquifère yprésien au droit de Taverny est comprise entre 1,2.10⁻³ et 1,4.10⁻³ m²/s. Un seul niveau producteur, d'une épaisseur de 1,5 m, a été identifié dans la partie supérieure des Sables de Cuise.



SOMMAIRE

1.	Obje	et	8
2.	Part	ties prenantes au projet	9
	2.1.	Maitrise d'ouvrage (MOA)	9
	2.2.	Maitrise d'œuvre (MOE)	9
	2.3.	Entreprise de forage	9
3.	Loca	alisation des travaux	10
4.	Rési	umé chronologique des opérations	11
5.	Cou	pe technique de l'ouvrage	12
6.	Inte	erprétation des diagraphies	13
	6.1.	Micro-moulinet	13
	6.2.	CBL	13
	6.3.	Inspection vidéo	13
	6.4.	Gamma-Ray	13
	6.5.	Contrôle de verticalité	13
7.	Cara	actéristiques physico-chimiques de l'eau géothermale	13
8.	Dév	eloppement de l'ouvrage	14
9.	Inte	erprétation des essais de fin de forage	14
	9.1.	Essais de pompage par paliers	14
	9.1.	1. Méthodologie d'interprétation	14
	9.1.	2. Déroulement des essais de pompage par paliers	15
	9.1.	3. Interprétation des essais de pompage par paliers	17
	9.2.	Essai de pompage longue durée	18
	9.2.	1. Méthodologie d'interprétation	18
	9.2.	2. Déroulement de l'essai longue durée	18
	9.2.	3. Interprétation de l'essai longue durée	18
10	. Con	clusion : débit d'exploitation envisageable	22
11	. Ann	nexes	23



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Résumé chronologique des opérations
Tableau 2 : Couples débit/rabattement des 4 paliers de débit des essais de pompage
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Localisation du forage d'exploration GTA110
Figure 2 : Localisation du forage d'exploration GTA110
Figure 3 : Coupe technique réelle du puits d'exploration de Taverny 12
Figure 4 : Suivi du niveau dynamique et du débit au cours des essais de pompage par paliers 16
Figure 5 : Courbe caractéristique du puits d'exploration de Taverny17
Figure 6 : Suivi du niveau dynamique et du débit au cours de l'essai longue durée 19
Figure 7 : Analyse de la descente du niveau par la méthode de Jacob (représentation logarithmique 20
Figure 8 : Analyse de la remontée du niveau par la méthode de MDH (représentation logarithmique
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Rapport de fin d'opérations de SANFOR24
Annexe 2 : Rapports journaliers de GEOFLUID



1. OBJET

IDEX Croix Rouge Géothermie a été désigné adjudicataire de la Délégation de Service Public (DSP) du réseau de chaleur de la ZAC de la Croix Rouge, située dans la ville de Taverny, celle-ci ayant été renouvelée en 2021.

Dans ce cadre, IDEX Croix Rouge Géothermie avait pour projet de compléter l'actuelle chaufferie avec une boucle géothermale sur nappe, visant l'aquifère des Sables de Cuise. Toutefois, au vu des fortes incertitudes qui pesaient sur les caractéristiques pétrophysiques de l'aquifère yprésien au droit de Taverny, il a été décidé de procéder dans un premier temps à la réalisation d'un forage d'exploration (GTA1), afin de reconnaitre précisément le potentiel géothermique de la nappe.

Le présent document constitue le rapport de fin d'opérations de forage du puits GTA1, dont les travaux se sont tenus du 27/10/21 au 18/02/22.



2. PARTIES PRENANTES AU PROJET

2.1. Maitrise d'ouvrage (MOA)

IDEX Croix Rouge Géothermie

148-152 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt

Représentant MOA:

Mme Delphine DURIEUX
 Directeur de Projets – AMO
 delphine.durieux@idex.fr
 06 25 05 04 46

2.2. Maitrise d'œuvre (MOE)

GEOFLUID

165, rue de la Belle Etoile BP 57072 95 947 Roissy CDG Cedex

Représentants MOE :

- M. Julien GASSER-DORADO
 Ingénieur Etudes
 julien.gasserdorado@geofluid.fr
 06 28 62 69 66
- M. François FREMONT
 Ingénieur des opérations
 francois.fremont@geofluid.fr
 06 28 62 68 41
- M. Miklos ANTICS

 Directeur exécutif

 m.antics@geoproduction.fr

 06 28 62 29 17

2.3. Entreprise de forage

SANFOR

8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault

Représentant Entreprise de forage :

M. Gérald Sancier
 Directeur
 gerald.sancier@sanfor.fr
 01 64 43 98 97



3. LOCALISATION DES TRAVAUX

Le forage d'exploration a été réalisé au bout de la rue de Montmorency, à Taverny (**Figure 1** et **Figure 2**).

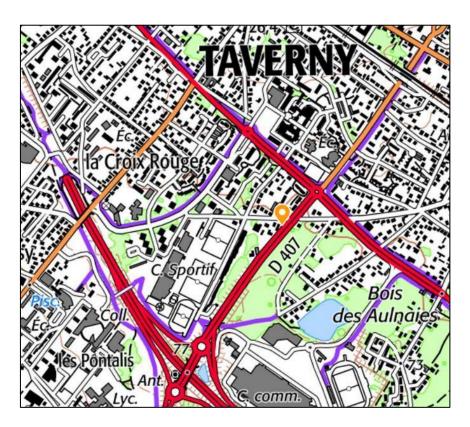


Figure 1 : Localisation du forage d'exploration GTA1



Figure 2 : Localisation du forage d'exploration GTA1



4. RESUME CHRONOLOGIQUE DES OPERATIONS

L'ensemble des opérations sont résumées dans le **Tableau 1**. GEOFLUID a supervisé les opérations. Les rapports journaliers de GEOFLUID sont présentés en **Annexe 2**.

Tableau 1 : Résumé chronologique des opérations

Dates	Opération
Du 27/10/21 au 05/11/21	Préparation de la plateforme Barriérage Livraison de matériel Installation du chantier Constat d'huissier Mise en station de la foreuse
Du 05/11/21 au 10/11/21	Réalisation de l'avant-trou (Ø 600 mm) Forage 26'' Cimentation du tubage Ø 565 mm Attente séchage
Du 15/11/21 au 18/11/21	Forage 22"
Du 18/11/21 au 29/11/21	Panne de la foreuse (retour en atelier)
Du 30/11/21 au 08/12/21	Forage 22"
Du 08/12/21 au 17/12/21	Perte de l'outil pilote 12"1/4 Repêchage de l'outil
Du 20/12/21 au 23/12/21	Forage 22"
Du 27/12/21 au 30/12/21	Cimentation du tubage Ø 406 mm Attente séchage
Du 03/01/22 au 05/01/22	Diagraphie : CBL Forage 14"3/4
Du 05/01/22 au 07/01/22	Mise en place des crépines Mise en place du massif filtrant
Du 10/01/22 au 09/02/22	Développement du puits à l'air-lift Développement du puits par pompage Développement du puits par injections de peroxyde d'hydrogène et pistonnage Diagraphie : micro-moulinet
10/02/22	Essais de pompage par paliers
Du 14/02/22 au 15/02/22	Essai longue durée
Du 16/02/22 au 18/02/22	Diagraphies (vidéo, GR et verticalité) Fermeture de l'ouvrage Démobilisation du chantier



5. COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

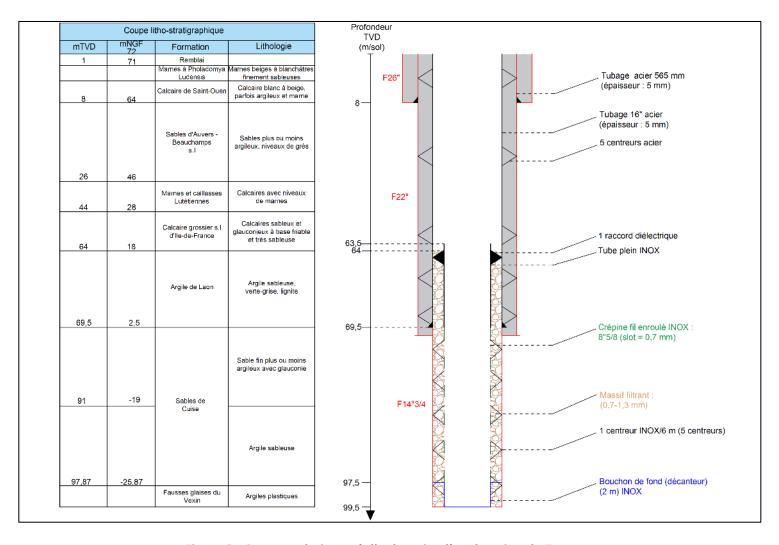


Figure 3 : Coupe technique réelle du puits d'exploration de Taverny



6. INTERPRETATION DES DIAGRAPHIES

Toutes les diagraphies ont été réalisées par SOLEO. Les logs sont consignés en **Annexe 1**. Les principales conclusions sont synthétisées ci-dessous.

6.1. Micro-moulinet

Le micro-moulinet a été réalisé en régime statique puis en régime dynamique, sous pompage à un débit d'environ 14 m³/h. Le seul niveau producteur identifié se situe entre 70,5 et 72 m/sol.

6.2. CBL

L'inspection CBL du tubage Ø 406 mm indique que celui-ci est bien cimenté.

6.3. Inspection vidéo

L'inspection vidéo montre un ouvrage en excellent état, sans anomalie détectable.

6.4. Gamma-Ray

La diagraphie GR n'indique aucune variation significative de l'argilosité au sein du réservoir.

6.5. Contrôle de verticalité

Le contrôle de verticalité montre que l'ouvrage ne subit pas de déviation particulière, avec des valeurs demeurant toujours inférieures à 1°.

7. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU GEOTHERMALE

Un prélèvement d'eau a été réalisé au cours de l'essai longue durée (le 15/02/22), lequel a été analysé en laboratoire. Les résultats sont consignés en **Annexe 1**.

La température de l'eau géothermale, mesurée en surface le 14/02/22, était de 13,5 °C.



8. DEVELOPPEMENT DE L'OUVRAGE

L'ouvrage a été longuement développé, du 10/01/22 au 09/02/22, avant de réaliser les essais de puits finaux. Le détail des séquences de développement est donné dans les **Annexe 1** et **Annexe 2**.

L'ouvrage a été développé surtout par air-lift et par pompage (continu ou alterné), mais aussi par deux injections de peroxyde d'hydrogène suivies à chaque fois d'un pistonnage de l'ouvrage puis d'un air-lift.

Avant ces injections, le débit de pompage a atteint au maximum 35 m³/h (le 19/01/22) pendant 4′57″. Le pompage a dû être arrêté du fait d'un rabattement important (50,88 m, non stabilisé) qui allait provoquer le dénoyage de la pompe.

Les injections de peroxyde d'hydrogène ont permis d'améliorer légèrement les performances de l'ouvrage. Ainsi, le débit de pompage a atteint 34,4 m³/h pendant quelques minutes (le 08/02/22), sous un rabattement de 25,52 m (niveau non stabilisé).

Après un mois de développement, les performances de l'ouvrage restant mauvaises et ne s'améliorant pas, il a été décidé de réaliser les essais de fin de forage.

9. INTERPRETATION DES ESSAIS DE FIN DE FORAGE

9.1. Essais de pompage par paliers

9.1.1. Méthodologie d'interprétation

Les pompages d'essais par paliers (ou essais de puits) ont pour objectif d'évaluer les caractéristiques hydrauliques intrinsèques au forage par une série d'essais à débits croissants.

L'interprétation des essais par paliers se fait graphiquement, en traçant le rabattement s en fonction du débit Q :

$$s = f(Q)$$

La courbe caractéristique du puits, après ajustement polynomial, suit en règle générale une formulation parabolique, soit :

$$s = BQ + CQ^2$$

Le terme BQ représente les pertes de charge linéaires, correspondant à l'écoulement laminaire dans le réservoir au voisinage du puits ; tandis que le terme CQ² représente les pertes de charge quadratiques, correspondant à l'écoulement turbulent lié aux pertes de charges singulières dans l'ouvrage.



Il est recommandé de limiter les écoulements turbulents en exploitation, lesquels génèrent des désordres physiques (entrainement de particules), chimiques (oxydation), générant un impact financier important (usure de la pompe et du forage, coût énergétique plus élevé).

9.1.2. Déroulement des essais de pompage par paliers

Les essais de pompage par paliers ont été réalisés le 10/02/22, et ont consisté en 4 paliers de pompages non-enchainés, de 2h, à débit croissant : 15, 20, 25 et 30 m³/h. Le débit a été limité à cette dernière valeur pour prévenir le risque de dénoyage de la pompe au cours des essais.

Le suivi du niveau dynamique et du débit est présenté en **Figure 4**. Au bout de 2h, le niveau dynamique peut être considéré comme pseudo-stabilisé pour le premier palier. En revanche, le niveau dynamique n'est pas stabilisé pour les trois paliers suivants.

La courbe caractéristique de l'ouvrage est présentée en **Figure 5**, tracée à partir des couples débit/rabattement (**Tableau 2**).

Au début des essais, le niveau statique était à 34,3 m/sol.

Tableau 2 : Couples débit/rabattement des 4 paliers de débit des essais de pompage

Débit moyen (m³/h)	Rabattement (m)	Niveau dynamique (m)
15,2	10,4	44,6
20,2	13,8	48,1
25	16,4	50,7
30	20,8	55,1



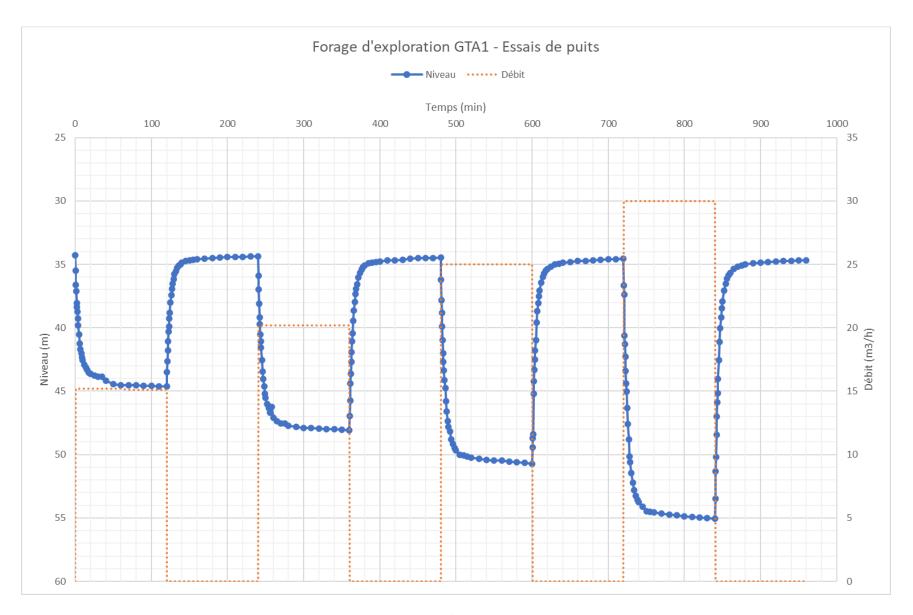


Figure 4 : Suivi du niveau dynamique et du débit au cours des essais de pompage par paliers



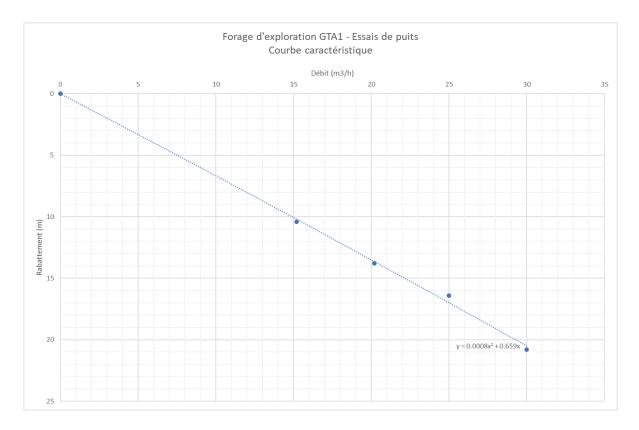


Figure 5 : Courbe caractéristique du puits d'exploration de Taverny

9.1.3. Interprétation des essais de pompage par paliers

L'équation de la courbe caractéristique (Figure 5) est :

$$s = 0,659.Q + 0,0008.Q^2$$

La courbe caractéristique est une droite. L'écoulement serait donc essentiellement laminaire, et le débit critique n'est pas atteint.

On note par ailleurs que l'indice de productivité du puits est très faible, de l'ordre de 1,5 m³/h/m quelque soit le débit de pompage, ce qui génère un important rabattement.



9.2. Essai de pompage longue durée

9.2.1. Méthodologie d'interprétation

Cet essai a pour but d'évaluer les caractéristiques hydrodynamiques du réservoir, notamment la transmissivité. La nappe étant captive, deux méthodes ont été utilisées :

- La méthode de Jacob, sur la courbe de rabattement obtenue au cours du pompage ;
- La méthode de Miller-Dye-Hutchinson (MDH), sur la courbe de remontée des niveaux, obtenue après l'arrêt du pompage.

Ces méthodes sont des interprétations des graphiques :

$$MDH: \Delta H = log(t')$$

$$Jacob: s = log(t)$$

La détermination de la pente Δh ou Δs , pour un cycle logarithmique, permet d'établir la transmissivité hydraulique par la relation suivante :

$$\mathsf{MDH}: \ T \ = \ \frac{2,3}{4\pi} \frac{\mathit{Q}}{\Delta h}$$

Jacob:
$$T = \frac{2,3}{4\pi} \frac{Q}{\Delta s}$$

9.2.2. Déroulement de l'essai longue durée

L'essai longue durée a été réalisé du 14/02/22 au 15/02/22, en continu pendant 24h. Le suivi du niveau dynamique et du débit est présenté en **Figure 6**. Le débit a été fixé à 20,5 m³/h.

Au bout de 24h, le niveau dynamique du puits est pseudo-stabilisé à 48,8 m/sol, soit un rabattement de 14,6 m. L'indice de productivité correspondant est de 1,4 m³/h/m.

Les courbes logarithmiques de l'abaissement du niveau dynamique au cours du pompage et de la remontée du niveau suite à l'arrêt du pompage sont présentées respectivement en **Figure 7** et **Figure 8**.

Au début des essais, le niveau statique était à 34,2 m/sol.

9.2.3. Interprétation de l'essai longue durée

Les équations précédemment exposées permettent, par lecture graphique, d'établir la transmissivité de l'aquifère :

- Par la méthode de Jacob : T = 1,2.10⁻³ m²/s ;
- Par la méthode de MDH : $T = 1,4.10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$.



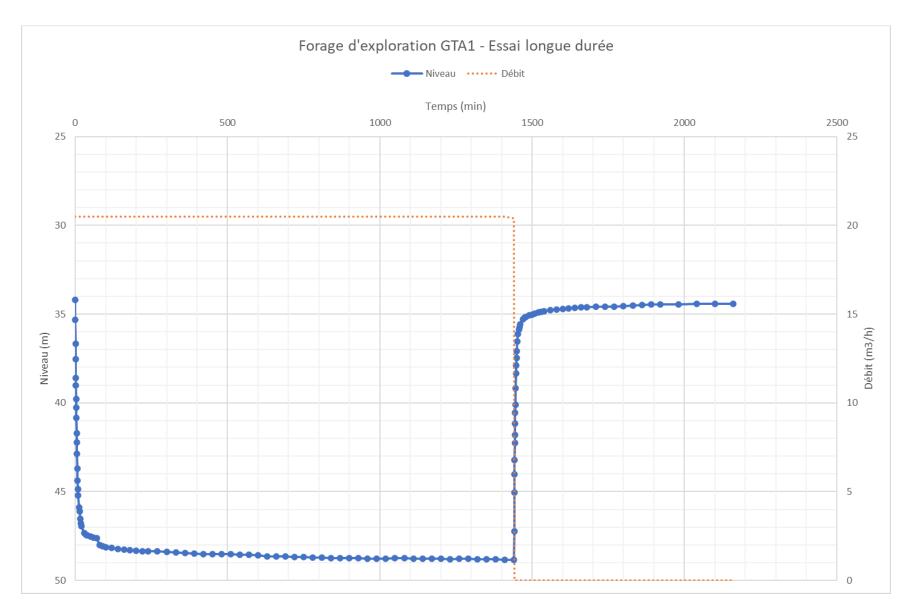


Figure 6 : Suivi du niveau dynamique et du débit au cours de l'essai longue durée



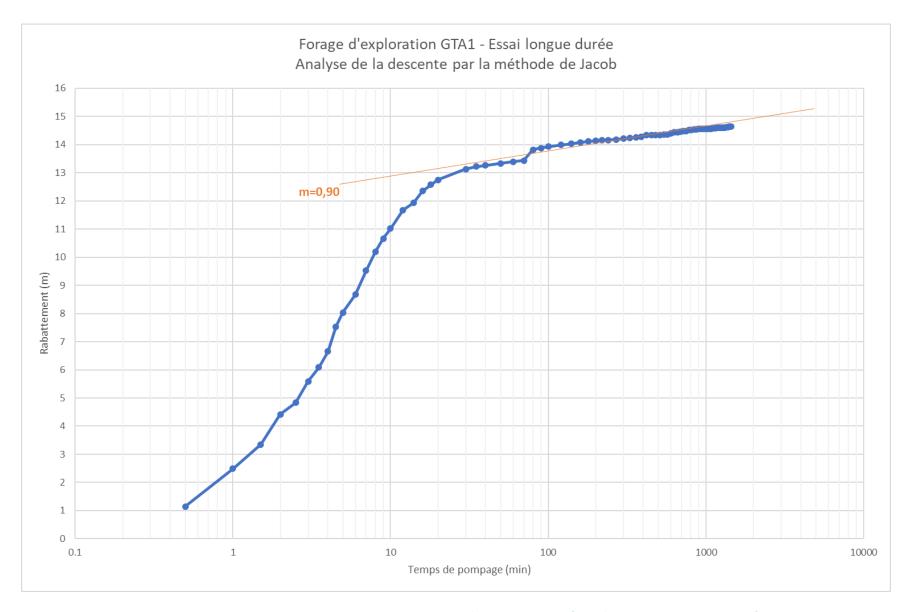


Figure 7 : Analyse de la descente du niveau par la méthode de Jacob (représentation logarithmique)



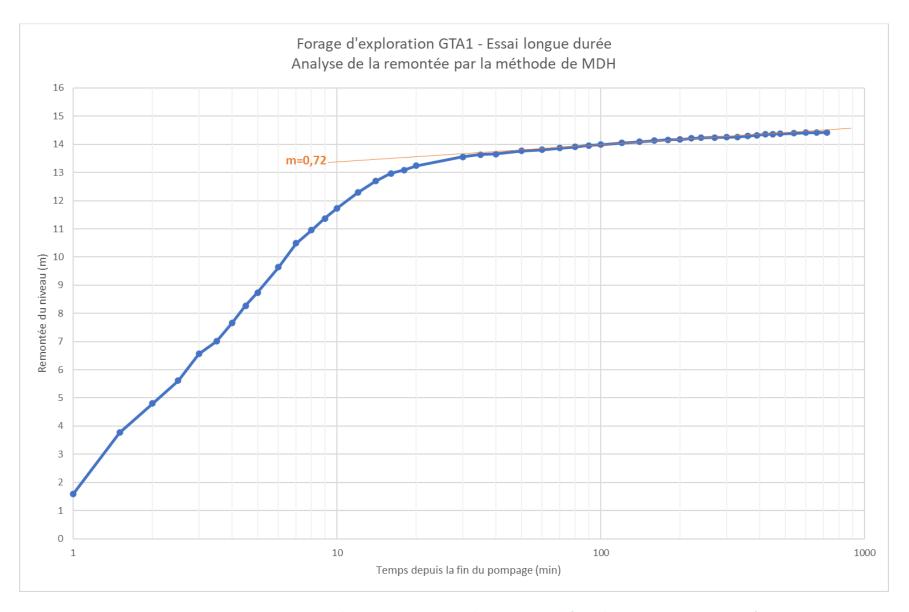


Figure 8 : Analyse de la remontée du niveau par la méthode de MDH (représentation logarithmique)



10.CONCLUSION: DEBIT D'EXPLOITATION ENVISAGEABLE

Les travaux ont permis de forer, équiper et tester le puits d'exploration GTA1 et d'évaluer la faisabilité d'une exploitation géothermique des Sables de Cuise à Taverny. Les incidents survenus au cours du chantier (panne de la foreuse, perte de l'outil pilote 12"1/4) n'ont pas remis en cause la bonne exécution de l'ouvrage.

Après complétion, le puits a longuement été développé, mais les performances de ce dernier restent faibles. En effet, l'indice de productivité du puits est très faible, de l'ordre de 1,4 m³/h/m quelque soit le débit de pompage, ce qui génère un important rabattement.

Ainsi, en considérant les hypothèses suivantes :

- La pompe de production est placée le plus bas possible dans la partie tubée du forage, c'està-dire à 69,5 m/sol, l'aspiration est donc à 68 m/sol;
- Une marge de sécurité de 3 m est gardée au-dessus de l'aspiration de la pompe ;
- Le niveau statique est à 34,3 m/sol;

Le rabattement maximal admissible est théoriquement de 30,7 m. En considérant un indice de productivité de $1,4 \text{ m}^3/\text{h/m}$, alors le débit maximal d'exploitation serait de $43 \text{ m}^3/\text{h}$.

Toutefois, on rappellera que :

- L'indice de productivité est surestimé, le niveau dynamique n'étant pas parfaitement stabilisé à la fin des essais. Ainsi, le débit maximal mentionné ci-dessus est lui aussi surestimé ;
- Cette estimation ne prend pas en compte l'inévitable dégradation de l'ouvrage. D'ailleurs, le micro-moulinet a montré que le réservoir ne comportait qu'un seul niveau producteur, d'épaisseur réduite (1,5 m), de surcroit en position haute. Une telle configuration entrainera inéluctablement une dégradation rapide des performances globales de l'ouvrage, en comparaison d'un réservoir avec plusieurs niveaux producteurs répartis le long de la colonne captante;
- Enfin, il est admis que la vitesse d'entrée de l'eau dans les crépines ne doit pas dépasser 3 cm/s, sous peine de créer des désordres tels que la déstabilisation du massif de gravier. Avec un seul niveau producteur de 1,5 m, la vitesse de 3 cm/s est atteinte pour un débit de 24 m³/h.

Ainsi, en faisant l'hypothèse réaliste que les performances du puits vont diminuer de 50% dans un futur proche, le débit maximal d'exploitation envisageable atteindrait tout au plus 21,5 m³/h.

Le débit maximal d'exploitation du puits d'exploration de Taverny envisageable sur le long terme est donc de 21,5 m³/h.

Par ailleurs, notons que la présence d'un seul niveau producteur n'est pas favorable à la réinjection.



11.ANNEXES

Annexe 1 : Rapport de fin d'opérations de SANFOR	. 24
Annexe 2 : Rapports journaliers de GEOFLUID	145



Annexe 1 : Rapport de fin d'opérations de SANFOR



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique

Rue de Montmorency

95150 Taverny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 - 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



TITRE								
	ort fin de ier des C			ıtés				
N° PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND	122
832	SANF	DOE	GEO	DOC	TZ	101	Α	
FORMAT:	м	SI	JRF:		DATE: 1	6 mars 2022	* *	10.7



Table des matières

1.	OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
2.	DOCUMENTS DE REFERENCE	3
2.1 -	- DOCUMENTS CONTRACTUELS.	3
2.2-	- DOCUMENTS DOE	3
3.	FORMATIONS GEOLOGIQUES RENCONTREES	3
4.	IMPLANTATION DU FORAGE	4
5.	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX	5
5.1 -	- FORAGE	5
5.2	- EQUIPEMENTS	5
5.3 -	- TRAVAUX DE DEVELOPPEMENTS.	6
5.4-	- ESSAIS DE POMPAGE	
5.5-	- PROTECTION DU FORAGE	
5.6-	- DIAGRAPHIES	7
6	DOCUMENTS DOE	





1. Objet et consistance des travaux

La Société SANFOR a été désignée par le Maître d'Ouvrage IDEX pour l'exécution d'un forage de reconnaissance géothermique à Taverny sis rue de Montmorency (95).

Les travaux ont été réalisés du 05 novembre 2021 au 18 février 2022.

2. Documents de référence

2.1 - Documents contractuels

• CCTP – GEOFLUID

DCE21192_CCTP_explo_Taverny

Rédacteur : François FREMONT - Vérificateur : Julien GASSER-DORADO

Indice: V1 du 01/09/2021

2.2 - Documents DOE

- Fiche technique tubage acier Ø 565mmm 832-SANF-DOE-GEO-FP-TZ-300-A
- Fiche technique tubage acier Ø 406mmm 832-SANF-DOE-GEO-FP-TZ-301-A
- Fiche technique tube et crépine inox Ø 219mmm 831-SANF-DOE-GEO-FP-TZ-302-A
- Massif filtrant 0.8/1.3mmm 832-SANF-DOE-GEO-FP-TZ-304-A
- Ciment Fondacem 832-SANF-DOE-FP-TZ-303-A
- Coupe technique et géologique 832-SANF-DOE-GEO-CP-TZ-151-A
- Analyse d'eau 832-SANF-DOE-GEO-NC-TZ-054-A
- Pompages par paliers et longue durée 832-SANF-DOE-GEO-NC-TZ-200-A
- Diagraphie CBL 832-SANF-DOE-GEO-DOC-TZ-250-A
- Micromoulinet 832-SANF-DOE-GEO-DOC-TZ-251-A
- Camera Verticalité Gamma ray 832-SANF-DOE-GEO-DOC-TZ-252-A
- Analyse granulométrique Sable de Cuise 832-SANF-DOE-GEO-NC-TZ-058-A

3. Formations géologiques rencontrées

Coordonnées Lambert 93: x: 643031.71

00.00 à 01.00 m	Remblais
01.00 à 08.00m	Calcaire blanc à beige avec passage argileux et marne - Calcaire de Saint Ouen
08.00 à 26.00m	Sable argileux verdâtre avec niveaux de grès - Sable de Beauchamps
26.00 à 44.00m	Calcaires avec niveaux de marnes - Marnes et caillasses du Lutétien
44.00 à 64.00m	Calcaires sableux et glauconieux à base friable et sableuse - Calcaires grossiers du Lutétien
64.00 à 69.50m	Argile sableuse verte à grise et lignite – Argile de Laon
69.50 à 91.00m	Sable fin plus ou moins argileux avec glauconie - Sables de Cuise
91.00 à 97.90m	Argile sableuse – Sables de Cuise
91.00 à 97.90m	Argile sableuse – Sables de Cuise
97.90 à 99.50m:	Argile plastique – Fausses glaises du Vexin

y: 6880176.11

z: + 72.00 NGF





4. Implantation du forage







5. Descriptions des travaux

5.1 - Forage

00.00 - 07.80m	Forage Ø 444.5mm du 05 au 08/11/2021
00.00 - 07.80m	Elargissage Ø 660mm du 05 au 08/11/2021
07.80 - 61.00m	Forage Ø 311mm du 15 au 17/11/2021 Arrêt du chantier cause panne foreuse du 18 au 29/11/2021
$61.00 - 69.50 \mathrm{m}$	Forage Ø 311mm le 30/11/2021
07.80 - 25.80 m	Elargissage Ø 558mm du 01 au 06/12/2021
	Repêchage de l'outil pilote Ø 311mm du 07 au 17/12/2021
25.80 - 69.50m	Elargissage Ø 558mm du 20 au 27/12/2021
69.50 - 72.50m	Forage Ø 381mm pour diagraphie CBL le 03/01/2022
72.50 - 99.50m	Forage Ø 381mm du 04 au 05/01/2022

5.2 - Equipmeents

00.00 - 07.80m	Cimentation sous p	Ø 565mm le 09/11/2021 pression lis de ciment – Densité 1.8 – Volume injecté : 1200 litres			
00.00 - 69.50m	Cimentation sous pression Injection d'un coulis de ciment – Densité 1.8 – Volume injecté : :				
		fesure du top ciment : 8.40m lis de ciment – Densité 1.8 – Volume injecté : 1000 litres iagraphie CBL			
63.60 – 99.50m	Pose équipements	inox Ø 219mm le 06/01/2022			
	63.50 - 69.50 m	Tubage inox 304 Ø 219 x 5mm + baïonnette de largage			
	69.50 - 97.50 m	Crépine inox 304 Ø 219mm, fil enroulé, slot 0.7mm			
	97.50 - 99.50 m	Tubage inox 304 Ø 219 x 5mm + fond soudé			
	Pose d'un centreur	r diélectrique 219/394mm à – 64.00m			

Pose de 5 centreurs inox 219/381mm entre – 69.50m et – 99.50m

Mise en place de filtration siliceux roulé $0.8 \ a$ 1.3 mm de -66.00 m a -99.50 m





5.3 - Travaux de développements

06/01/2022 - Pose de l'unité d'air-lift Nettoyage à l'air-lift : 3 heures

07/01/2022 - Nettoyage à l'air-lift : 6 heures

10/01/2022 - Nettoyage à l'air-lift : 2 heures Repêchage de la colonne d'air-lift

11/01/2021 - Pose de l'unité d'air-lift Nettoyage à l'air-lift : 6 heures

12/01/2022 - Nettoyage à l'air-lift : 8 heures

13/01/2022 - Nettoyage à l'air-lift : 2 heures Dépose de l'unité d'air-lift Pose de la pompe d'essai à – 63.50m

14/01/2022 - Pose de la pompe d'essai à - 89.80m Pompages de développements en continu + marche/arrêt : 2 heures

17/01/2022 - Pose de la pompe d'essai à - 89.80m Pompages de développements en continu + marche/arrêt : 8 heures

18/01/2022 - Pompages de développements en continu + marche/arrêt : 8 heures Niveau statique : 34.72m/sol – Niveau dynamique : 77.72m/sol – Débit : 15m3/h

19/01/2022 - Pompages de développements marche/arrêt : 8 heures

20/01/2022 - Micromoulinet sous pompage

21/01/2022 - Dépose de la pompe d'essai Préparation de l'unité d'injection + pistonnage

24/01/2022 - Injection d'une solution d'H²O²
Quantité injectée : 200 litres
Pistonnage dans les crépines : 5 heures
Rebouchage constaté : 6.00m

25/01/2022 - Nettoyage à l'air-lift : 8 heures

26/01/2022 - Dépose de l'unité d'air-lift Pose de la pompe d'essai

28/01/2022 - Pompages de développement : 6 heures

31/01/2022 - Pompages de développement : 8 heures





01/02/2022 - Dépose de la pompe d'essai Pose de l'unité d'air-lift + pistonnage

02/02/2022 - Injection d'une solution d'H²O²
Quantité injectée : 200 litres
Pistonnage dans les crépines : 5 heures
Rebouchage constaté : 2.50m

03/02/2022 - Nettoyage à l'air-lift : 6 heures Dépose de l'unité d'air-lift

04/02/2022 - Pose de la pompe d'essai Dépose de la pompe d'essai suite défaut d'isolement moteur

07/02/2022 - Pose de la pompe d'essai Pompages de développement : 1 heure

08/02/2022 - Pompages de développement : 6 heures

09/02/2022 - Pompages de développement : 7h30 heures

16/02/2022 - Dépose de la pompe immergée

5.4 - Essais de pompage

10/02/2022 - Pompages par paliers

14 au 15/02/2022 - Pompages longue durée 24h00 + analyse d'eau

5.5 - Protection du forage

Soudure et mise en place d'une bride plate DN 400 sur le tube acier ϕ 406mm. Pose d'un tampon acier DN 400 sur la bride plate DN 400 compris joint et boulonnerie.

Protection du forage par mise en place d'une buse béton autour du forage le 18/02/2022.

5.6 - Diagraphies

Les diagraphies suivantes ont été réalisées le 17/02/2022.

- Gamma-ray
- Contrôle de verticalité
- Inspection caméra





6. Documents DOE



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX




Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



Coup	e technic	que et g	éologiq	ue du	forage	GTA1		
N° PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND	
832	SANF	DOE	GEO	CP	TZ	151	Α	
FORMAT:	м	su	RF:		DATE: 16	6 mars 2022		



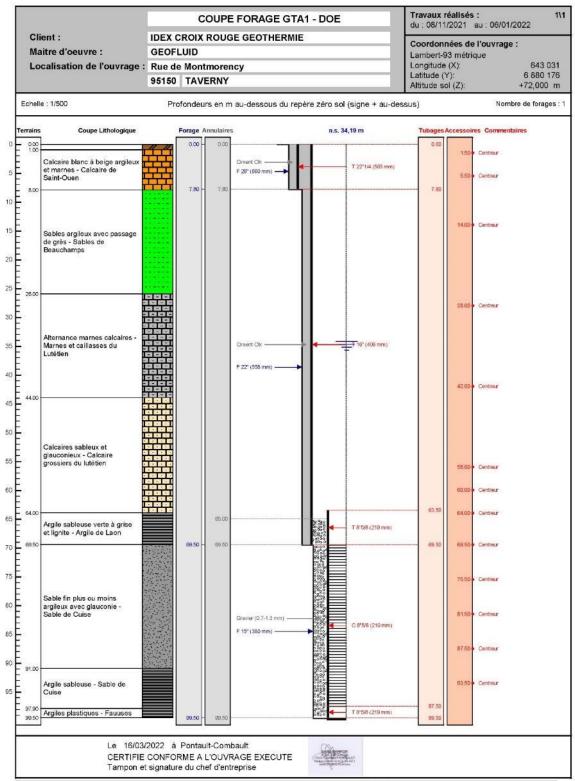

Lambert-93 métrique Long.: 643 031 Lat.: 6 880 176 Alt.: +72,000 m PAGE: 1



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



TITRE	8							
Essai	s de pon	npage p	ar palie	rs et le	ongue	durée		
N° PRÔJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND	
832	SANF	DOE	GEO	NC	TZ	200	Α	
FORMAT:	м	su	RF:		DATE: 1	5 mars 2022		-





POMPAGE D'ESSAI PAR PALIER

Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,26 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Descente du palier n° 1

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
0/02/22	8h	0			15,2 m³/h	
		0	30	35,48	200400000000000000000000000000000000000	
		1	0	36,62		
		1	30	37,13		
		2	0	38,04		ľ
		2	30	38,37		
		3	0	38,72		
		3	30	39,28		
		4	0	39,79		
		5		40,52		
		6	1 1	41,24		
		7		41,71		
		8		42,03		
		9		42,31		
		10		42,56		
		12		42,93		
		14		43,14		ľ
		16		43,32		i.e.
		18		43,53		
		20		43,62		
		25		43,76		
		30		43,84		
		35		43,86		
		40		44,18		
		50		44,45		
	1	0		44,51		





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu: rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,26 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10		44,52	15,4 m³/h	
	1	20		44,54		
	1	30		44,57		8
	1	40		44,59		
	1	50		44,61		
	2	0		44,63		8
						(
						12
						ģ.
						1
		_				
						8
		+				
	4			b		U
		1		-		b
						R
		 				
	ī.	1				7
		 		-		
		 	1			() ()





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu: Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,26 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Observations
10/02/22		0			
		0	30	43,48	
		1	0	42,63	
		1	30	41,81	
		2	0	41,07	- 3
		2	30	40,39	
		3	0	39,88	
		3	30	39,26	
		4	0	38,84	li e
		5		38,03	į.
		6		37,43	
		7		36,92	
		8		36,52	
		9		36,17	Ľ
		10		35,78	
		12	1 1	35,53	j.
		14		35,26	
		16		35,09	ľ
		18		34,98	
		20		34,86	-
		25		34,74	
		30		34,67	
		35		34,63	
		40		34,60	
		50		34,53	ľ
	1	0		34,50	





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu: rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,26 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10		34,46		
	1	20		34,43		
	1	30		34,42		
	1	40		34,40		
	1	50		34,38		
	2	0		34,36		S
		-	-			
						<u>.</u>
				1		
				+		
						2
		_				i.
	9	-		-		
						:
						2
		1				
		 		-		
		1				





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
10/02/22		0			20,2 m ³ /H	
		0	30	35,88		
10		1	0	36,19		
		1	30	38,11		
	ĺ	2	0	39,16		3 2
		2	30	39,74		
		3	0	40,53		
		3	30	41,06		
		4	0	41,58		7
		5		42,53		2 2
	1	6		43,47	5	
		7		44,03		
		8		44,62		
	Į.	9		45,21		104 6 54
		10		45,51		
		12		46,03		
		14		46,31		
		16		46,68		
	9	18		46,94		
		20		47,08		30
		25		47,35		
	1	30	8	47,54		
()		35		47,52		
	7	40		47,70		
T I		50		47,82		
	1	0		47,88		





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10		47,9		3 <u>20</u>
	1	20		47,93		1 0. 1 (1)
	1	30		47,97		
	1	40		47,98		100 100
	1	50		48,04		
	2	0		48,07		- 20
	d le			5.		(c)
						9
	2					
				,		
		-				ő.
			0	3.		0
	¥					
						100 100
						0





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	7	0	1			¥ 2.
		0	30	46,94		
		1	0	45,76		
		1	30	44,41		
		2	0	43,64		
	Ì	2	30	42,67		20
	ij	3	0	41,92		
i i		3	30	41,08		30
		4	0	40,44		3 0
		5		39,47		
	j	6		38,66		
		7		37,97		
		8		37,36		
		9		36,92		
		10		36,58		
		12		36,03		
		14		35,67		0
Į.		16		35,42		
		18		35,24		3/3
		20		35,09		
		25		34,92		
		30		34,87		
		35		34,81		
	Ĭ	40		34,76		0.00
		50		34,70		
	1	0		34,67		00





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10	8	34,62		91 17
	1	20		34,56		8 to 10 to 1
	1	30		34,52		
	1	40		34,50		100 100
	1	50		34,49		
	2	0		34,48		27/ 27
		-		5		0
	Ĭ					
	-					
						20) 20
						*
		 				
						02
	ii .		8			α





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
0/02/22	3	0			25 m³/h	
		0	30	36,20		
		1	0	37,85		
		1	30	38,80		
		2	0	39,92		21
		2	30	40,97		
		3	0	42,00		
J.		3	30	42,69		
		4	0	43,38		
		5		44,11		300
		6		44,75		
	j	7		45,79		3 (9 3 ()
		8		46,61		
		9		47,27		- 12 - 20
		10		47,80		
		12		48,19		
	16	14		48,80		
1		16	3	49,18		36
		18		49,46		
	ì	20		49,65		
		25		50,00		
		30		50,08		
		35		50,15		9 0 2 2
		40		50,22		
	Ī	50		50,35		
J.	1	0	3	50,43		





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10	1	50,46		2
	1	20		50,48		22
	1	30		50,55		
	1	40		50,62		
	1	50		50,64		
	2	0		50,73		272 272
	ij le			6		9
						5
	8					50 54
		-	_			
- 5	8	1				9
			- 8			
						50 55
		-				
	ii.					2
	14	_	_			2
	is .	_	_			
	*			8		95
					The state of the s	





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	7	0	8			2
	į.	0	30	49,45		2 S.
		1	0	48,70		
		1	30	48,38		
		2	0	45,21		
		2	30	44,20		
	ij .	3	0	43,22		a a
		3	30	42,49		300
	7	4	0	41,78		0
	Ī	5		41,00		
		6		39,58		
		7		38,70		
		8		38,05		
		9		37,52		
		10		37,07		
	2	12		36,44		
		14		36,00		
į,		16	- 9	35,70		
		18	3	35,50		20
		20		35,38		
		25	9	35,16		
	Į.	30		35,01		
		35		34,94		
1		40		34,86		
		50		34,80		
	1	0		34,74		v 50





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10		34,72		3 <u>20</u>
	1	20		34,68		1 0. 1 (1)
	1	30		34,64		
	1	40		34,60		100 100
	1	50		34,58		
	2	0		34,55		- 20 - 20
	i ie			5.		0
						0
	8					
		-				
	8	1				No.
						10
				9.		30
						100
	¥					1.0
	į.					
	is a					1 00 2 (1)
						0





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3 Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) :

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
10/02/22		0			30 m³/h	1 /- 1 /-
	3	0	30	36,68		
		1	0	37,37		
		1	30	40,62		
		2	0	41,30		
		2	30	42,28		
		3	0	43,42		8
		3	30	44,40		
		4	0	45,03		
		5		46,35		2
		6		47,60		7
7	6	7		48,82		
	-	8		50,13		18
		9		50,60		
		10		51,43		
		12		52,21		
		14		52,82		
		16		53,27		
		18		53,56		
i i		20		53,76		2
		25		54,12		
		30		54,46		10
		35		54,51		
		40		54,55		
		50		54,63		
	1	0		54,72		





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10		54,79		3 <u>20</u>
	1	20		54,86		1 0. 1 (1)
	1	30		54,91		
	1	40		54,97		100 100
	1	50		55,02		
	2	0		55,06		- 20 - 20
	i ie			5.		0
						0
	8					
		-				
	8	1				No.
						10
				9.		30
						100
	¥					1.0
	į.					
	is a					1 00 2 (1)
						0





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : Rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
0/02/22	7	0	1			
	į.	0	30	53,46		90
		1	0	51,30		
		1	30	50,20		
		2	0	48,43		
1	Î	2	30	47,00		337
	ij .	3	0	45,86		10
T T		3	30	45,16		3 0
	7	4	0	44,02		
	Ī	5		42,53		
		6		41,13		
		7		40,02		
i i		8		39,18		
		9		38,45		
		10		37,92		
		12		37,08		
	e e	14		36,51		9
Į.		16		36,13		
		18		35,85		20
		20		35,66		
		25		35,38		
	Į	30		35,19		
		35		35,10		
		40		35,02		200
		50		34,91		
	1	0		34,85		00





Client : IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Lieu : rue de Montmorency - 95 Taverny

Désignation de l'ouvrage : F3

Niveau statique initial (m/repère) : 34,36 m Niveau du repère (m/sol) : m/sol

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Stat.	Débit m³/h	Observations
10/02/22	1	10	8	34,81		91 17
	1	20		34,77		8 to 10 to 1
	1	30		34,74		
	1	40		34,71		100 100
	1	50		34,69		
	2	0		34,67		27/ 20
	d le			6 8 6 0		
	9					i de
		1				
	8	1				4 24
		_				
		 	 	4		
						10
						3
				9		20
	ý.					2
	Ů.					
						100 200
				c .		0





POMPAGE D'ESSAI LONGUE DUREE F3 - DESCENTE

Lieu : Client : Rue de Montmorency - 95 Taverny IDEX

BET Géothermie : GEOFLUID

Niveau Satique F3 : 34,19 m Repère F3 :

			Temps	de la companya de la		F3	Observations
Date	H/Départ	Heures	Minutes	Secondes	Niv.Dyn.	Débit	Index début
14/02/22	9h			30	35,33	20,508 m ³ /h	32379,5 m ³
			1		36,68		
			1	30	37,54		
			2		38,61		
			2	30	39,02		
			3		39,78		
			3	30	40,28		
			4		40,84		
			4	30	41,72	3	
			5		42,23		
			6		42,86		
		_	7		43,71		
			8		44,38		
			9		44,86		
			10		45,21		T = 13,5°
			12		45,87		
			14		46,12		
			16		46,54		
			18		46,77		
			20		46,94		
			30		47,32		
			35		47,41		
			40		47,45		
			50		47,52		
		1	0		47,58		
		1	10		47,63	1	
		1	20		48,01		
		1	30		48,07		
		1	40		48,12	1	
		2	0	-	48,18	1	
		2	20		48,22		
		2	40		48,27		
		3	- 3.0		48,30	1	
		3	20		48,33	 	
		3	40		48,35		
		4			48,35		
		4	30	 	48,37	1	
		5			48,40	+ + +	
		5	30		48,42		
		6	- 00		48,45		
		6	30	 	48,47	 	
		7	. 50	 	48,52	1	
		7	30		48,52	1	
		8	30	-	48,52		
	_	8	30	 		 	
			30		48,53		
		9	20		48,55		
			30		48,56		
	_	10 10	30	-	48,59 48,63		



POMPAGE D'ESSAI LONGUE DUREE F3 - DESCENTE

Lieu : Client :

Rue de Montmorency - 95 Taverny IDEX BET Géothermie : GEOFLUID

Niveau Satique F3 : 34,19 m Repère F3 :

		1	Temps			F3	Observations
Date	H/Départ	Heures	Minutes	Secondes	Niv.Dyn.	Débit	77-714,-114,00-11
14/02/22	20h	11			48,64		
		11	30		48,65		
		12			48,67		
		12	30		48,68		
		13			48,71		
	- 1	13	30		48,71		
		14			48,73		
		14	30		48,74		
15/02/22	00h	15			48,75		
		15	30		48,75		
	9	16			48,76	8 9	
- 3	- 3	16	30		48,76	8	
		17			48,76		
		17	30		48,75		
	1	18			48,75		
		18	30		48,77		
		19			48,78		
		19	30		48,79		
		20			48,79		
		20	30		48,80		
		21			48,79		
-		21	30	 	48,79	 	
		22			48,80	1	
-		22	30		48,81		
		23		 	48,81	· ·	
-	-	23	30	 	48,83	 	
- 2	9h	24	30	 	48,83	20,4 m ³ /h	32872,9 m ³
	311	24		-	40,03	20,4 111 /11	32072,3 111
		-		-			
		-		-	-	-	
- 8							
- 8	- 5			-			
-				-			
				-			
-	-			-		-	
			_	 		 	
-			\vdash	\vdash		 	
	-			 	-	1	
			 			1	
- 2				 	- 3		
-							
- 2							
				\vdash		 	
	-			\vdash			
				\vdash		 	
	,						





POMPAGE D'ESSAI LONGUE DUREE F3 - REMONTEE

Lieu : Client : Rue de Montmorency - 95 Taverny IDEX

BET Géothermie : GEOFLUID

Niveau Satique F3 : 34,19 m Repère F3 :

	-		Temps	1	F3	Observations
Date	H/Départ	Heures	Minutes	Secondes	244	
15/02/22	9h				Samuel II.	
			1		47,23	
9	į,		1	30	45,06	
			2		44,03	
8			2	30	43,22	
- 3			3		42,27	
-			3	30	41,82	1
*			4		41,77	1
			4	30	40,56	
			5	1 1	40,09	
			6		39,19	
			7		38,34	
			8		37,88	
			9		37,46	
8			10		37,10	
			12		36,54	
- 8		-	14	1	36,14	-
		_	16	 	35,86	_
	_		18	 	35,74	_
		-	20	+ +	35,59	_
			30	+	35,28	_
	-		35		35,19	_
- 1			40		35,17	_
	- 3		50		35,06	_
			0		35,02	
		1	10	-	34,96	_
			20		34,92	
-		1		-		
		1	30	-	34,87	
		1	40		34,84	
-		2	0		34,78	
- 1		2	20		34,74	
		2	40		34,70	
		3		-	34,67	
		3	20		34,66	
		3	40		34,62	
		4			34,60	
		4	30		34,59	
		5			34,58	
	-	5	30		34,57	
9	9	6			34,54	
		6	30		34,51	
		7			34,48	
		7	30		34,47	
		8			34,46	1
		9			34,44	
		10			34,42	
		11			34,42	
	21h	12			34,41	
3/02/22	8h30				34,26	



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



TITRE								
Analy	se d'eau							
N° PRÔJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND .	
832	SANF	DOE	GEO	DOC	TZ	054	Α	
FORMAT:	м	su	RF:		DATE: 15	mars 2022		







REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Prélevé le 15/02/22

(2022) 15439 - 832 Cde: DE21-2054

Devis: Reçu EVRY, le

15/02/22 Mme FREMEAUX

Demandeur:

EAU F1 TAVERNY ClientID:

Description: Nature: Commentaire:

SANFOR Rue Jean Cocteau

77340 Pontault Combault

FRANCE EVRY, le

RAPPORT D'ESSAI EV22-03957

Page 1 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

16 - mars - 22

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

TEMPERATURE DE L'ENCEINTE A RECEPTION (°C)

8:30

HEURE DE PRELEVEMENT TEMPERATURE PRELEVEMENT (°C)

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
POTENTIEL HYDROGENE	pH NFEN ISO 10523 / T° méthode interne	15/02/2022				
pH A TEMPERATURE CI-DESSOUS(*)			7,2	Unité pH	±10 %	
TEMPERATURE A PRISE DU pH(*)			19,8	°C		
POTENTIEL REDOX	Patentiometrie	16/02/2022				
POTENTIEL REDOX			481,1	MV/EHM		
CONDUCTIVITE à 25°C(Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température)	NF EN 27888	15/02/2022	002	. Clean		
CONDUCTIVITE à 25°C (Correction par compens	ation de température)(*)		903	μ5/cm °C	±2 %	
TEMPERATURE DE MESURE			20,5	-0		
ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE	NFT 90-011	22/02/2022				
CO2 LIBRE			36	mg/L		
OXYGENE DISSOUS	NF EN 25814	28/02/2022				
OXYGENE DISSOUS(*)			98,00	% Saturation		
OXYGENE DISSOUS(*)			11,00	mg/L		
TEMPERATURE			12,0	∘c		
MATIERES EN SUSPENSION	NF EN 872 - Filtre Whatman	16/02/2022				
MATTERES EN SUSPENSION(*)			<1	mg/L	±47 %	
DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE	ISO 15705 (Tubes Fermés) 15 Nov 2002	16/02/2022				
DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE(*)			<10	mg/L	±42 %	
DEMANDE BIOLOGIQUE EN OXYGENE 5 JOURS	NF EN ISO 5815-1 avec ATU	22/02/2022				
NOMBRE DE REPLICATS			1			
DEMANDE BIOLOGIQUE EN OXYGENE 5 JOURS(*)		<3	mg/L	±28 %	
échantilion congelé avant analyse période d'incubation alternative DBO 1+5						
NOMBRE DE DILUTIONS			1			
CHROMATOGRAPHIE IONIQUE (analyse réalisée sur échantilion filtré)	NF EN ISO 10304	16/02/2022				
BROMURES(*)			<0,5	mg/L	±17 %	
Nécessité d'une dilution en raison de la na	ture de la matrice. LQ augmentée.					

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 2/Sein Quineut? (see Jean Memor Councturones 91031 Env Codes -1-33 (9)1 59 36 72 72 - www.science.b. SGS France rrue Aristide Brand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 850 - N° TVA Intracomen



RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 2 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
CHLORURES	NF ISO 15923-1	17/02/2022				
OHLORURES(*)			9	mg/L	±28 %	
CHROME HEXAVALENT (analyse réalisée sur échantilon filtré) OHROME HEXAVALENT(*)	MLE-MO-LAB 088	17/02/2022	<5	μ g/ L	±26 %	
FLUORURES	NF T 90 004	16/02/2022				
		10.72.22	0,7	mg/L	. 24 8/	
FLUORURES(*)	Taurines accordists	-	0,7	mgre	±21 %	
AMMONIUM (analyse réalisée sur échantillon filtré)	NF ISO 15923-1	17/02/2022				
AMMONIUM(*)			0,14	mg/L	±32 %	
AMMONIUM (mgN/I)(*)			0,11	mg/L		
NITRITES (analyse réalisée sur échantillon filtré)	NF ISO 15923-1	17/02/2022				
NITRITES(*)			0,01	mg/L	±11 %	
NTTRATES (analyse réalisée sur échantillon fitré)	NF ISO 15923-1	17/02/2022				
NET ATTICLE N			<0,5	mg/L	±12 %	
NITRATES(*) AZOTE KJELDAHL	NF EN 25663	40,000,000	20,5		£12 76	
	NF EN 23003	18/02/2022				
AZOTE KJELDAHL(*)			<0,5	mg/L	±16 %	
AZOTE GLOBAL (NTK + NO3 + NO2)	Selon normes Afnor de chaque paramètre	28/02/2022				
AZQTE GLOBAL (NTK + NO3 + NO2)			<1,0	mg/L		
ORTHOPHOSPHATES (analyse réalisée sur	NF ISO 15923-1	17/02/2022				
échantillon filtré) ORTHOPHOSPHATES(*)			<0,02	mg/L	±20 %	
SULFATE (analyse réalisée sur échantillon filtré)	NF ISO 15923-1	17/02/2022				
SULFATE(*)			163	mg/L	±23 %	
TITRE ALCALIMETRIQUE	NF EN ISO 9963-1: 01 Feb 96	16/02/2022				
TITRE ALCALIMETRIQUE(*)			<1	np.	±4 %	
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET	MF EN ISO 9963-1	16/02/2022	0.00		44.70	
The real and a real an	14 1130 3303 1	16/02/2022				
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET(*)			34	oF.	±23 %	
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET en Ca(HCO3)2(548,1	mg/L	±23 %	
CARBONATES	NF EN ISO 9963-1	16/02/2022				
CARBONATES(*)			0,0	mg/L,	±4 %	
HYDROGENOCARBONATES	NF EN ISO 9963-1	16/02/2022				
HYDROGENOCARBONATES(*)			413	mg/L	±4 %	
TITRE HYDROTIMETRIQUE(analyse réalisée sur échantillon filtré)	Par calcul Ca (MO075 LA2007) + Mg (MO076 LA2007)	17/02/2022				
TITRE HYDROTIMETRIQUE	22007		51	оp	±20 %	
METAUX SOLUBLES A PH 2		15/02/2022				
METAUX SOLUBLES A pH=2			2			
METAUX PAR ICP	NF ISO 11885	23/02/2022				
		2310212022	40.47			
SODIUM(*)			10,17	mg/L	±16 %	
POTASSIUM(*)			3,44	mg/L	±28 %	
CALCIUM(*)			143,00	mg/L	±9 %	
MAGNESIUM(*)			33,24	mg/L	±13 %	
FER(*)			198,60	µg/L	±15 %	
CUIVRE(*)			<0,005	mg/L	±22 %	

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 2) Sent Quinnut? no Jean Memor Courceuronee 91031 Evry Cides - 1-33 (8) 15-35 it 272 - xeex 120-120-6 E

Membre 4b groupe 955

Siege social - 29 Avenue Anside Briand 94111 ARCUEL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 70102 - BIREN 552 031 650 - N° TVA intrasormani-vizate FR 81 502 031 650



RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 3 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
METALIX PAR ICP	NF ISO 11885	23/02/2022				
ZINC(*)			0,02	mg/L	±16 %	
MANGANESE(*)			<10,00	μg/L	±12 %	
ALUMINIUM(*)			<10,00	µg/L	±23 %	
STRONTIUM(*)			9327,00	µg/L	±12 %	
SILICIUM(*)			12,88	mg/L	±12 %	
SILICE(*)			27,50	mg/L	±13 %	
BARYUM(*)			<0,10	mg/L	±25 %	
BORE(*)			0,05	mg/L	±17 %	
SOMME DES METAUX ANALYSES			212346,87	µg/L		
NICKEL(*)			<5,00	µg/L	±36 %	
CHROME(*)			<5,00	µg/L	±10 %	
CADMIUM(*)			<1,00	PB/L	±25 %	
PHOSPHORE(*)			<0,01	mg/L	±35 %	
PLOMB(*)			<5,00	µg/L	±16 %	
COBALT(*)			<50,00	µg/L	±15 %	
METAUX PAR ICP-MS	NF 6N ISO 17294-2	25/02/2022				
BERYLLIUM PAR ICP-MS(*)			<0,10	µg/L	±23 %	
FILTRATION PREALABLE A L'ANALYSE DES METAUX DISSOUS REALISEE AU LABORATOIRE		16/02/2022				
Filtration préalable à l'analyse des metaux			•			
METAUX DISSOUS	NF ISO 11885	23/02/2022				
FER(*)			<10,00	µg/L	±15 %	
MANGANESE(*)			<10,00	µg/L	±12 %	
CUIVRE(*)			<0,01	mg/L	±22 %	
ZINC(*)			0,02	mg/L	±16 %	
ARSENIC(*)			<10,00	µg/L	±23 %	
CHROME(*)			<5,00	µg/∟	±10 %	
MERCURE	NF EN ISO 17852	18/02/2022				
MERCURE(*)			<0,20	µg/L	±31 %	
COMPOSES VOLATILS - HS/GC/MS	méthode interne par GC/MS -MLE-MO-LAB 028	15/02/2022				
BENZENE(*)			<1,00	µg/L	±24 %	
TOLUENE(*)			<1,00	µg/L	±25 %	
ETHYLBSNZENE(*)			<1,00	µg/L	±25 %	
M+P-XYLENE(*)			<1,00	µg/L	±22 %	
O_XYLENE(*)			<1,00	µg/L	±21 %	
SOMME DES XYLENES			<2,0	µg/L		
1,1-DIOHLORETHANE(*)			<1,0	µg/L	±19 %	
1,1-DICHLOROETHYLENE(*)			<1,0	µg/L	±17 %	
1,2-DICHLORETHANE(*)			<1,0	μg/L	±20 %	
DICHLOROMETHANE(*)			<5,0	µg/L	±45 %	
1,1,1-TRIOHLORETHANE(*)			<0,5	μg/L	±19 %	
1,1,2-TRIOHLORETHANE(*)			<1,0	µg/L	±22 %	
TETRACHLORURE DE CARBONE(*)			<0,5	µg/L	±19 %	
CHLOROFORME (THM)(*)			<1,0	µg/L	±18 %	
			-1-	(4)		

SGS France

Environmental and industrial Hygiene Testing (I&E) - 2 Sart-Gaves/R7 os Jeen Marrior Courcoronic 91031 Eary Colex -1-33 (81 89 57 27 2 - peut septiced V Member dis groupe 605

34ge social 29 Autorium Arientide Briand 94111 ARCUEL CEDEX - 8 A.S. au capital din 3 172 d13 6 - APE 72102 - SINEN 552 031 850 - N° TVA Intercommunication - FR 31 552 031 850



RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 4 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
COMPOSES VOLATILS - HS/GC/MS	méthode interne par GC/MS -MLE-MO-LAB 028	15/02/2022		0.000	1.00001=	
CIS 1,2-DICHLORETHYLENE(*)			<1,0	µg/L	±16 %	
TRANS 1,2-DICHLORETHYLENE(*)			<1,0	µg/L	±21 %	
CHLORURE DE VINYLE(*)			<0,50	µg/L	±33 %	
BROMÓCHLOROMETHANE(*)			<1,0	µg/L	±27 %	
BROMOFORME (THM)(*)			<1,0	µg/L	±25 %	
1,2-DIBROMOETHANE(*)			<1,0	µg/L	±24 %	
1,2-DICHLOROBENZENE(*)			<1,0	µg/L	±21 %	
1,2-DICHLOROPROPANE(*)			<1,0	µg/L	±26 %	
1,2,3-TRICHLOROBENZENE(*)			<1,0	μg/L	±22 %	
1,2,3-TRICHLOROPROPANE(*)			<1,0	µg/L		
1,2,3-TRIMETHYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±20 %	
1,2,4-TRICHLOROBENZENE(*)			<1,0	µg/L	±25 %	
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±26 %	
1,3-DICHLOROBENZENE(*)			<1,0	µg/L	±21 %	
1,3-DICHLOROPROPANE(*)			<1,0	µg/L	±21 %	
1,3,5-TRICHLOROBENZENE(*)			<1,0	µg/L	±27 %	
1,3,5-TRIMETHYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±24 %	
1,4-DICHLOROBENZENE(*)			<1,0	µg/L	±21 %	
CHLOROBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±22 %	
CIS1,3-DICHLOROPROPYLENE(*)			<1,0	µg/L	±26 %	
DIBROMOMONOCHLOROMETHANE (THM)(*)			<1,0	µg/L	±23 %	
FREON 113(*)			<1,0	µg/L	±32 %	
HEXACHLORÓBUTADIENE(*)			<0,5	µg/L	±31 %	
HEXACHLOROETHANE(*)			<0,5	µg/L	±36 %	
ISOPROPYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±18 %	
MONOBROMODICHLOROMETHANE (THM)(*)			<1,0	µg/L	±26 %	
N_BUTYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L		
PROPYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±26 %	
SEC_BUTYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±33 %	
STYRENE(*)			<1,00	HD/L	±25 %	
TER_BUTYLBENZENE(*)			<1,00	µg/L		
TRANS1,3-DICHLOROPROPYLENE(*)			<1,0	μg/L	±26 %	
TRICHLORETHYLENE(*)			<0,5	μg/L	±21 %	
SOMME DES 4 THM			<4,0	μg/L		
ndice Hydrocarbures Volatils	HEADSPACE/GC/FID Méthode Interne MLE-MO-LAB-021					
DEBUT DU PROCESSUS D'ANALYSE	THE THO DO DE		15/02/2022			
INDICE HYDROCARBURES VOLATILS(*)			<30	µg/L		
NDICE HYDROCARBURE (C10-C40)	NF EN ISO 9377-2	16/02/2022				
INDICE HYDROCARBURE(*)			<0,05	mg/L	±21 %	
YDROCARBURES TOTAUX C6-C40 OBTENU AR CALCUL	RESULTAT OBTENU PAR CALCUL	03/03/2022				
C6-C40 obtenu par calcul			<75	µg/L		
EMI-VOLATILS DIVERS PAR GC/MS/MS	meth interne MLE MO LAB 061 -ext. L/L-GC/MS/MS					
Début du processus d'analyse			15/02/2022			
ANTHRACENE(*)			<0,005	µg/L	±42 %	
BENZO_A_PYRENE(*)			<0,005	µg/L	±38 %	

Environmental and industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sahi Guanaut 7 ne Jaet Nemoc Courcurpose 91031 Eary Cedex -1 -13 (II) 163-98 72 72 - xxxx 1200118 25 Member 4 a groupe 965 Siting social 29 Avenus Aristota Brand 91111 ARCUEL CEDEX - 5 A S. au capital de 3 172 913 6 - APE TOTICZ - SIREN 952 031 650 - N° TVA Intracommunication FR 91 552 031 650



RAPPORT D'ESSAL

EV22-03957

Page 5 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
EMI-VOLATILS DIVERS PAR GC/MS/MS	meth interne MLE MO LAB 061 -ext. L/L-GC/MS/MS	15/02/2022				
BENZO_B_FLUCRANTHENE(*)	4 L OCI PLANTS		<0,005	µg/L	±38 %	
BENZO_GHI_PERYLENE(*)			<0,005	JJGJ/L	±32 %	
BENZO_K_FLUORANTHENE(*)			<0,005	µg/L	±32 %	
FLUORANTHENE(*)			<0,005	µg/L	±41 %	
INDENO_123CD_PYRENE(*)			<0,005	µg/L	±43 %	
NAPHTALENE(*)			<0,05	µg/L	±39 %	
TOTAL 4 HAP			<0,02	µg/L		
	GHI_PERYLENE;BENZO_K_FLUORANTHENE					
;INDENO_123CO_PYRENE TOTAL 6HAP			<0,03	µg/L		
BENZO_A_PYRENE;BENZO_B_FLUO;BENZO_K_FLUORANTHENE;FLUORA				1.3500.61		
PCB_18(*)			<0,01	µg/L	±42 %	
PCB_31(*)			<0,01	µg/L	±42 %	
PCB_28(*)			<0,005	µg/L	±42 %	
PCB_20(*)			<0,01	µg/L	±45 %	
PCB_52(*)			<0,005	µg/L	±39 %	
PC3_44(*)			<0,01	µg/L	±40 %	
PCB_101(*)			<0,005	µg/L	±44 %	
PCB_149(*)			<0,01	µg/L	±45 %	
PCB_118(*)			<0,005	µg/L	±38 %	
PCB_153(*)			<0,005	µg/L	±41 %	
PCB_105(*)			<0,01	µg/L	±42 %	
PCB_138(*)			<0,005	µg/L	±41 %	
PCB_180(*)			<0,005	µg/L	±39 %	
PCB_170(*)			<0,01	µg/L	±44 %	
PCB_194(*)			<0,01	µg/∟		
TOTAL 7POB(*)			<5	µg/L		
PCB_101 ;PCB_118 ;PCB_138 ;PCB_15	53 ;PCB_180 ;PCB_28 ;PCB_52					
PCB:			-			
HAP:			\$ 100 man			
PENTACHLOROBENZENE(*)			<0,005	μg/ L	±48 %	
ALACHLORE(*)			<0,02	µg/∟	±34 %	
ALDRINE(*)			<0,01	µg/∟		
ATRAZINE(*)			<0,03	hav-	±36 %	
BIPHEVYL(*)			<0,05	hg/r	±42 %	
CHLORFENVINPHOS(*)			<0,03	ha\r	±45 %	
OHLORPYRIPHOS ETHYL(*)			<0,01	µg/∟	±40 %	
DEHP(*)			<0,20	µg∕∟	±42 %	
DIELDRINE(*)			<0,01	hā/r	±37 %	
ENDRINE(*)			<0,01	hā/r	±43 %	
HEXACHLOROBENZENE(*)			<0,005	µ g/ ∟	±40 %	
ISODRINE(*)			<0,01	µg/∟	±43 %	
ENDOSULFAN A(*)			<0,005	μg/ L	±43 %	
ENDOSULFAN B(*)			<0,005	µg/L	±45 %	
HOH (somme des isomères Alpha, Béta, Delta e	et Gamma)		<0,02	µg/L		
HOH ALPHA(*)			<0,01	µg/L	±39 %	
HCH BETA(*)			<0,01	µg/L	±35 %	

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 2l Sent Council 7 var Jen Mannez Courourones 91031 Evy Cedex -1-33 (0) 19 99 72 72 - vere sporzouf.

Membre de groupe 508
Siligas social 29 Avenue Ariside Briand 94111 ARCUEL CEDEX - 5 A 8 av copital de 3 172 613 € - APE 70 NZ - SIREN 502 031 650 -N° TVA Intracorronnut dere - FR 91 550 031 650



RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 6 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

Control of the Contro		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
SEMI-VOLATILS DIVERS PAR GC/MS/MS	meth Interne MLE MO LAB 061 -ext. L/L-GC/MS/MS	15/02/2022				
HCH DBLTA(*)	QEOQNS/PS		<0,01	µg/L	±38 %	
HCH GAMMA (LINDANE)(*)			<0,02	µg/L	±35 %	
OXADIAZON(*)			<0,02	µg/L	±41 %	
SIMAZINE(*)			<0,03	μg/L	±44 %	
TRIFLURALINE(*)			<0,01	µg/L	±45 %	
24DDT(*)			<0,005	μg/L		
44DDT(*)			<0,005	µg/L		
ALKYLPHENOLS	L/L- GC/MS/MS- Méthode interne MLE-MO-LAB-074					
Date d'analyse			23/02/2022			
4-N-OCTYLPHENOL (sandre 1920)(*)			<0,05	μg/L	±47 %	
4-TER-OCTYLPHENOL (sandre 1959)(*)			<0,05	µg/L	±49 %	
OCTYLPHENOLS (sandre 6600 / somme des sa	indre 1920 et1959)		<0,1	µg/L	±68 %	
OP1GE(*)			<0,1	μg/L	±47 %	
OP2OE(*)			<0,1	µg/L	±49 %	
OHLOROBENZENES	méthode interne par GC/MS -MLE-MO-LAB 028					
Début du processus d'analyse			15/02/2022			
1,3,5-TRICHLOROBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±11 %	
1,2,4-TRICHLOROBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±13 %	
1,2,3-TRICHLOROBENZENE(*)			<1,00	µg/L	±28 %	
DOSAGE DES ORGANOETAINS	méthode interne par GC/MS -MLE-MO-LAB 038	24/02/2022				
TRIBUTYL ETAIN CATION(*)			<0,020	µg/L	±30 %	
FERRO-BACTERIES	sous traitance externe	07/03/2022				
FERRO-BACTERIES			**	germe/500 mL		
Bactéries ferrugineuses : 2 200 UFC/mil	au 5ème jour			IIIL		
Bactéries ferrugineuses en densité de po	opulation élevée.					
Il convient de mettre en place un traitem	ent de désinfection bactéricide ou bactériostatique afin de li					
SULFATO BACTERIES	Méthode interne - KIT LABEGE	15/02/2022				
SULFATO BACTERIES			5	germe/1 ml.		
BACTERIES SULFITÓ-REDUCTRICES +	NF EN 26461-2	15/02/2022				
SPORES		13/02/2022				
BACTERIES SULFITO-REDUCTRICES + SPORES	5(*)		0	germe/100 mL		
SULFURES AISÉMENT LIBÉRABLES	DIN 38405-27	16/02/2022		14574		
SULFURES AISÉMENT LIBÉRABLES (H*)			<0,03	mg/L	±42 %	
CARBONE ORGANIQUE TOTAL (COT)	EN 1484		10,03		142 70	
CARBONE ON CHALLOS TO THE (COT)	CM 1404	16/02/2022				
CARBONE ORGANIQUE TOTAL (H*)			1,3	mg/L	±26 %	
INDICE PHÉNOL - CFA	EN ISO 14402	16/02/2022				
INDICE PHÉNOL (H*)			<0,01	mg/L	±18 %	
ORGANOHALOGÈNES ADSORBABLES (AOX)	EN 150 9562	16/02/2022				
AOX (H*)			<0,01	mg/L	±20 %	
TURBIDITÉ	DIN EN ISO 7027	16/02/2022				
TURBIDITÉ TURBIDITÉ (H*)	DIN EN 15O 7027	16/02/2022	1,1	NTU		

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses \$1031 Env Celex -1-33 (N) 99-30 72.72 - environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courdourses (IAE) - 21 Sant Culevuit7 no Jast Memor Courd



RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 7 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

		_				
		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD)	EN 1484	16/02/2022				
COD (H*)			0,9	mg/L	±26 %	
ORGANOHALOGÊNES ADSORBABLES (AOX) AVEC PRÉ-VALEURS COD	EN ISO 9562	16/02/2022				
AOX SELON EN 9562 (H*)			<0,02	mg/L		
Composés polyfluorées (PFC) dans l'eau	DIN 38407-42	17/02/2022				
Acide Perfluorooctanesulfonique (H*)			<0,01	µg/L	±15 %	
PESTICIDES APRES EXTRACTION DE LA PHASE SOLIDE PAR LV GCMS/LC MSMS	SPE-LV-LC-GCMSMS	17/02/2022	<0,01	μg/L		
DICOFOL (H*)			<0,005	µg/L		
DICHLORVOS (H*)				pg/L		
TERBUTRYNE (H*)			<0,005			
METAZACHLORE (H*)			<0,002	µg/L		
NCCOSULFURON (H*)			<0,005	µg/∟		
DIFLUFENICAN (H*)			<0,005	µg/L		
IMIDACLÓPRID (H*)			<0,005	ha/r		
BOSCALID (H*)			<0,005	µg/L		
CHLORPROPHAM (H*)			<0,01	µg/L		
Pesticides après extraction par LC/MS/MS	LC-MSMS (SOP M1230)	17/02/2022				
2,4-D (H*)			<0,05	µg/L	±15 %	
Chlortoluron (H*)			<0,05	µg/L	±15 %	
Diuron (H*)			<0,05	µg/L	±15 %	
Isoproturon (H*)			<0,05	µg/L	±15 %	
Linuron (H*)			<0,05	μg/L	±15 %	
MCPA (H*)			<0,05	µg/L	±15 %	
PESTICIDES - HPLC	DIN 38407-22	17/02/2022	19			
AMPA (H*)			< 0.05	µg/L		
			<0.05	μg/L		
GLYPHOSATE (H*) ODURES (**)	DVN 3040F 33		<0,03	P31-		
OLORES ()	DIN 38405-33	23/02/2022				
IODURES (**) (H)			0,007	mg/L		
PHENOLS ET CHLOROPHENOLS en SOUSTRAITANCE EXTERNE PENTACHLOROPHENOL (Cofrac 1-0130)	Par GC/MS selon NF EN ISO 12673	07/03/2022	<0,1	μg/L		
PBDE EN SOUS TRAITANCE EXTERNE à	CMO MT02 IGC-ECD (soustraitance			No.		
/alence	accréditation COFRAC nº 1-0852)					
DEBUT DU PROCESSUS D'ANALYSE			18/02/2022			
BDE 47 (2,2',4,4' -Tétrabromodiphénylether)			<0,02	µg/L		
BDE 99 (2,2',4,4',5 -Pentabromodiphénylether)			<0,02	µg/L		
BDE 100 (2,2',4,4',6-pentabromodiphénylether)			<0,02	µg/L		
BDE 153 (2,2',4,4',5,5' - hexabromodiphenylether)			<0,02	μg/L		
BDE 154 (2,2',4,4',5,5' - hexabromodiphénylether)			<0,02	μg/L		
BDE 183 (2,2',3,4,4',5',6 - heptabromodiphénylethe	r) (hors accrédiation)		<0,02	µg/L		
BDE 209 (2,2',3,3',4,4',5,5',6,6' - decabromodiphém			<0,05	µg/L		
DHLOROALCANES en ST externe à Valence COFRAC 1-0852)	CMO_MTO2 lig/liq GC-ECD		State Control Control Control			
début du processus d'analyse			18/02/2022	-002		
CHLOROALCANES C10/C13			<5,0	µg/L	±35 %	
HBCDD en soustraltance externé	HPLC MS NEG (soustt. externe à Valence)					

SGS France

Environmental and industrial Hygiene Testing (I8E) - 2/ Seat Custoeal? The Joen Nemes Courseptione 91031 Evry Cester -1 -3/ (9)1 69 36 72 72 - www.scastles.fr

Membre dis groupe 905

Steps social 29 Avenue Asside Stand 94111 ARCUEL CEDEX - 5 A S au capital de 3172 613 (- APE 70102 - SIREN 592031 650 -N° TVA Introomerunateire FR 81 552031 650





RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 8 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
HBCDD en Soustraitance externe	HPLC MS NEG (soustt, externe à Valence)					
Début du processus d'analyse			18/02/2022			
Alpha Hexabromocyclododecane (Alpha-HBCDD	0)		<0,05	µg/L		
Běta Hexabromocyclododecane (Běta-HBCDD)			<0,05	µg/L		
Gamma Hexabromocyclododecane (Gamma-HB)	000)		<0,05	µg/L		
Hexabromocyclododecane par calcul (somme al;	pha/beta/gama)		<0,05	µg/L		
SEMI-VOLATILS DIVERS PAR GC/MS/MS (ST Externe néalisée à Valence)	CMO_MT02 GC M5 (soustraitance accréditation COFRAC nº 1-0852)					
début du processus d'analyse	TORNARDUR EXCENTEN		18/02/2022			
ACLONIFEN			<0,05	µg/L		
BIFENOX (hors accréditation)			<0,25	µg/L		
CYBUTHRINE (hors accréditation)			<0,025	µg/L		
CYPERMETHRINE			<0,1	µg/L		
HEPTACHLORE EXO EPÓXYDE			<0,1	µg/L		
QUIINOXYFEN (hors accréditation)			<0,1	µg/L		
SOUS TRAITANCE EXTERNE SOUS ACCREDITATION COFRAC 1-0852	CMO_MT08					
début du processus d'analyse			18/02/2022			
AMINOTRIAZOLE	*		<0,1	µg/L		
SEMI-VOLATILS-Dosage par HPLC positive	CMO_MT02 (soustraitance accréditation COFRAC nº 1-0852)					
début du processus d'analyse			18/02/2022			
METALDEHYDE (hors accrédiation)			<0,1			

CECILE GUILLEMOT CHARGÉE D AFFAIRES (signature électronique)







RAPPORT D'ESSAI

EV22-03957

Page 9 sur 9

Ref. labo : EV22-03957.001

U Incertitude élargie (K=2)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du faboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.ff). Les paramètres suivis d'un "P" sont couverts par l'accréditation relative aux prélèvements. L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(H*): Essai sous-traité à SGS Frésénius à Herten - NF EN/CEI 17025 équivaience COFRAC - DAkkS n° D-PL- 14115-07-00

(H): Essai sous-traité à SGS Frésénius à Herten

En cas de valeur de MES > 250mg/l, les analyses de composés semi-volatils (HAP, PCB, pesticides, alkylphénols et organo-étains) réalisées sur échantillon brut ne seront pas couvertes par l'accréditation COFRAC.

Le présent rapport d'essai comporte 9 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis aux essais et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur www.sqs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-français).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflétent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis -à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contravenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélévement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France

GEOFLUID

Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



	TITRE								
	Diagr	aphie – C	BL						
	N' PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZÓME	NUMERO DE DOC	IND	
	832	SANF	DOE	GEO	DOC	TZ	250	Α	
1	FORMAT:	м	sı	RF:		DATE: 1	mars 2022	-	





6, Rue jean MACE 03190 vallon en sully TEL: 04 70 09 33 56

Agence.vallon@soleo-logging.fr www.soleo-logging.fr Date d'émission : 13/01/2022

Identification:

R_SANFOR220103c

Rapport tiré en 1 exemplaire+PDF

Diagraphies RAPPORT DE MESURES

Forage: GTA1

TAVERNY (93)

Intervention du 03 01 2022

Document(s) associé(s):

- Documents inclus au dossier

Nom et visa Rédacteur :

CHALMET Philippe

Nom et visa Vérificateur:

COUSIN Loic

Page 1 / 13



SOMMAIRE

1.	1. OBJECTIF DE L'OPERATION	3
	1.1. CBL	4
2.	2. DOCUMENTS	5
	- CBL	5
3.	3. MOYENS MIS EN OEUVRE	7
4.	4. PRINCIPE DES MESURES	8
	4.1. CBL	8
5.	5. ANNEXES	11
	FIGHE TECHNIQUE CRI	11

Page 2 / 13



1. Objectif de l'opération

SOLEO est intervenue à la demande de la société SANFOR pour réaliser un contrôle de cimentation dans le forage GTA1 à TAVERNY (95).



Référence profondeur au niveau du tubage.

Page 3 / 13



La mesure CBL est basée sur la résonance mécanique du tubage sous l'effet d'une excitation acoustique. Ceci sous-entend que pour fonctionner correctement, le tubage doit avoir ses propriérés physiques intégres et qu'un tubage aftéré (fissuré, dégradé, trop concrétionné, ...) peut ne pas répondre correctement à cette mesure. 1.1. CBL 22Y0TA1WesterCBL CAS(RX1) 1.5 4.78 8.20 11.61 15.02 18.43 21.85 25.26 32.09 35.50 38.91 42.32 La signature du tubage est visible mais peu énergétique et la vibration n'est pas entretenue. Le tubage est bien cimenté. 45.74 49.15 52.56 55.98 59.39 62.80 Sortie du tubage. 66.21 Sur le graphique, nous avons défini trois zones pour la courbe ICIM(%) (indice de cimentation) en pourcentage. De 0 à 25% la cimentation est qualifiée de très bonne à bonne De 25 à 75% la cimentation est qualifiée de moyenne De 25 à 100% la cimentation est qualifiée de mauvaise

> SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON - SIRET 453222507 00023 - S.A.R.L. au capital de 400K€



Page 4 / 13


2. DOCUMENTS

- CBL

Page 5 / 13





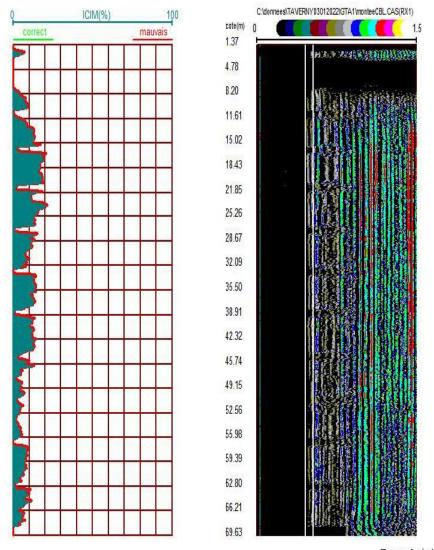

Page 6 / 13

SOLEO mesures et développements

R.C.S. MONTLUCON - SIRET 453222507 00023 - S.A.R.L. au capital de 400K€



3. Moyens mis en oeuvre

Pour cette opération, une unité portable a été utilisée.

Elle est équipée :

- d'un treuil de 500 m
- d'un équipement électronique de surface
- · de sonde de diagraphie
- · d'une régie surface
- · d'un équipement informatique



Page 7 / 13



4. Principe des mesures


4.1. CBL

Cette mesure se fait avec un outil acoustique composé d'un émetteur et d'un ou deux récepteurs. On envoie une onde ultrasonore qui se transmet dans les différents milieux traversés par la sonde avant d'être captée par le récepteur situé à un mètre de l'émetteur. Ce signal est ensuite digitalisé puis remonté par la télémétrie en surface et stocké sur le PC. Afin de réaliser une mesure correcte, le forage doit être rempli d'un fluide (eau, saumure, boue), l'outil doit impérativement être centré dans le tubage et le ciment doit avoir durci.

L'indice de cimentation est bien sûr tiré d'une analyse faite sur le signal reçu, en effet la présence ou non de ciment adhérent modifie considérablement le trajet de cette onde comme le montre les figures cidessous.

Dans le cas d'une sonde à deux récepteurs, le pointé delta-t des deux premières arrivée permet de vérifier que l'on travaille bien sur l'arrivée acier.


Fig 1 : Très mauvaise cimentation, le tubage est libre et résonne. L'onde acoustique ne passe que par le tubage, le signal est très fort et le temps d'arrivée est court.



Page 8 / 13



Fig 2: Bonne et très bonne cimentation, le tubage est même totalement invisible. L'onde acoustique passe à travers le tubage et transite par le terrain. Les temps d'arrivée sont beaucoup plus longs.




En pratique, pour qualifier la cimentation, on calcule l'énergie de l'onde reçue dans une fenêtre de temps centrée sur l'arrivée première correspondant à l'onde acoustique réfractée par le tubage. On en déduit une courbe de non cimentation ; plus cette énergie est grande moins le couplage forage/terrain est bon, ce qui met en évidence un manque de ciment ou une mauvaise adhérence du ciment avec le tubage ou avec le terrain.


Cette méthode reste valable pour des vitesses terrain plus lentes que la vitesse du tubage. Dans le cas contraire, on retrouve l'arrivée terrain dans la fenêtre de temps utilisée pour le calcul de l'indice de cimentation; ce qui interdit cette méthode de qualification. On procède alors par corrélation, c'est-à-dire, que l'on compare la signature du tubage libre au signal enregistré. Cette approche permet de qualifier la cimentation même si l'onde terrain vient se superposer à l'arrivée tubage.

Page 9 / 13



Fig 3 : Très bonne cimentation, le tubage est presque invisible. Mais le terrain étant très rapide, il interfère sur la fenêtre de calcul d'énergie.





Page 10 / 13



5. ANNEXES

• Fiche technique CBL


Page 11 / 13





FICHE TECHNIQUE DES OUTILS DE DIAGRAPHIE

SONIC Delta T - CBL

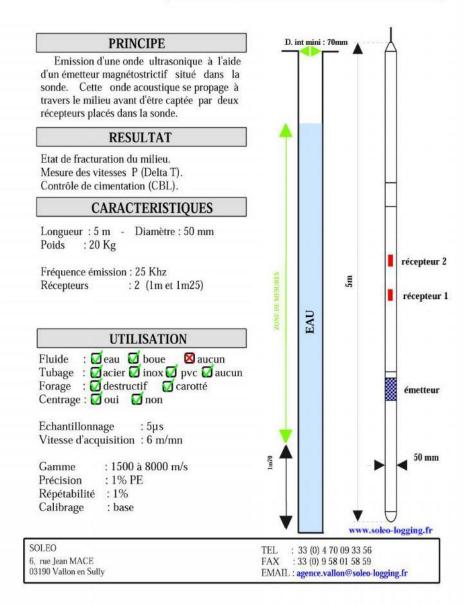

Page 12 / 13






FICHE TECHNIQUE DES OUTILS DE DIAGRAPHIE


SONIC - Delta T

EXEMPLE DE DOCUMENT

pointé des ondes PS et stoneley

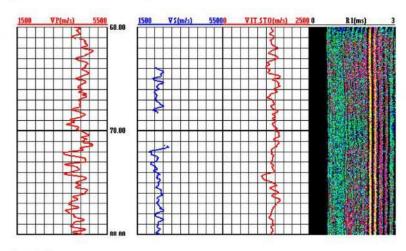

cimentation



6, rue Jean MACE 03190 Vallon en Sully TEL : 33 (0) 4 70 09 33 56 FAX : 33 (0) 9 58 01 58 59 EMAIL: agence.vallon@soleo-logging.fr

Page 13 / 13



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



TITRE								
Micro	mouline	t						
N' PRÔJET	EMETTEUR	PHASE	LÓT	TYPE	ZÓNE	NUMERO DE DOC	IND	
832	SANF	DOE	GEO	DOC	TZ	251	Α	
FORMAT:	м	sı	JRF:		DATE: 1	5 mars 2022		





6, Rue jean MACE 03190 vallon en sully TEL: 04 70 09 33 56

Agence.vallon@soleo-logging.fr www.soleo-logging.fr Date d'émission : 24/01/2022

			es .		
10	en	ti	tic	atio	n:

R_SANFOR220120c

Rapport tiré en 1 exemplaire+PDF

DIAGRAPHIE RAPPORT DE MESURES

Forage: F1 85, Rue de Montmorency TAVERNY (95)

Intervention du 20/01/2022

Document(s) associé(s):

- Documents inclus au dossier

Nom et visa Rédacteur :

CHALMET Philippe

Nom et visa Vérificateur:

COUSIN Loïc

Page 1 / 15



SOMMAIRE

SOMM	AIRE	2
1. 0	BJECTIF DE L'OPERATION	3
2. M	IICROMOULINET	4
3. D	OCUMENTS	5
	MICROMOULINET	5
4. P	RINCIPE DES MESURES	7
4.1.	MICROMOULINET	7
5. C	OMPARAISON MICROMOULINET STATIQUE ET DYNAMIQUE	8
5.1.	REPONSE D'UN OUTIL MICROMOULINET	8
5.2.	DIFFERENCE ENTRE UNE MESURE EN STATIQUE ET EN DYNAMIQUE	
5.3.	EQUATION D'UN MICROMOULINET SOLEO	11
5.4.	COURBE DE REPONSE DE L'OUTIL MICROMOULINET	11
5.5.	RESOLUTION EN DEBIT	12
6. A	NNEXES	13
	FIGURE TECUNIOUS MICROMOLIUNET	12

Page 2 / 15



1. Objectif de l'opération

SOLEO est intervenue à la demande de la société SANFOR pour réaliser une diagraphie micromoulinet, sur le forage F1 à TAVERNY (95).



La référence profondeur a été prise au niveau du tube Acier DN400.

Page 3 / 15



2. MICROMOULINET Sur le graphique ci-dessous, les zones productives sont représentées en vert. les zones improductives sont représentées en bleu. Interprésentées en bleu. MICROMOULINET STATIQUE La mesure micromoulinet ne montre pas de circulation en statique. MICROMOULINET DYNAMIQUE Pour la mesure, SANFOR a installé une pompe de 4" vers 63 m, elle débtait environ 14.00 m3/h. Le niveau dynamique était vers 55 m à la fin de la mesure. La mesure micromoulinet montre que le forage donne de l'eau sur un intervalle allant de 70.50 m à 72.00 m. De 70.50 m à 72.00 m: 100% de la production. La mesure micromoulinet a été réalisée sans centreur suite à des difficultés de passage. La cage du micromoulinet est donc sournise aux phénomènes de balancement et vient heutre l'intérieur du tube au court de la descente ce qui perturbe la mesure. La zone de production reste quant à elle bien marquée.

SOLBO meaures et développements R.C.S. MONTLUCON- SIRBT 459222507 00023- S.A.R.L. su capital de 400K€

GEOFLUID

Page 4 / 15

- 3. DOCUMENTS
 - Micromoulinet

Page 5 / 15






CLIENT: SAITE OR
REPRESENTANT CLIENT: G SANCIER

OPERATEUR(S): MG

site : TAVERNY20012022
puits : F1TAVERNY

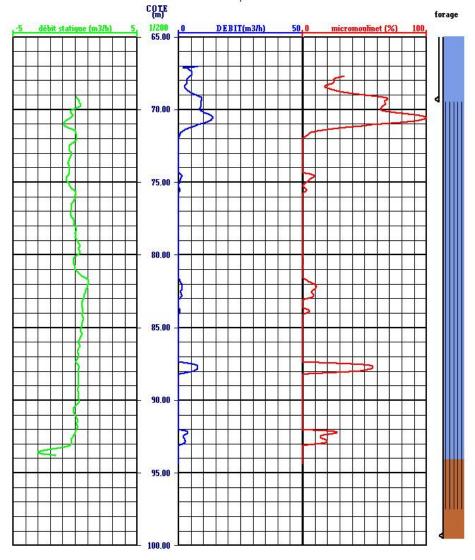

rageo/15



4. Principe des mesures

4.1. Micromoulinet

La mesure micromoulinet se fait en pompage. La pompe, placée idéalement au dessus de l'outil dans la zone non crépinée, met le fluide en mouvement permettant ainsi de mettre en évidence les différentes arrivées d'eau.


L'outil est équipé d'une hélice dont on mesure la vitesse de rotation.

La vitesse maximum enregistrée, correspondant au débit de la pompe, est obtenue juste sous celle-ci et résulte de l'addition des débits des différentes arrivées d'eau rencontrées dans le forage.

La vitesse de l'hélice diminue proportionnellement à chaque passage d'une arrivée d'eau pour devenir nulle au fond du forage.

Les résultats sont donnés sous forme d'une courbe relative (en %) et d'une courbe mettant en évidence les zones de productions.

Cette courbe est simplement une représentation de la vitesse de rotation de l'hélice, compensée de la vitesse de déplacement de l'outil. Cette courbe est issue d'un traitement effectué sur la vitesse de rotation de l'hélice. Elle permet de mettre en évidence les zones de production.

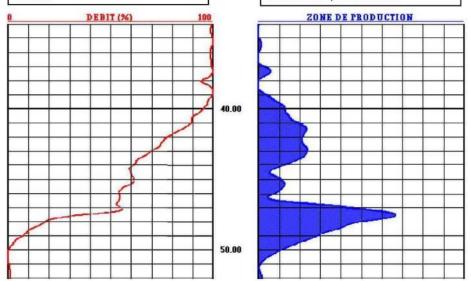

Page 7 / 15

SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON- SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



5. Comparaison micromoulinet statique et dynamique


5.1. Réponse d'un outil micromoulinet

Typiquement, la courbe de réponse d'un outil micromoulinet est de type Y=aX+b

Où Y est le résultat (vitesse en m.mn)
a est une constante liée à la résolution de l'outil
X est la valeur de mesure de l'outil (impulsion par seconde)
b est la vitesse de déclenchement. (Vitesse en m/mn)

Par la suite nous prendrons une vitesse de déclenchement de 2m/mn qui est une valeur courante.

Cette équation se traduit par la courbe ci dessous

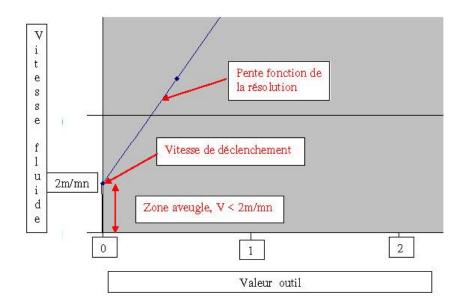

Page 8 / 15 SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON- SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



5.2. Différence entre une mesure en statique et en dynamique

Mesure en statique: l'outil est descendu à une cote, puis on fait une mesure l'outil étant immobile. L'hélice ne voit que la vitesse du flux. Si la vitesse du flux est inférieure à 2m/mn, l'hélice ne tourne pas. Et donc nous n'avons pas de mesure.

Mesure en dynamique: La mesure est faite outil en mouvement, on enregistre la valeur de l'outil et la vitesse de déplacement. L'hélice voit alors la vitesse de flux plus la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement étant supérieure à la vitesse de déclenchement, il n'y a plus de zone aveugle.

La principale différence entre les mesures en statique et les mesures en dynamique vient du fait qu'en dynamique on travaille toujours au dessus de la vitesse de déclenchement donc il n'y a pas de zone aveugle sur les vitesses inférieures à la vitesse de déclenchement.

On peut également ajouter qu'en dynamique on a un résultat de mesure spatial centimétrique (tous les 5 cm par exemple) ce qui permet d'avoir une courbe beaucoup plus riche et facile à interpréter.

V Zone de travaille en i dynamique, t uniquement dans la e partie linéaire de la 8 courbe S e Zone de mesure en statique, elle inclue f la zone aveugle de 1 l'outil u d Valeur mesure outil


ZONE DE TRAVAIL

Cette différence se traduit sur une mesure réelle comme ceci.

Page 9 / 15 SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON- SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



Cette mesure a été faite dans un forage de 80 mm intérieur sous un pompage de 1.45 m3/h

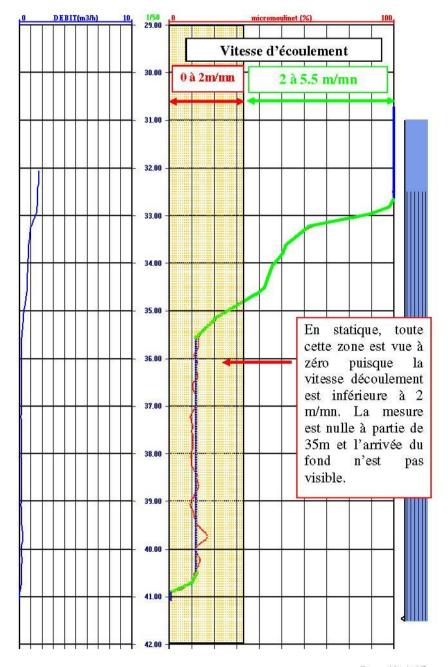

Page 10 / 15




5.3. Equation d'un micromoulinet SOLEO

L'équation du micromoulinet est : V(m/mn)=8.963X+2.092

C'est un ordre de grandeur, car cette équation est variable selon les réglages des paliers de l'hélice du micromoulinet (résistance aux frottements...), type d'hélice.

Le coefficient 8.963 est lié à la résolution de l'outil La constante 2.092 est la vitesse de déclenchement.

5.4. Courbe de réponse de l'outil micromoulinet



L'outil à une résolution 1/50 ème de tour, donc la résolution de x est de 0.02, ce qui correspond à une résolution de V (m/mn) de 0.18m/mn.

Page 11 / 15 SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON- SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K $\!\!\!\!$



5.5.Résolution en débit

La résolution en débit est bien sûr fonction du diamètre.

54
54
106
217
433
618
763
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

Cette résolution est bien sûr théorique.

Là dessus viennent se greffer les erreurs dues

- A la compensation de la vitesse de descente
- Au fait que l'outil fait un petit mouvement de balancier durant la descente ce qui bruite la courbe.
- Aux turbulences dues à la circulation du fluide ...

Page 12 / 15



	100					
^		N I	R I	_	\/	FS
6	Δ	N	N	-	x	

• fiche technique micromoulinet


Page 13 / 15





FICHE TECHNIQUE DES OUTILS DE DIAGRAPHIE

MICROMOULINET

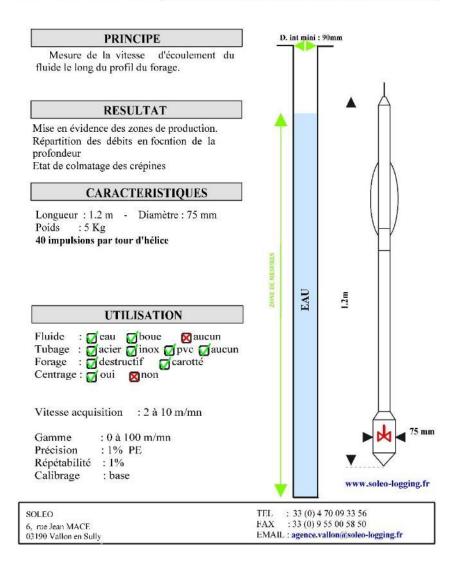






FICHE TECHNIQUE DES OUTILS DE DIAGRAPHIE

MICROMOULINET

EXEMPLE DE DOCUMENT

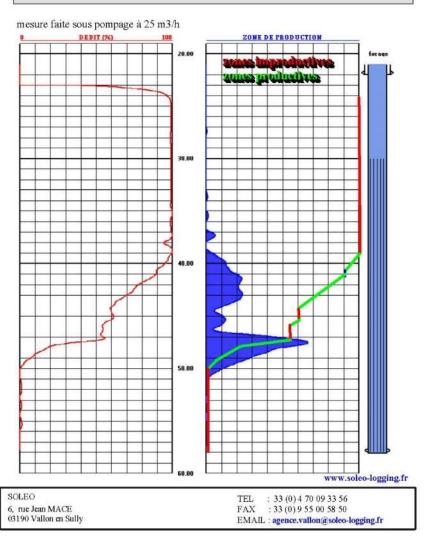



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



Inspe	ction car	méra – (Contrôl	e vertica	alité –	Gamma :	ray	
N' PRÔJET	EMETTEUR	PWSE	LOT	TYPE	20NE	NUMERO DE DOC	INO	
832	SANF	DOE	GEO	DOC	TZ	252	Α	
FORMAT:	м	su	RF:	•	DATE: 2	5 janvier 2022		





6, Rue jean MACE 03190 vallon en sully

TEL: 04 70 09 33 56 Agence.vallon@soleo-logging.fr

www.soleo-logging.fr

Date d'émission : 18/02/2022

R_SANFOR220217c

Rapport tiré en 1 exemplaire+PDF

DIAGRAPHIE RAPPORT DE MESURES

Forage: GTA1

TAVERNY (95)

Intervention du 17 02 2022

Document(s) associé(s):

- Document inclus au dossier

Nom et visa Rédacteur : CHALMET Philippe Nom et visa Vérificateur:

COUSIN Loic

Page 1 / 24



SOMMAIRE

SON	MMAIRE	2
1.	OBJECTIF DE L'OPERATION	3
2.	INSPECTION VIDEO	4
3.	DIAGRAPHIES	14
4.	DOCUMENTS	15
:	VIDEO TRANSMISE PAR TRANSFERT	15
5.	MOYENS MIS EN ŒUVRE	17
6.	ANNEXES	18
:	FICHE TECHNIQUE CAM140	18
•	FIGHE TECHNIQUE VERTICALITE	

Page 2 / 24



1. Objectif de l'opération

SOLEO est intervenue à la demande de SANFOR pour réaliser une inspection vidéo de réception et des diagraphies gamma ray et verticalité sur le forage GTA1 à Taverny (95).



La référence profondeur a été prise au niveau de la bride.

Page 3 / 24



2. Inspection vidéo

Le forage est équipé en tête de tubes en acier de 408 mm de diamètre.





Joint de tubage.

Joint de tubage.





Joint de tubage.

Page 4 / 24 SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



Joint de tubage avec dépôts blanchâtres.





Vue axiale du tubage acier en surplomb d'un joint de tubage.

Vue du niveau statique atteint à 34.50 m.

L'eau est trouble et la vision s'en trouve altérée.





Joint de tubage.

Page 5 / 24





Page 6 / 24 SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



Vue axiale au niveau du télescopage.





Vue axiale du tubage inox.

Vue des premières crépines. Elles sont de type fil enroulé.





Vue radiale des crépines et du massif filtrant bien en place.

Page 7 / 24



Vue des crépines propres dans ce secteur.





Vue radiale des crépines et du massif filtrant.

Vue des crépines.






Vue des crépines et du massif filtrant.

Page 8 / 24



Assemblage de tubes crépinés.





Vue axiale des crépines.

Vue des crépines.





Vue radiale des crépines et du massif filtrant.

Page 9 / 24



Vue des crépines.





Vue d'un assemblage de tubes crépinés.

Vue des crépines.





Vue axiale des crépines.

Page 10 / 24



Vue radiale des crépines. Le massif filtrant est bien en place derrière les crépines.



0086.55M

Vue axiale des crépines.

Joint de tubage.





Vue axiale de l'assemblage.

Page 11 / 24




Vue radiale des crépines. Des dépôts grisâtres sont observés sur le fil enroulé.





Vue axiale des crépines.








Vue radiale des crépines. Des fines grisâtres se sont déposées sur le fil enroulé.

Page 12 / 24



Vue axiale des crépines.





Vue radiale des dernières crépines.

Vue en surplomb de la tête du tube décanteur atteint à 98.03 m.






Le fond est atteint vers 99 m, il est comblé de dépôts fins.

Page 13 / 24 SOLEO mesures et développements R.C.S. MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



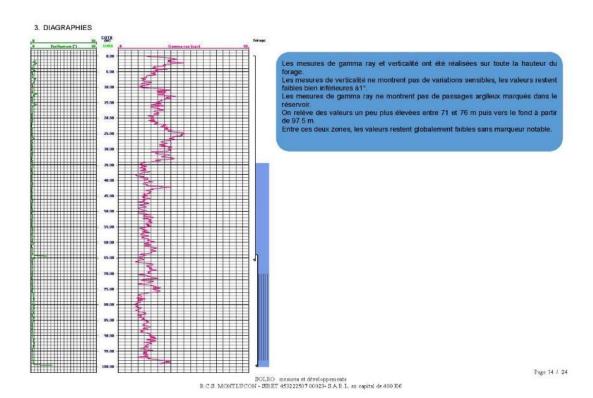




4. DOCUMENTS

- Vidéo transmise par transfert
- Diagraphies

Page 15 / 24

SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de $400 \mathrm{K} \varepsilon$



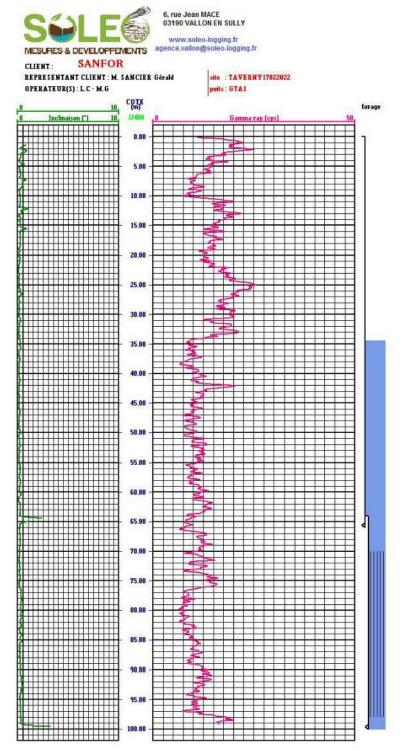

Page 16 / 24 SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



5. MOYENS MIS EN ŒUVRE

Pour cette opération, une unité légère a été utilisée.

Elle est équipée :

- d'un treuil de 250 m
- d'un équipement électronique de surface
- d'une caméra couleur à tête rotative





Page 17 / 24

SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



6. ANNEXES

- fiche technique CAM140
- fiche technique Gamma ray
- fiche technique Verticalité

Page 18 / 24

SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de $400 \mathrm{K} \varepsilon$





CAMERA CAM140

D. int mini: 150mm

PRINCIPE

La caméra de forage a visée orientable est un outil qui permet de faire des inspections vidéo dans des forages de grands diamètres permettant ainsi de faire un diagnostic immédiat sur l'état de l'ouvrage.

RESULTAT

Visualisation de l'ouvrage avec enregistrement de la profondeur sur DVD. Prise de photo à la demande.

CARACTERISTIQUES

longueur: 90 cm - Diamètre: 140 mm

Poids : 10 Kg Focale : variable

rotation :360 sans butée - inclinaison : +90 -90

Angle de vue : 60° Eclairage: interne

UTILISATION

Fluide : Jeau Boue Jaucun
Tubage : Jacier Jinox Jpvc Jaucun
Forage : Jdestructif Jcarotté
Centrage : Joui Jnon

Vitesse d'acquisition : variable image : DVD (720x576)

ONGUEUR EAU www.soleo-logging.fr

: 33 (0) 4 70 09 33 56 : 33 (0) 9 55 00 58 50 FAX 6, rue Jean MACE EMAIL: agence.vallon@soleo-logging.fr 03190 Vallon en Sully

Page 19 / 24


SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€





CAMERA CAM140

EXEMPLE DE DOCUMENT

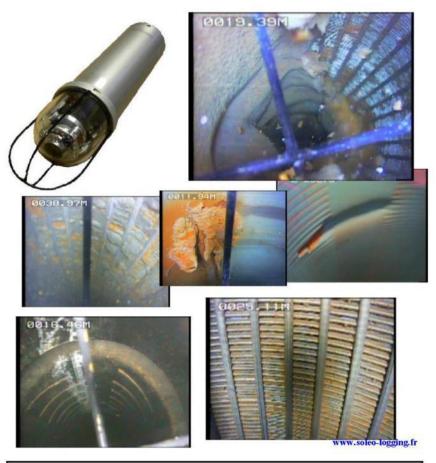

SOLEO 6, rue Jean MACE 03190 Vallon en Sully TEL : 33 (0) 4 70 09 33 56 FAX : 33 (0) 9 55 00 58 50 EMAIL: agence.vallon@soleo-logging.fr


Page 20 / 24

SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€





GAMMA NATUREL

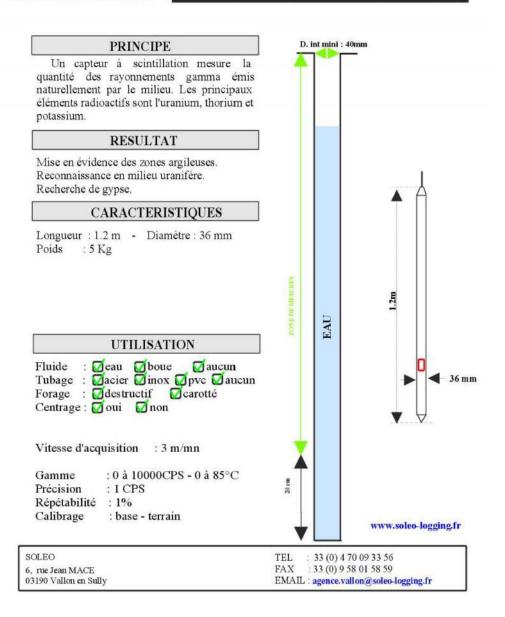


Page 21 / 24 SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€





GAMMA NATUREL

EXEMPLE DE DOCUMENT

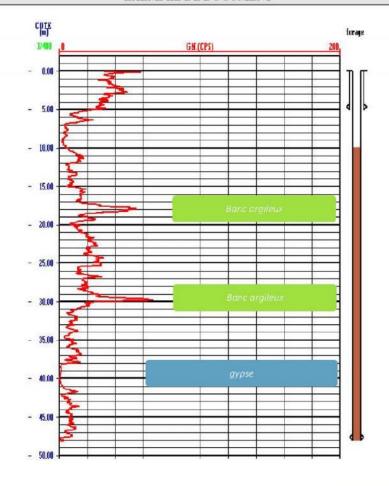

www.soleo-logging.fr

SOLEO	TEL : 33 (0) 4 70 09 33 56
6, rue Jean MACE 03190 Vallon en Sully	FAX : 33 (0) 9 58 01 28 59
03190 Vallon en Sully	EMAIL : agence.vallon@soleo-logging.fr


Page 22 / 24

SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€





VERTICALITE

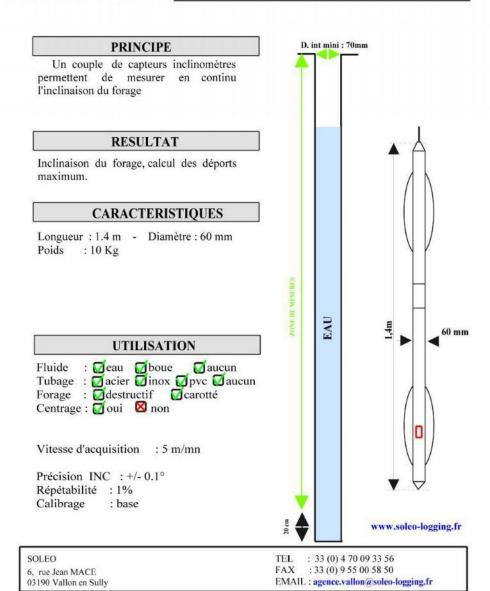


Page 23 / 24 SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€





VERTICALITE

EXEMPLE DE DOCUMENT

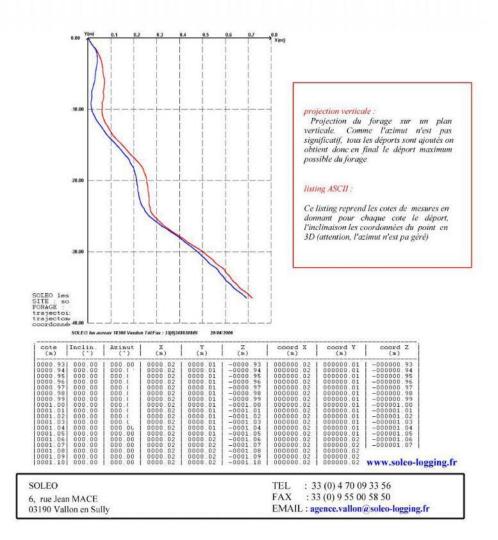

Page 24 / 24

SOLEO mesures et développements R.C.S, MONTLUCON - SIRET 453222507 00023- S.A.R.L. au capital de 400K€



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



TITRE								
Analy	rse granı	ılométr	ique					
N° PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND .	
832	SANF	DOE	GEO	DOC	TZ	058	Α	
FORMAT:	M	81	JRF:		DATE: 15	mars 2022		, de





DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX Méthode par étuyage

		NF P 94-05
Informations générales	Informations sur l'échantillon	76 7 57 55
Dossier n°: 15444-832 - ING22005	Mode de prélèvement : ST	Sondage n°: 1
Chantier: TAVERNY (95)	Date de prélèvement : -	Profondeur: -
	Mode de conservation : Echan.1	Date d'essai : 13/01/2022
	Numéro d'identification : 22IL0032	Dmax visuel: 5 (mm)
Ouvrage : -	Date de réception : 13/01/2022	
Client: SANFOR	Description : Sable fin vasard of	arisâtre.
Onent : Oran on	Description : Oable IIII vasara g	gridatio
Teneur en eau		
	W = 143.67 %	
flode de séchage des matériaux ;	✓ Etuvage à 105 °C ☐ Etuvage à 8	50 °C
oue de sechage des materiaux .	Eluvage a 100 C Eluvage a .	50 C
Observations		
able fin vasard grisâtre saturé (teneur e	en eau élevée >100%\	
able IIII vasaru grisatie sature (terieur t	511 644 616466 - 10070)	
		Technisis of the Unit
		Technicien chargé de l'essai BADER Michel
		DADER WIGHE
erprétation des résultats :		
ttention est attirée sur le fait que les résultats men	tionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus	Responsable du laboratoire
ec l'échantillon défini ci avant, et que la portée et le		NDIAYE Mapaté
7	en application du texte de référence fixé par le demandeur	
Font l'objet d'un document séparé référencé.		
N'ont pas été demandées.		
INGELARO	Teneur en eau	Dags 4 / 4
INGELABO	reneul en eau	Page 1 / 1






Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériaux rocheux par l'essai à la tâche

formations générales Dossier n°: 15444-832 - ING22005 Chantier: TAVERNY (95)		sur l'échantillon		
Chantier: TAVERNY (95)	Mode	de prélèvement	: ST	Sondage n°: 1
	Date	de prélèvement	: -	Profondeur:
	Mode	de conservation	: Echan.1	Date d'essai: 13/01/2022
	Numéro	d'identification	: 22IL0032	Dmax visuel: 5 (mm)
Ouvrage: -	D	ate de réception	: 13/01/2022	
Client: SANFOR		Description	: Sable fin vasar	d grisâtre
formations sur l'essai				
Masse humide soumise à l'essai :	m _{h2} =	+	g	
Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:	w =	-	%	
Masse sèche soumise à l'essai :	m ₀ =	30.9	g	
Volume de solution de bleu injecté :	V =	40.4	cm³	
Masse de bleu injectée :	B =	0.404	g	
Proportion de la fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm du sol sec :	C=	99.9	%	
dans la maction o somm da sor sec.				
1700				
VBS =	1.31	g de bleu pour 1	00 g de sol se	с
ode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 bservations	☑ Etuva	ge à 105 °C	00 g de sol se	
ode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 oservations	☑ Etuva	ge à 105 °C		
ode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 oservations	☑ Etuva	ge à 105 °C		
ode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 oservations	☑ Etuva	ge à 105 °C		à 50 °C
ode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 oservations able fin vasard grisâtre saturé (teneur e	☑ Etuva	ge à 105 °C		à 50 °C Technicien chargé de l'essai
VBS = lode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 bservations able fin vasard grisâtre saturé (teneur e	☑ Etuva	ge à 105°C	☐ Etuvage	à 50 °C Technicien chargé de l'essai
ode de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 bservations able fin vasard grisâtre saturé (teneur e	☑ Etuva n eau élevée	ge à 105°C >>100%)	☐ Etuvage	à 50 °C Technicien chargé de l'essai
code de séchage des matériaux : eneur en eau suivant NF P 94-050 eservations able fin vasard grisâtre saturé (teneur e	☑ Etuva n eau élevéc ionnés par le pré s conclusions à t	ge à 105°C >>100%) sent rapport d'essais on irer de ces résultats :	☐ Etuvage :	à 50 °C Technicien chargé de l'essai BADER Michel





Détermination de la valeur au bleu de méthylène selon la NF P94-068 ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC selon la NF EN ISO 17892-4 Après lavage et Sédimentation

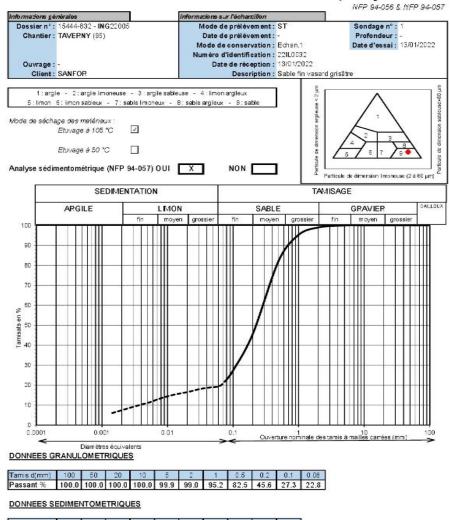

Tamis d(μm) Passant %	62.6	44.7	31.9	20.5	14.7	10.5	7.8	5.5	3.2	1.4
Passant %	19.6	18.8	18.1	16.6	15.7	14.6	13.2	11.5	9.5	5.8

W _{nat O/Dmax}	W _{nat 0/5 mm}	VBS 0/Dmax	VBS 0/5mm	Granulométrie		7	Classe GTR NF	
%	%	(gbleu/100grei)	(gbleu/100g×x)	D _{max} (mm)	<2mm (%)	<80µm(%)	Ip	P11-300
143.67	143.75	1.31	1.31	5.00	99.04	22.78		B5

Observations Sable fin vasard grisâtre saturé (teneur en eau élevée >100%) Technicien chargé de l'essai L'attention est attirée sur le l'ait que les résultats mentionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus BADER Michel L'attention et attrée our le fait que les resides mentionnés par le présent repont d'essas out été citienus avec l'échartition défini d'avent étique le pontée et les combusions à tier de ces résulais .

Sont indipuées par le présent repport dessaise en application outente de référence fixé par le demandeur .

Font l'objet d'un décourant séparé référencé .

Nont pas été demandées. Responsable du laboratoire NDIAYE Mepaté





DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX Méthode par étuyage

		wethode par etuvag
tudo musello no setudunto o	informations sur l'échantillon	NF P 94-05
Informations générales Dossier n°: 15444-832 - ING22005	Mode de prélèvement : ST	Sondage n°: 2
Chantier : TAVERNY (95)	Date de prélèvement : -	Profondeur : -
Channel : Internation	Mode de conservation : Echan.2	Date d'essai : 13/01/2022
	Numéro d'identification : 22IL0033	Dmax visuel : 5 (mm)
Outroms :	A TANAN AND THE CONTROL OF THE CONTR	biliax visuel . 5 (ilili)
Ouvrage: - Client: SANFOR	Date de réception : 13/01/2022	uria ŝtra
CHEIL: SANFOR	Description : Sable fin vasard g	lisatie
Teneur en eau		
	W = 139.69 %	
	W = 155.55 /6	
lode de séchage des matériaux :	✓ Etuvage à 105 °C ☐ Etuvage à 5	50 °C
Observations		
able fin vasard grisâtre saturé (teneur	en eau élevée >100%\	
able IIII vasaru giisaire sature (terreur i	an eau elevee > 10070)	
		Technicien chargé de l'essai
		BADER Michel
		DADEN MIGHGI
erprétation des résultats :		
AND THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY OF THE PR	tionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus	Responsable du laboratoire
ttention est attirée sur le fait que les résultats men ec l'échantillon défini ci avant, et que la portée et l		NDIAYE Mapaté
		NDIA I E Mapate
	en application du texte de référence fixé par le demandeur	
Font l'objet d'un document séparé référencé.		
/ N'ont pas été demandées.		
INGELABO	Teneur en eau	Page 1 / 1





Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériaux rocheux par l'essai à la tâche


NE P 94-068

Informations générales	Informations	sur l'échantillon		7 NF P 94-068
Dossier n° : 15444-832 - ING22005	PORT OF THE PROPERTY OF	e de prélèvement	ST	Sondage n°: 2
Chantier: TAVERNY (95)		e de prélèvement		Profondeur:
		de conservation		Date d'essai : 13/01/2022
		o d'identification		Dmax visuel: 5 (mm)
Ouvrage : -		Date de réception		- Book and the control of the contro
Client: SANFOR				asard grisâtre
Olicite, OAN OR		Description	. Cable IIII ve	asara grisario
Informations sur l'essai				
Masse humide soumise à l'essai :	$m_{h2}=$	-	g	
Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:	w =	-	%	
Masse sèche soumise à l'essai :	$m_0 =$	35.0	g	
Volume de solution de bleu injecté :	V =	51.7	cm ³	
Masse de bleu injectée :	B =	0.517	g	
Donoration de la frantism Officia				
Proportion de la fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm du sol sec :	C =	97.6	%	
dans la naction obtainin de soi sec :				
Valeur de bleu du sol				
varear de bied da sor				
<u> </u>				
VBS =	1.44	g de bleu pour '	100 g de so	l sec
		90(1)		200
Mode de séchage des matériaux :	✓ Etuva	age à 105 °C	☐ Etuv	age à 50 °C
Teneur en eau suivant NF P 94-050		ago a roo		490 4 00 0
Observations				
Sable fin vasard grisâtre saturé (teneur e	n eau élevé	e >100%)		
				Technicien chargé de l'essai
				BADER Michel
Interprétations des résultats :				
L'attention est attirée sur le fait que les résultats ment	ionnés par le pr	ésent rapport d'essais or	nt été obtenus	
avec l'échantillon défini ci avant, et que la portée et le	s conclusions à	tirer de ces résultats :		Responsable du laboratoire
Sont indiquées par le présent rapport d'essais e			par le demandeu	
Font l'objet d'un document séparé référencé.				
Vont pas été demandées.				
INGELABO		Vbs		Page 1 / 1





Détermination de la valeur au bleu de méthylène selon la NF P94-068 ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC selon la NF EN ISO 17892-4 Après lavage et Sédimentation

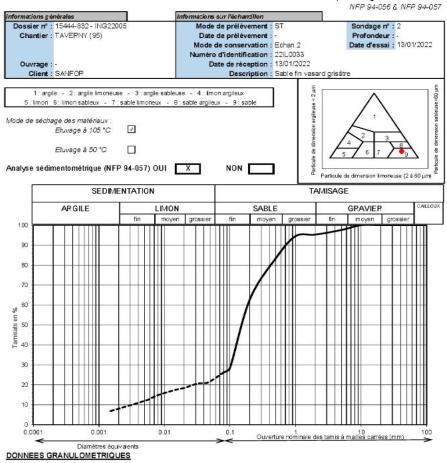

Tamis d(mm)	100	50	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08
Tamis d(mm) Passant %	100.0	100.0	100.0	100.0	97.6	95.3	94.5	83.5	62.7	28.6	26.3

DONNEES SEDIMENTOMETRIQUES

Tamis d(µm) Passant %	61.8	45.0	32.0	20.7	14.8	10.6	7.6	5.5	3.3	1.4
Passant %	23.8	21.1	20.7	18.6	17.5	16.2	14.6	12.4	10.1	6.5

W _{nat 0/Dmax}	W _{nat 0/5mm}	VBS 0/Dmax	VBS 0/5mm	Granulométrie			Ip	Classe GTR NF
%	%	(gble u/100grat)	(gbleu/100g៳i)	D _{max} (mm)	<2mm (%)	<80µm(%)	**	P11-300
139.69	143.10	1.44	1.48	5.00	95.29	26.26		B5

Observacions | Sable fin vasard grisâtre saturé (teneur en eau > 100%)

Interprétations des résultats :

L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus

Cattenborn est attirrée sur le lat que les resultats mentionines par le présent régions d'assais ciri été obtenus
avec l'écheritillon défini ci avant, et que le partée et les conclusions à tire de ces résultats ;

Sont insiquées par le présent rapport d'assais en application du teute de référence finé par le demandeur

Font fotjet d'un document séparé référencé.

Wont pas été demandées.

Technicien chargé de l'essai

Responsable du laboratoire NDIAYE Mapaté





DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX Méthode par étuvage

		Méthode par étuva NF P 94-0
Informations générales	Informations sur l'échantillon	70 F 34-0.
Dossier n°: 15444-832 - ING22008		Sondage n°: 3
Chantier: TAVERNY (95)	Date de prélèvement : -	Profondeur : -
	Mode de conservation : Echan.3	Date d'essai : 13/01/2022
	Numéro d'identification : 22IL0034	Dmax visuel: 5 (mm
Ouvrage : -	Date de réception : 13/01/2022	1200
Client : SANFOR	Description : Sable fin vasard	arisâtre
		3
Teneur en eau		
	W = 130.47 %	
de de séchage des matériaux :	✓ Etuvage à 105 °C ☐ Etuvage à	50 °C
de de sechage des materiaux .	Elavage a 100 C	30 0
Observations		
ble fin vasard grisâtre saturé (tene	ur en eau élevée >100%)	
		Technicien chargé de l'essai
		BADER Michel
erprétation des résultats :		Designation of the later of the
	mentionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus	Responsable du laboratoire
c l'échantillon défini ci avant. et que la portée		NDIAYE Mapaté
	ais en application du texte de référence fixé par le demandeur	
Font l'objet d'un document séparé référence	ė.	
N'ont pas été demandées.		
INGELABO	Teneur en eau	Page 1 / 1





Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériaux rocheux par l'essai à la tâche


NE P 94-068

Informations générales	Informations	s sur l'échantillon		NF P 94-068
Dossier n°: 15444-832 - ING22005	particular and the second second	e de prélèvement	ST	Sondage n°: 3
Chantier: TAVERNY (95)		e de prélèvement		Profondeur:
		de conservation		Date d'essai : 13/01/2022
		ro d'identification		Dmax visuel: 5 (mm)
Ouvrage : -		Date de réception		
Client: SANFOR				asard grisâtre
Oliche, OAN ON		Description	Cable III ve	asara grisarre
Informations sur l'essai				
Masse humide soumise à l'essai :	m _{h2} =	-	g	
Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:	w =	-	%	
Masse sèche soumise à l'essai :	$m_0 =$	30.5	g	
			1	
Volume de solution de bleu injecté :	V =	60.2	cm ³	
Masse de bleu injectée :	B =	0.602	g	
Daniel de la facilita				
Proportion de la fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm du sol sec :	C =	99.8	%	
dans la fraction o somme da sor sec .				
Valeur de bleu du sol				
Farcar de med da our				
VBS =	1.97	g de bleu pour 1	00 g de so	ol sec
L		20031	1000	
Mode de séchage des matériaux :	✓ Etuve	age à 105 °C	☐ Etuv	age à 50 °C
Teneur en eau suivant NF P 94-050			_	
Observations				
Sable fin vasard grisâtre saturé (teneur e	n eau élevé	e >100%)		
				Technicien chargé de l'essai
				BADER Michel
Interprétations des résultats :				
L'attention est attirée sur le fait que les résultats ment	ionnés par le pr	ésent rapport d'essais on	t été obtenus	
avec l'échantillon défini ci avant, et que la portée et le	s conclusions à	tirer de ces résultats :		Responsable du laboratoire
Sont indiquées par le présent rapport d'essais e	en application d	u texte de référence fixé ;	ar le demandeu	ır NDIAYE Mapaté
Font l'objet d'un document séparé référencé.				
✓ N'ont pas été demandées.				
		D00000000		
INGELABO		Vbs		Page 1 / 1





Détermination de la valeur au bleu de méthylène selon la NF P94-068 ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC selon la NF EN ISO 17892-4 Après lavage et Sédimentation

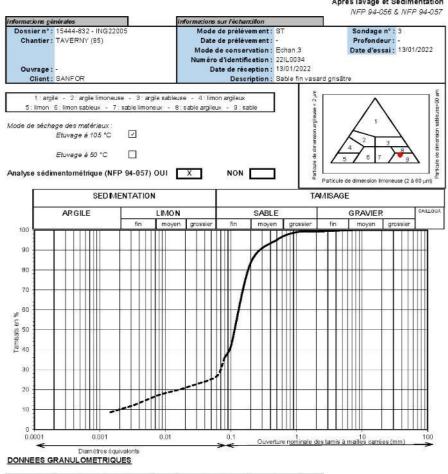

Passant % 100 0 100 0 100 0 10

DONNEES SI	EDIME	NTOME	TRIQU	IES						
Tamis d(μ m)	64.3	46.5	33.3	21.3	15.3	10.9	7.8	5.6	3.3	1,4
Tamis d(μm) Passant %	27.6	24.8	23.2	21.2	19.8	18.6	17.2	15.3	12.2	8.5

W _{nat 0/Dmax}		VBS 0/Dmax	VBS 0/5mm	G	iranulométr	ie	Ip	Classe GTR NF
%	%		(gbleu/100gma)	D _{max} (mm)	<2mm (%)	<80µm(%)	1	P11-300
130.47	130.75	1.97	1.97	5.00	99.21	36.03	(12)	A1

Observations	
Sable fin vasard grisåtre saturé (teneur en eau > 100%)	
Interprétations des résultats :	Technicien chargé de l'essai
L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport d'essais ont été obtanus	BADER Michel
avec l'échantillon défini ci avant, et que la portée et les conclusions à tirer de ces résultats :	
Sont indiquées par le présent rapport d'essais en application du texte de référence fixé par le demandeur	
Font l'objet d'un document séparé référencé.	Responsable du laboratoire
✓ Word pas été demandées.	NDIAYE Mapaté





DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX Méthode par étuvage

		Methode par etuva
Informations générales	Informations sur l'échantillon	NF P 94-0
Dossier n° : 15444-832 - ING22005	Mode de prélèvement : ST	Sondage n°: 4
Chantier : TAVERNY (95)	Date de prélèvement : -	Profondeur : -
	Mode de conservation : Echan.4	Date d'essai : 13/01/2022
	Numéro d'identification : 22 L0035	Dmax visuel : 5 (mm
Outrope :	Date de réception : 13/01/2022	Smax viouer . o (iiiii
Ouvrage: - Client: SANFOR	Description : Sable fin vasard g	rieâtro.
CHERT. SAM ON	Description . Gable IIII vasard g	naue
Teneur en eau		
	W = 131.35 %	
	101.00 /0	
ode de séchage des matériaux :	✓ Etuvage à 105 °C ☐ Etuvage à 5	50 °C
Okaanistiana		
Observations	an cou álouás >100%)	
ble fin vasard grisâtre saturé (teneur e	en eau elevee >100%)	
		Technicien chargé de l'essai
		BADER Michel
erprétation des résultats :		_
tention est attirée sur le fait que les résultats men	tionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus	Responsable du laboratoire
c l'échantillon défini ci avant, et que la portée et le	es conclusions à tirer de ces résultats :	NDIAYE Mapaté
Sont indiquées par le présent rapport d'essais	en application du texte de référence fixé par le demandeur	
Font l'objet d'un document séparé référencé.		
N'ont pas été demandées.		
1 14 out pas die demandees.		
INGELABO	Teneur en eau	Page 1 / 1





Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériaux rocheux par l'essai à la tâche


NE P 94-068

Informations générales	Informations	s sur l'échantillon		NF P 94-068
Dossier n°: 15444-832 - ING22005	particular and the second second	e de prélèvement	ST	Sondage n°: 4
Chantier: TAVERNY (95)		e de prélèvement		Profondeur:
		de conservation		Date d'essai : 13/01/2022
	Numéi	ro d'identification	: 22IL0035	Dmax visuel: 5 (mm)
Ouvrage : -		Date de réception	13/01/2022	and the second s
Client: SANFOR				asard grisâtre
Informations sur l'essai				
Masse humide soumise à l'essai :	$m_{h2}=$	-	g	
Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:	w =	-	%	
Masse sèche soumise à l'essai :	$m_0 =$	30.2	g	
			100	
Volume de solution de bleu injecté :	V =	44.2	cm ³	
Masse de bleu injectée :	B =	0.442	g	
Proportion de la fraction 0/5mm				
dans la fraction 0/50mm du sol sec :	C =	100	%	
VBS = Mode de séchage des matériaux : Teneur en eau suivant NF P 94-050 Observations	☑ Etuve	g de bleu pou r 1 age à 105°C		age à 50 °C
Sable fin vasard grisâtre saturé (teneur e	n eau élevé	e >100%)		
				Tbuilding about do House
				Technicien chargé de l'essai
				BADER Michel
Intermediations does of				
Interprétations des résultats :	lannéa cor lo	deant ranned describer	t átá abt	
L'attention est attirée sur le fait que les résultats ment			r ete obtenus	Responsable du laboratoire
avec l'échantillon défini ci avant, et que la portée et le Sont indiquées par le présent rapport d'essais e		oar le demandeur		
Font l'objet d'un document séparé référencé.	approximation of	as reference like	io acinanacai	Non L Mapate
N'ont pas été demandées.				





Détermination de la valeur au bleu de méthylène selon la NF P94-068 ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC selon is NF EN ISO 17892-4 Après lavage et Sédimentation

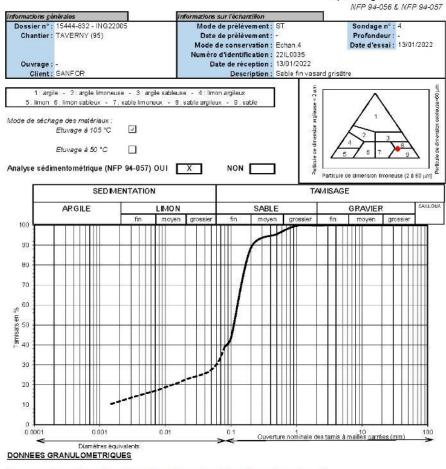

Tamis d(mm)	100	50	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08
Tamis d(mm) Passant %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.7	95.6	88.4	43.5	39.0

DONNEES SEDIMENTOMETRIQUES

Tamis d(µm)	63.6	46.5	33.3	21.3	15.3	10.9	7.8	5.6	3.3	1.4
Passant %	314	26.8	24.8	23.0	20.9	194	17.5	16.2	14 0	10 1

W _{net 0/Dmex}	W _{nat 0/5mm}	VBS 0/Omax	VBS 0/5mm	G	ranulométr	ie		Classe GTR NF
%	%		(gbleu/100gma)	D _{max} (mm)	<2mm (%)	<80µm(%)	Ip	P11-300
131.35	131.41	1.46	1.46	5.00	99.85	39.02	28	A1

Observations

Sable fin vasard grisātre saturē (teneur en eau > 100%)

Interprétations des résultats :

L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport d'essais ont été obtenus

Cattourion les attimes eux le latt que les resilentes mentionnes par le présent répont d'essais ont de ordenis

— sont indiquées par le présent répont d'essais en application du texte de référence filié par le demandeur

— Font l'objet d'un document séparé référencé.

— R'ont pas été domandées.

Technicien chargé de l'essai BADER Michel

Responsable du laboratoire NDIAYE Mepeté



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



	produit acier Ø 5	55/565	mm					
N' PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND	- 0
832	SANF	DOE	GEO	FP	TZ	300	Α	
FORMAT:	м	SU	IRF :		DATE: 1	5 mars 202	2	





Zac du Baconnet - Allée des Erables - 69700 MONTAGNY - FRANCE

Tél: 04 72 24 22 27 - Fax: 04 72 24 21 86 - Email: info@dpmf.fr

EQUIPEMENT EN ACIER

Provenance européenne (Italie)

TUBE PLEIN EN ACIER S235 JR

Diamètre extérieur : Ø565mm (+/- 5%) Diamètre intérieur : Ø555mm (+/- 5%)

Epaisseur 5mm (+/-5%)

Résistance à l'écrasement : 2.6 bars (36.4PSI)

Résistance à la traction : 280.4Tonnes

Avec + 2 trous de levages

Page 1 | 1



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



	produit acier Ø 3	394/406	mm					
N' PRÔJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND	- 12
832	SANF	DOE	GEO	FP	TZ	301	Α	
FORMAT:	A4	SL	IRF:		DATE: 1	5 mars 202	2	





Zac du Baconnet - Allée des Erables - 69700 MONTAGNY - FRANCE

Tél: 04 72 24 22 27 - Fax: 04 72 24 21 86 - Email: info@dpmf.fr

EQUIPEMENT EN ACIER

Provenance européenne (Italie)

TUBE PLEIN EN ACIER S235 JR

Diamètre extérieur : Ø406.4mm (+/- 5%) Diamètre intérieur : Ø394.4mm (+/- 5%)

Epaisseur 6mm (+/-5%)

Résistance à l'écrasement : 11.9 bars (169PSI)

Résistance à la traction : 240.6Tonnes Avec manchon + 2 trous de levages

Page 1 | 1



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverny



Maitre d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



Tube	produit plein ino ne fil enr				:/219mr	m – slot ().7mm	
Nº PROJET	SANF	DOF	GFO	FP	TZ	NUMERO DE DOC	A	
FORMAT:	A4	SU	Source and the second		13.450.0	502 15 mars 20	Seider	





Zac du Baconnet - Allée des Erables - 69700 MONTAGNY - FRANCE

Tél: 04 72 24 22 27 - Fax: 04 72 24 21 86 - Email: info@dpmf.fr

EQUIPEMENT EN INOX 304L

Provenance européenne (Italie)

Tube plein

Diamètre extérieur Ø219.1mm (+/-5%) Diamètre intérieur Ø209.1mm (+/-5%)

Ep 5mm

Résistance à l'écrasement : 43.9 Bar Résistance à la traction : 115.6Tonnes

Crépine à fil enroulé

Diamètre extérieur Ø219.1mm (+/-5%) Diamètre intérieur Ø196.5mm (+/-5%) Résistance à l'écrasement :21.1 Bar Résistance à la traction : 16.8 Tonnes

Fil 2.6x 4.8mm

39 Génératrices Ø4mm

Slot 0.7mm

Pourcentage de vide 21.7%

Débit 4.4L / S /M

Avec manchon + 2 trous de levages

Page 1 | 2





Zac du Baconnet - Allée des Erables - 69700 MONTAGNY - FRANCE

Tél: 04 72 24 22 27 - Fax: 04 72 24 21 86 - Email: info@dpmf.fr

EQUIPEMENT EN INOX 304L

Provenance européenne (Italie)

Tube plein

Diamètre extérieur Ø219.1mm (+/-5%)

Diamètre intérieur Ø211.1mm (+/-5%)

Ep 4mm

Résistance à l'écrasement : 21.1 Bar Résistance à la traction : 92.9Tonnes

+ Bouchon de fond ep4mm

Page 2 | 2



Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



	produit nt Fonda	cem – (CEM III/	C 32.5	N			
N' PROJET	EMETTEUR	PHASE	LØT	TYPE	ZONE	NUMERO DE DOC	IND	
832	SANF	DOE	GEO	FP	TZ	303	Α	
FORMAT:	м	81	IRF:		DATE: 18	mars 2022	2	






CEM III/C 32,5 N CE PM-ES NF

Domaines d'application

Le ciment CEM III/C 32,5 N CE PM-ES NF est destiné aux travaux de Génie Civil au contact avec des eaux agressives (eau sulfatée, eau pure, eau de mer, ...).

Ce ciment est particulièrement bien adapté aux utilisations suivantes :

- Fondations profondes (pieux, parois moulées, voiles étanches...).
- Injections (sols, cavités, coulis d'étanchéité…).
- Béton de masse (barrages...).
- Ouvrages massifs.
- Travaux routiers (traitement de sols, craie, graves hydrauliques).
- Béton prêt à l'emploi : environnements XS, XF4, XA1, XA2, XA3 - de la norme NF EN 206-1.



Alsthom Relfort

Composition chimique du ciment (Valeurs moyennes en %)

Usine	5% <	clinker «	19%	SO ₃		Na ₂ O
de production	C ₃ A	C ₃ S	C ₂ S		5	Equivalent Actif
Rombas	10,9	65,5	13,4	3	0,6	0,58
Valeurs garanties NF EN 197-1 marquage CE et marque NF				≤ 5		
NF P 15-317 marque NF					< 2	



Polds palette : 1,6 t

Nbre de sacs : 64



Traitement de sol



CEM III/C 32,5 N CE PM-ES NF

Caractéristiques physiques (Valeurs moyennes)

Usine	méca	lésistanc niques m EN en M	ortier	Fin	esse	Eau pâte	Début
de production	2J	71	28J		Refus (%) à 40µm	pure (%)	de prise
Rombas	12	29	44	4280	9	33,8	4h00
Valeurs garanties NF EN 197-1 marquage CE et marque NF		≥14	≥30				≥ 1h30



Pont de l'Europe - Orléans



Viaduc de Drancv



Barrage

Caractéristiques complémentaires de la norme (Valeurs moyennes)

		Chaleur	Maniabilité	Début o	le prise sur	mortier
Usine de production	leinte L	d'hydratation à 41 h en J/g	mortier E/C: 0,50 en secondes	505	Température 20°C	Température 30°C
Rombas	80	205	5,5	10h00	4h30	2h45

Règles de l'art

- Eviter le sous-dosage en ciment qui altère la durabilité des bétons.
- Limiter le rapport E/C qui contribue à la diminution des résistances et à l'augmentation de la porosité.
- Vérifier la compatibilité entre le ciment et les adjuvants utilisés (rhéologie, résistances).
- Ajuster la vibration du béton à sa consistance pour obtenir une compacité maximale sans ségrégation.
- Prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation précoce par temps chaud ou par vent desséchant en procédant à une cure adaptée (paillasson, eau pulvérisée, produit de cure, etc).



Siège d'Air France - Roissy

Ciments Calcia

Les Technodes - BP 01 78931 Guerville cedex

Tél: 01 34 77 78 00 - Fax: 01 34 77 79 06

www.ciments-calcia.fr - E-mail : info@ciments-calcia.fr





Réalisation d'un forage d'exploration géothermique Rue de Montmorency 95150 Taverrny



Maître d'Ouvrage IDEX Croix Rouge Géothermie 148 – 152, Boulevard de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Maître d'œuvre Géothermie GEOFLUID PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Bât. 4A – 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 95947 ROISSY CDG CEDEX



Entreprise titulaire des travaux SANFOR - 8, rue Jean Cocteau 77340 Pontault-Combault



102 000000000	produit de filtra	tion sili	ceux ro	ulé – ().8/1.3n	nm		
N' PRÔJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZÓNE	NUMERO DE DOC	IND	- 10
832	SANF	DOE	GEO	FP	TZ	304	Α	
FORMAT:	A4	SU	IRF:		DATE: 15	mars 2022	2	



che Technique Type

Composition chimique type

SiO2	99,1	%
Fe2O3	0,023	%
AI2O3	0,526	%
TiO2	0,021	%
CaO	0,006	%
MOO	0 400	01

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,65
dureté (Mohs)	7
pH	#7
densité apparente sable sec ("Prolabo")	1,6
perte au feu (à 1000 °C)	0,12%
résistance pyroscopique (SFC ISO R528)	1750℃
T.E.N.	0,68
C.U.	1.39

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)

TAMISAGE AFNOR

% 0	urbe des refus cur	mulés (AFNOR)	
20 -			
40 -	/		
60			
80 -			
00	0,500	250	2,000

ouverture des mailles mm	refus cumulés %
> 2,000 mm	0
> 1,600 mm	0,2
> 1,250 mm	5,5
> 1,000 mm	28,7
> 0,800 mm	76,1
> 0,630 mm	96,5
> 0,500 mm	99,4
Passant	100

Classe µm	refus par tamis %
> 2,000 mm	0
2,000-1,600 mm	0,2
1,600-1,250 mm	5,3
1,250-1,000 mm	23,2
1,000-0,800 mm	47,4
0,800-0,630 mm	20,4
0,630-0,500 mm	2,9
< 0.500 mm	0.6

éf.:2011-1





CENTRE DE PRODUCTION DE MIOS 112 route du Barp 33380 MIOS Tel : -33 (0)5 57 71 10 07 Fax : +33 (0)5 57 71 81 56 SIEGE SOCIAL ET DIRECTION COMMERCIALE 141 Avenue de CLICHY 75848 PARIS Cedex 17 Tel:+33 (0)1 53 78 82 00 Fax:+33 (0)1 42 25 32 23 site web: www.Sibeloo.fr



Annexe 2 : Rapports journaliers de GEOFLUID





GTA1 TAVERNY



RAPPORT N° 1

Date	27/10/2021	Puits
Client	IDEX	Champ

Horaires	Description des opérations
	2 - 270 N S
8h30-9h00	Passage du huissier pour état des lieux initial
9h15	Livraison de la remorque (base-vie) Kiloutou
	Installation du barriérage toute la journée
14h00	VIC en présence de CSB, SANFOR et GEOFLUID
14h30	Départ de CSB
17h	Fin de journée
	I

GEOFLUID 1 superviseur

SANFOR 1 conducteur de travaux + 1 chef-foreur + 1 second

CSB 1 contrôleur SPS





Prévision pour le : 28/10/2021

Terrassement de la plateforme et débroussaillage





Date	28/10/2021
Client	IDEX

Puits	GTA1
Champ	TAVERNY

Description des opérations	
Décapage de la plateforme et stockage de la terre végétale Débroussaillage Livraison de concassé et mise en place sur géotextile	
3	
	Décapage de la plateforme et stockage de la terre végétale

SANFOR

1 conducteur d'engin + 1 chef-foreur + 1 second



Prévision pour le :

29/10/2021

Terrassement de la plateforme





Date	29/10/2021
Client	IDEX

Puits	GTA1
Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
2. 72.	
8h-17h	Livraison de concassé et mise en place sur géotextile
l	
l:	

SANFOR 1 conducteur d'engin + 1 chef-foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur





Prévision pour le : 02/11/2021

Livraison du matériel et début de l'installation du chantier





Date	02/11/2021
Client	IDEX

Puits	GTA1
Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-16h	Installation du chantier
	Livraison de matériel : bac, malaxeur, container, flexibles, pompe, GE, etc.

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur





Prévision pour le : 03/11/2021 Livraison du matériel, de la foreuse et installation du chantier





Date	03/11/2021
Client	IDEX

Puits	GTA1	
Champ	TAVERNY	

Horaires	Description des opérations
1000 1000	
8h-16h	Installation du chantier
	Livraison et mise en station de la foreuse
	Visite SPS de CSB

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second CSB 1 personne



Prévision pour le : 04/11/2021
Installation du chantier
Livraison de matériel





Date	04/11/2021
Client	IDEX

Puits	GTA1	
Champ	TAVERNY	

Horaires	Description des opérations	
8h-16h	Installation du chantier Livraison du matériel tubulaire (masse-tiges, drill pipes, etc.), des outils, du ciment, de la bentonite, etc. Mise en place des deux panneaux d'information	
14h15	Passage de VEOUA pour relever le compteur d'eau et vérifier le disconnecteur	
15h	Passage du SIARE pour contrôler l'état du réseau pluvial	

 SANFOR
 1 chef-foreur + 1 second

 GEOFLUID
 1 superviseur

 VEOLIA
 1 personne

SIARE

2 personnes



Prévision pour le : 05/11/2021
Installation du chantier

Livraison de matériel





GTA1 TAVERNY



RAPPORT N° 7

Date	05/11/2021	Puits	1
Client	IDEX	Champ	

Horaires	Description des opérations
8h-12h	Installation du chantier
12-15h	Réalisation de l'avant-trou (150 cm) à la tarière Ø600 mm
	Début du forage pilote 17"1/2 pour forage 26"

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
GEOFLUID 1 superviseur



Prévision pour le : Forage 26" 08/11/2021





Date	08/11/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
21 222	
8h-10h	Fin du forage pilote 17"1/2 à 9 m
10h-16h	Alésage du trou pilote en 26". Arrêt à 7,5 m
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur
	GEOFLUID 1 superviseur
	GEOFLUID 1 superviseur Prévision pour le : 09/11/2021
	GEOFLUID 1 superviseur





Date	09/11/2021	
Client	IDEX	

Puits	GTA1
Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
11777AGA77A T. 1779A T	The same on the contraction of the same
8h-10h40	Alésage du trou pilote en 26". Cote fin = 7,80 m
10h40-11h	Remontée de la garniture de forage
11h-13h	Descente du tubage Ø565 mm à 7,60 m
	Installation de la tête d'injection du laitier
13h-14h15	Mixage et injection sous pression de #1,3 m3 de laitier (d = 1,84), en 3 batchs
	CEM NI/C32.5 H - SR PM
	Chasse à l'eau de ville
	Pas de retour franc du laitier au jour
14h15-16h	Rangement et nettoyage
	Note that the state of the stat

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur







Prévision pour le : 10/11/2021

Préparation de la prochaine phase de forage
Séchage cimentation





Description des opérations

Date	10/11/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h-16h	Séchage du ciment du tubage Ø565 mm
811-1011	Laitier dans l'annulaire remonté jusqu'à -10 cm/TN
	Préparation du matériel pour la phase de forage du trou pilote 12"1/4
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	Prévision pour le : 15/11/2021





N3/100000000	
Description des opérations	
	Description des opérations

8h-16h	Forage du trou pilote 12"1/4 de 9 m à 23 m
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur
	GEOFLUID 1 superviseur
	GEOFLUID 1 superviseur Prévision pour le : 16/11/2021
	GEOFLUID 1 superviseur





Date	16/11/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
109 200	R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
8h-16h	Forage du trou pilote 12"1/4 de 23 m à 38 m

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur



Prévision pour le : 17/11/2021
Poursuite du forage du trou pilote 12"1/4





Horaires

RAPPORT N° 13

Description des opérations

Date	17/11/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

	Forage du trou pilote 12"1/4 de 38 m à 61 m
15h-17h	Panne de la foreuse
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
_	
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



GTA1

TAVERNY



Date Client 18/11/2021

IDEX

RAPPORT N° 14

Puits Champ

Horaires	Description des opérations
8h-16h	Maintenance de la foreuse
	La foreuse doit être ramenée en atelier le mardi 23/11/21 pour une maintenance plus poussée

SANFOR	1 chef-foreur + 1 second	
Prévision pour	le: 23/11/2021 hine pour maintenance en atelier	





Horaires

RAPPORT N° 15

Description des opérations

Cli	IDEV	CL	TAVERNY
Client	IDEX	[Cnamp	IAVERNY

l	
	23/11/21 :
	Chargement de la foreuse pour retour en atelier et maintenance suite à la panne du 17/11/21
	29/11/21:
	Retour de la foreuse sur site. Mise au droit du forage
	Remise en place du chantier pour reprise de la foration
	CANCOD 1 chof formur + 1 cocond
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	Prévision pour le : 30/11/2021





Date	30/11/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-13h	Recalibration du trou pilote 12"1/4 sur les 61 mètres déjà forés
13h-15h	Poursuite du trou pilote de 61 m à 69,5 m, jusqu'au toit des sables yprésiens. Fin du forage du trou pilote 12"1/4
15h-15h30	Retrait de la garniture de forage 12"1/4
15h30-16h	Préparation de la garniture pour l'alésage du trou pilote en 22"

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



Prévision pour le : 01/12/2021 Alésage du trou pilote en 22"





Horaires

RAPPORT N° 17

Description des opérations

Date	01/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h-16h	Alésage du trou pilote 12"1/4 en 22" jusqu'à 10 m. Avancement faible car présence de bancs durs
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second Prévision pour le: 02/12/2021





Description des opérations

Date	02/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h-16h Alésage du trou pilote 12"1/4 en 22" jusqu'à 17 m. Avancement faible car présence de bancs durs	
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second	
Prévision pour le : 03/12/2021	_
Poursuite de l'alésage du trou pilote en 22''	





Date	03/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-17h	Alésage du trou pilote 12"1/4 en 22" jusqu'à 24,5 m. Avancement faible car présence de bancs durs
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	Prévision pour le : 06/12/2021
	Poursuite de l'alésage du trou pilote en 22"





Date	06/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
132 2236	
8h-16h	Alésage du trou pilote 12"1/4 en 22" jusqu'à 25,8 m. Avancement faible car présence de bancs durs
	Retrait de l'outil du trou : l'outil a été usé par les bancs durs, et doit être changé
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	1 die Foledi + 1 second
	Prévision pour le : 07/12/2021
	Approvisionnement d'un nouvel outil aléseur
	Poursuite de l'alésage du trou pilote en 22"





Horaires

RAPPORT N° 21

Description des opérations

Date	07/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

ı	
	Chantier en stand-by, en attendant d'approvisionner un nouvel outil aléseur 22"
	is the second se
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	Prévision pour le : 08/12/2021
	Prévision pour le : 08/12/2021 Approvisionnement d'un nouvel outil aléseur
	Prévision pour le : 08/12/2021
	Prévision pour le : 08/12/2021 Approvisionnement d'un nouvel outil aléseur





Description des opérations

Date	08/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h-16h	Alésage du trou pilote 12"1/4 en 22" jusqu'à 45 m
	Perte de l'outil pilote 12"1/4 dans le trou
16h-21h	Tentatives de le revisser (sans succès)
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	Prévision pour le : 09/12/2021
	Prévision pour le : 09/12/2021 Approvisionnement de matériel pour repêcher l'outil pilote
	Prévision pour le : 09/12/2021





Horaires

RAPPORT N° 23

Description des opérations

Date	09/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Chantier en stand-by
Approvisionnement de matériel pour repêcher l'outil pilote 12"1/4
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur +1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second Prévision pour le: 10/12/2021 Approvisionnement de matériel pour repêcher l'outil pilote



GTA1 TAVERNY



RAPPORT N° 24

Date	13/12/2021	Puits	
Client	IDEX	Champ	

Horaires	Description des opérations
	10/12/21 :
	Chantier en stand-by
	Approvisionnement de matériel pour repêcher l'outil pilote 12"1/4
	13/12/21:
	Prise d'empreinte (à 25,5 m) pour déterminer la position de l'outil 12"1/4
	Tentatives (sans succès) de revisser l'outil avec un train de tiges + stabilo
	Attente du matériel de repêchage
	<u>l</u>

 SANFOR
 1 chef-foreur + 1 second

 GEOFLUID
 1 superviseur (François Frémont)



Prévision pour le : 15/12/2021
Repêchage de l'outil 12"1/4 avec matériel de fishing





Date	15/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
	14/12/21:
	Chantier en stand-by
	Approvisionnement de matériel pour repêcher l'outil pilote 12"1/4
	15/12/21 :
8h	1ère tentative de repêchage de l'outil 12"1/4 avec couronne de surforage (avec pas de vis au fond, pour tenter de revisser
	l'outil) > top de l'outil à environ 25 m, échec du repêchage
13h	Modification de la couronne de surforage : soudure de pointes afin de bloquer l'outil dans la couronne
15h30	2nde tentative de repêchage > échec du repêchage
17h00	3ème tentative de repêchage avec l'outil de fishing Mustang ("araignée") > échec du repêchage

SANFOR GEOFLUID 1 chef-foreur + 1 foreur + 1 second + 1 chef de chantier

1 superviseur (François Frémont)









Prévision pour le : 16/12/2021 Repêchage de l'outil 12"1/4






Date	16/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h	Modification de la couronne de surforage : ajout d'ailettes pour piéger l'outil (photo)
12h30	Tentative de repêchage de l'outil avec la couronne de surforage > échec du repêchage
	En parallèle, redressage des pointes de l'outil "araignée" Mustang, pour le préparer à une nouvelle descente
16h00	2nde tentative de repêchage avec la couronne de surforage, avec circulation pour évacuer les retombées > échec du repêchage

SANFOR 1 chef-foreur + 1 foreur + 1 second + 1 chef de chantier
GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)













Date	17/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-16h	Repêchage de l'outil 12"1/4, succès

SANFOR 1 chef-foreur + 1 foreur + 1 second + 1 chef de chantier
GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



Prévision pour le : 20/12/2021
Recalibrage du trou pilote 12"1/4



GTA1 TAVERNY



Date Client

RAPPORT N° 28

Puits Champ

20/12/2021 IDEX

Horaires	S Description des opérations	
8h-16h	Recalibrage du trou pilote 12"1/4	
	22 - 2	

GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)	
Prévision po	ur le: 21/12/2021	



GTA1 TAVERNY



Date Client

RAPPORT N° 29	

Puits Champ

21/12/2021 IDEX

	CHERT DEAT
Horaires	Description des opérations
8h-16h	Recalibrage du trou pilote 12"1/4
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	Prévision pour le : 22/12/2021
	Reprise de l'alésage du trou pilote en 22"





Date Client

KAI	PORT N° 30	
22/12/2021	Puits	GTA1
IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-16h	Reprise de l'alésage 22" jusqu'à 45 m
811-1011	neprise de l'alesage 22 Jusqu'à 43 III
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	Prévision pour le : 23/12/2021
	Prévision pour le : 23/12/2021 Alésage du trou pilote en 22"





Horaires

RAPPORT N° 31

Description des opérations

Date	23/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h-17h15	Alésage en 22" du trou pilote 12"1/4 de 45 à 69,5 m (toit des Sables Yprésiens) Fin du forage de la phase 2
17h15	Retrait de la garniture de forage
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	Control of the contro
	Account of the control of the contro
	Account of the control of the contro
	Account of the control of the contro
	Account of the control of the contro
	Control of the contro
	Account of the control of the contro
	Control of the contro
	Account of the control of the contro





RAPPORT N° 32	
---------------	--

Date	27/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
01-151-	
8h-16h	Préparation du tubage et de la cimentation
	Amenée des tubages et du ciment sur place
	Recalibrage du trou
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont) Prévision pour le : 28/12/2021
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)





Date	28/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations	
8h-11h20	Contrôle du trou avec garniture 22" > trou libre jusqu'au fond Remontée de la garniture	
11h20	Début descente du tubage 406 mm : 1 tube descendu complètement (6 m) et 1 tube partiellement descendu (4 m) Soudure de 1 centreur à 10 m, soudure des 2 tubes	
12h00	Impossibilité de descendre le tubage : blocage à 10 m. Retombée du terrain probable	
12h30	Retraît du tubage : découpe de la soudure entre les 2 tubes à la disqueuse	
13h15	Recalibration du forage avec la garniture 22"	
14h25	Plusieurs passages à 10 m/sol pour briser les blocs retombés Recalibration du trou jusqu'au fond	

SANFOR	1 chef-foreur + 1 second + 1 chef de chantier	
GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)	
Prévision pour le :	29/12/2021	





Date	29/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h00	Recalibrage du trou
11h30	Début descente du tubage 406 mm: 11 tubages de 6m + 1 tubage de 3m / Soudures
	3 centreurs entre 69 m/sol et 33 m/sol, 1 centreur à 8m/sol et 1 centreur à 2m/sol
16h00	Pannes successives des deux postes à souder
18h00	Arrivée d'un nouveau poste à souder
18h30	Dernier tubage de 6m déformé aux deux extrémités, chauffage et réajustement à la masse puis soudure
19h30	Découpage à la disqueuse d'une bande de 7cm environ sur le dernier tube de 3m pour souder le tube correctement
20h15	Installation de la tête d'injection du laitier
	Descente des tiges de cimentation à 69 m
	Mixage et injection sous pression de #5 m3 de laitier (1,7 < d < 1,82; 1,75 en moyenne), en 10 batchs de 500L
	Chasse à l'eau de ville (300 L)
	Pas de retour du laitier au jour (Volume de ciment injecté 5m3)
23h30	Rangement du chantier
23h45	Départ du chantier

SANFOR GEOFLUID	1 chef-foreur + 1 second + 1 chef de chantier 1 superviseur (Julien Gasser Dorado)	
	_	

S A R.L. au capital de 65 000,00 € - SIREN 794 554 782 RCS PONTOISE - APE 7112B

30/12/2021

Cimentation complémentaire par l'annulaire jusqu'à retour du ciment au jour

Mesure de la cote du ciment





Horaires

8h00

RAPPORT N° 35

Description des opérations

Date	30/12/2021	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Mixage et injection par l'espace annulaire de 2 batchs supplémentaires (1m3) --> retour au jour

Mesure de la cote ciment dans l'annulaire : 8,40 m/sol

6 m3 de ciment injecté au total

	o his de clinent injecte au total
10h	Rangement et départ du chantier
	SANFOR 1 chef-foreur +1 second
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (Julien Gasser Dorado)
	GEOFLUID 1 superviseur (Julien Gasser Dorado)
	GEOFLUID 1 superviseur (Julien Gasser Dorado) Prévision pour le : 03/01/2022
	GEOFLUID 1 superviseur (Julien Gasser Dorado)





Date	03/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h00	Préparation du matériel
8h30	Découpage de la tête de cimentation
9h00	Réaprovisionnement en carburant de la machine de forage par Caldeo
9h30	Montage de l'outil 14"3/4
10h00	Contrôle de la verticalité de la machine et descente des tiges
	Outil 14"3/4 (3,05m) + 1 réduction (0,36m) + 13 tiges de 5m
	Appareil de forage en mode réduit suite à défection d'un capteur sur la grille
11h00	Fond atteint à 68,40 m/sol + forage ciment jusqu'à 69,90 m/sol + Arrivée GASHET 3D
11h30	Vidage du bac à boue par GASHET 3D
12h00	Remplacement du capteur défectueux
13h00	Arrivée SOLEO pour le CBL
14h00	Départ GASHET 3D (citerne pleine) reste 6m3 environ dans le bac à boue
16h30	Retour GASHET 3D vidage du reste du bac
18h	Forage de 3m supplémentaire jusqu'à la cote 73,20 m/sol
19h00	Remontée des tiges
19h30	CBL
20h30	Rangement du chantier

SANFOR	1 chef-foreur + 1 second +1
SOLEO	1 responsable
CALDEO	1 chauffeur
GASHET 3D	1 chauffeur
GEOFLUID	1 superviseur (Julien Gasser Dorado)

Hill Colors of the Color of the			
Prévision pour le :	04/01/2022		
Phase de Forage 14"3	/4 dans les sables de Cuise		





RAPPORT N° 37	

Date	04/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h00	Préparation des collars et de l'outil
9h00	Descente jusqu'à 73,09 m :
	1 outil 14" 3/4 de 3,05 m + 1 réduction de 0,60 m + 1 m de tige + 4 collars de 5,86m + 9 tiges de 5m
10h00	Préparation de la boue à la bentonite
	Forage jusqu'à 96,80 m/sol avec échantillonage tous les mètres
15h30	Remontée de l'outil au sabot du cuvelage 16"
16h	Livraison compresseur sur site
16h30	Rangement du chantier

SANFOR	1 chef-foreur + 1 second + 1 transporteur
GEOFLUID	1 superviseur (Julien Gasser Dorado)

Prévision pour le : 05/01/2022

Phase de Forage 14"3/4 jusqu'à la profondeur finale et calibration du trou

Livraison de la crépine et du massif de gravier sur site





=		_	_	7.7	-	_		-	_	_		
	R/	4	P	P	O	ıF	19		Ν	0	3	8

Date	05/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h00	Préparation du chantier pour évacuation de matériel et dégivrage
9h30	Réception des crépines inox slot 0,75 mm et du massif de gravier
	- 4 tubes crépinés de 6 m: OD = 219mm , ID = 207 mm; OD collier = 234 mm; ID collier = 224 mm
	- 1 tube de 6 m dont 4 m crépinés et 2 m de pot de sédimentation avec bouchon
	- 1 tube crépiné de 3m et 1 tube crépiné de 2m
	- 1 tube plein de 6m: OD = 222 mm, ID = 212 mm
	- 4 palettes de 48 sacs de 25 kg chacun soit 4,8 tonnes de massif de gravier 0,7 - 1,3 mm
10h30	Evacuation de matériel et de sac de déblais
11h30	Forage jusqu'à 99,50 m/sol - Argiles plastiques atteintes à 97,87 m/sol - échantillonage tous les mètres
12h30	Remontée de la garniture de forage au jour
14h30	Recalibration du forage sans les collars - Descente de 20 tiges de 5m + 1 réduction de 0,36m + outil 14"3/4 de 3,05m
17h30	Remontée de l'outil au sabot du cuvelage 16"
18h	Rangement du chantier

SANFOR	1 chef-foreur + 1 second + 1 transporteur	
GEOFLUID	1 superviseur (Julien Gasser Dorado)	
100		

Prévision pour le : 06/01/2022

Nettoyage du trou

Largage de la crépine et mise en place du massif de gravier

Montage de l'unité d'air lift






Date	06/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

CONTRACTOR SOCIETY	Description des opérations
8h00	Préparation du chantier
8h30	Circulation à l'eau et descente des tiges à la profondeur finale de 99,50 m (pas de décantation)
10h30	Remontée de l'outil au jour
11h30	Descente et soudure des crépines à la profondeur finale
	- 1 tube de 6 m dont 4 m crépinés et 2 m de pot de sédimentation avec bouchon
	- 4 tubes crépinés de 6 m
	- 1 tube plein de 6m
14h	Largage de la crépine
14h30	Mise en place du massif filtrant (0,7/1,3) en gravitaire depuis le haut du forage (1 palette de 1200 kg soit 48 sacs de 16L - 25 kg)
15h30	Installation d'un air lift pour accélérer la mise en place du massif filtrant
	Descente de tige 26-34 à 54,40 m (8 tubes de 6 m + 1 tubes de 6,40 m)
17h30	Début de l'air-lift
	Ajout de 1200 kg de massif filtrant
19h30	Ajout de 600 kg de massif filtrant
	Attente de décantation du massif filtrant pendant la nuit

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second + 1 soudeur

GEOFLUID 2 superviseurs (François Fremont et Julien Gasser Dorado)



Prévision pour le : 07/01/2022
Fin de mise en place du massif filtrant
Installation de l'atelier d'air lift





Date	07/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h00 Ajout de 900 kg de massif filtrant sous air-lift	
Ajout de 900 kg de massir intrant sous air-int	
Masse totale de massif filtrant mis en place = 3,9 T. Top du massif filtrant dans l'EA = 64 m	
Mise en place de l'unité d'air-lift pour commencer le développement de l'ouvrage	
wise of piece de l'unite d'un interpour commencer le developpement de l'ouvrige	
Développement de l'ouvrage par air lift du haut vers le bas	
Difficultés à descendre la colonne AL dans le forage (bouchons) à partir de 63 m	
19h Fin de poste	
2000-00-000 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	
SANFOR 1 chef-foreur + 1 second + 1 aide	
GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)	
Prévision pour le : 10/01/2022	





Date	10/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
9h45	Top du massif filtrant dans l'EA = 64,80 m
31143	Poursuite du développement à l'AL jusqu'à 77 m, du haut vers le bas
	Difficultés à descendre la colonne AL dans le forage (bouchons)
13h	Chute de la colonne AL dans le forage, à cause d'une connexion défectueuse (#60 m dans le puits, posé à 74 m/sol)
14h15	Arrivée sur site d'une cloche de repêchage pour repêcher la colonne, et d'une caméra
	Inspection du forage à la caméra avant manœuvre de repêchage
	ND = 17,2 m/sol
	Plusieurs tentatives de repêchage par revissage de la colonne, à l'aide de la caméra
17h05	Colonne repéchée, poisson au jour
	Retrait de l'intégralité de la colonne pour contrôle
	1

 SANFOR
 1 chef-foreur + 1 second + 1 aide

 GEOFLUID
 1 superviseur (François Frémont)



Prévision pour le : 11/01/2022 Développement de l'ouvrage à l'air lift





Date	11/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h	Inspection caméra de l'ouvrage jusqu'à 59 m. RAS. ND = 19 m
	Descente de la colonne d'AL à 60 m
11h	Reprise de l'AL à partir de 60 m
	Descente de la colonne par sections d'environ 2 m
11h46	Colonne d'AL à 62 m, ND = 44 m
	Poursuite de l'AL jusqu'à 82,46 m

SANFOR 1 chef-foreur + 1 second + 1 aide GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



<u>Prévision pour le : 12/01/2022</u>

Poursuite de l'air lift





Date	12/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-18h	Poursuite de l'AL jusqu'au fond de l'ouvrage
gu-Tgu	Eau limpide, fin du curage air-lift
	Estimation rapide du débit sous air-lift : 8 m3/h. ND < 70 m (sonde pas descendue dans le télescopage
	pour éviter de la coincer)
	Top du massif filtrant dans l'EA = 64,5 m
	Top du massi muant dans i EX = 54,5 m
	Expéditions des 4 échantillons de sables yprésiens pour analyse granulométrique en laboratoire
	500550
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second + 1 aide
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)

S.A.R.L. au capital de 65 000,00 \in - SIREN 794 554 782 RCS PONTOISE – APE 7112B



Prévision pour le :

13/01/2022

Remontée de la colonne air-lift et descente de la pompe au fond de l'ouvrage



Date	13/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-12h	Poursuite de l'air-lift au fond de l'ouvrage
12h-17h	Remontée de la colonne d'air-lift
	Descente d'une pompe SP30 dans le puits
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second + 1 aide
	SANFOR 1 chef-foreur + 1 second + 1 aide GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)





Date	14/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires		Description	on des opérations	
8h-11h	Fin de descente de la colonne de pompage			
	Aspiration à 88 m/sol, haut de la pompe à 86	6 m/sol		
	NS = 34,75 m/RT (distance RT - sol = 0,65 m)			
11h-11h15	Raccordement électrique de la pompe au GE	:		
11h15	Début pompage à 10 m3/h, puis 14 m3/h			
11h50	Poursuite du pompage à 9 m3/h			
13h15	Arrët du pompage à 9 m3/h. ND = 74,54 m/l	RT (pseudo-stabilis	e)	
13h15 13h25	Arrêt du pompage à 9 m3/h. ND = 74,54 m/l Début d'une séquence de pompage par mar			ches/arrêts
				ches/arrêts
				ches/arrêts Q (m3/h)
		che (10 mn)/arrêt ((10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mare	
		che (10 mn)/arrêt M/A	(10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mar	Q (m3/h)
	Début d'une séquence de pompage par mar	m/A 13h15-13h25	10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mard ND (m/RT) après 10 mn 57,31	Q (m3/h) 0
	Début d'une séquence de pompage par mar	M/A 13h15-13h25 13h25-13h35	(10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mar ND (m/RT) après 10 mn 57,31 77,4	Q (m3/h) 0 15
	Début d'une séquence de pompage par mar	M/A 13h15-13h25 13h25-13h35 13h35-13h46	(10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mar ND (m/RT) après 10 mn 57,31 77,4 57,51	Q (m3/h) 0 15
	Début d'une séquence de pompage par mar	M/A 13h15-13h25 13h25-13h35 13h35-13h46 13h46-13h56	(10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mar ND (m/RT) après 10 mn 57,31 77,4 57,51 79,62	Q (m3/h) 0 15 0 15
	Début d'une séquence de pompage par mar	M/A 13h15-13h25 13h25-13h35 13h35-13h46 13h46-13h56 13h56-14h06	ND (m/RT) après 10 mn 57,31 77,4 57,51 79,62 57,73	Q (m3/h) 0 15 0 15
	Début d'une séquence de pompage par mar	M/A 13h15-13h25 13h25-13h35 13h35-13h46 13h46-13h56 13h56-14h06 14h06-14h17	(10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mar ND (m/RT) après 10 mn 57,31 77,4 57,51 79,62 57,73 79,72	Q (m3/h) 0 15 0 15 0 15
	Début d'une séquence de pompage par mar	M/A 13h15-13h25 13h25-13h35 13h35-13h46 13h46-13h56 13h56-14h06 14h06-14h17 14h17-14h27	(10 mn) (à #15 m3/h) >> 5 mar ND (m/RT) après 10 mn 57,31 77,4 57,51 79,62 57,73 79,72 57,15	Q(m3/h) 0 15 0 15 0 15 0

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



<u>Prévision pour le : 17/01/2022</u>

Poursuite du pompage





Date	17/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

loraires			Descrip	tion des opérations		
8h 10h	Prélèvement cône	eloppement par marche arr e Imhoff (Q = 20 m3/h). Dép gée en sable-argile noir	경기에 나는 이번에 가는 것이 가 되었다.		A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
	M/A	ND (m/RT) après 10 mn	Q (m3/h)	M/A	ND (m/RT) après 10 mn	Q (m3/h)
	М	56.52	20	M	86.4	17.2
	A	47.44		A	55.58	
	М	67.56	20	M (10 mn)*	66.21	14
	A	53.71		M (16 mn)*	77.8	
	М	81.75	20	M (20 mn)*	82.62	12.8
	Α	56.65		M (30 mn)*	78.72	10.9
	М	85.2	20	A	55.69	
	A	56.96		M (20 mn)*	68.69	11.7
	М	71.86	15	M (30 mn)*	72.3	11.7
	A	55.43		A	54.94	
	М	70.31	15	M	72.65	17.6
	Α	55.16		A	54.96	
	М	71.96	15	M	69.71	15.3
	Α	55.18		A	54.75	
	М	77.92	18.5	M	73.04	16.8
	A	56.17		Α	54.83	
	М	82.91	18	M	73.27	16.8
	A	56.65		*paliers de pompages supe	rieurs à 10 mn, temps entre p	arenthèses
	М	82.83	18			
	A	56.93				
	М	84.12	17.2			
	A	56.87	·			

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



Prévision pour le : 18/01/2022
Poursuite du développement par pompage





Date	18/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

loraires	ĵ.			des opérations		
8h					au toujours chargée en sab	
	Temps (mn)	ND (m/RT) fin de palier	Q (m3/h)	Temps (mn)	ND (m/RT) fin de palier	Q (m3/h)
	10'	51.07	17	10'	57.21	
	10'	43.16		5'50''	85.65	24.2
	10'	57.22	18.2	10'	55.92	
	10'	46.95		6'30''	85.65	24.7
	10'	62.04	19	10'	55.48	
	10'	50.37		6'24"	85.65	25
	10'	71.07	19.7	10'	55.64	
	10'	53.65		7'22	85.65	26
	10'	82.75	20.6	10'	55.98	
	10'	55.28		6'16"	85.65	26
	10'	79.69	20	10'	53.31	
	10'	54.85		8'18"	85.65	26
	10'	78.94	19.6	10'	55.68	
	10'	53.3		7'08"	85.65	26
	10'	71.18	20.4			
	10'	51.31				
	10'	69.1	20.7			
	10'	51.51				
	10'	73.35	21			
	10'	52.61				
	57'	77.72	14.82			
	10'	54.1				
	9'35"	85.64	22.6			
	10'	57.75				
	6'50"	85.65	22.6			

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)

<u>Prévision pour le :</u> <u>19/01/2022</u> Poursuite du développement par pompage





Date	19/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires				des opérations		etus (Scoolnoss)
8h					au toujours chargée en sab	
	Temps (mn)	ND (m/RT) fin de palier	Q (m3/h)	Temps (mn)	ND (m/RT) fin de palier	Q (m3/h)
	15'	50.38	13.3	10'	53.51	
	20'	53.02	15.1	7'25"	86	26
	30'	57.12	14	10'	54.72	
	40'	60.08	14	7'28"	86	26
	62'	66.98	14	10'	54.51	
	13'	49.31		5'	85.65	32
	9'34"	85.65	26	10'	55.45	
	10'	55.51		4'44"	85.65	35
	6'44"	85.65	26	10'	54.82	
	10'	43.88		4'57"	85.65	35
	?	84.35	26	10'	55.02	
	10'	54.92		15'	70.45	15
	6'30"	86	26	20'	77.58	14.5
	10'	55.42		30'	76.51	14.3
	6'22"	86	26	43'	77.28	14.7
	10'	55.75		10'	54.1	
	6'33"	86	26	4'47"	86	34.7
	10'	55.48		10'	56.98	
	6'56"	86	26	18'	69.22	12.6
	10'	55.51		10'	?	
	6'28"	86	26	10'	69.32	12.9
	10*	54.88			200	
	7'11"	86	26			
	10'	54.32				
	7'38"	86	26			

SANFOR	1 foreur + 1 second	
GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)	

Prévision pour le : 20/01/2022
Poursuite du développement par pompage
Micro-moulinet





Date	20/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

loraires	Description des opérations				
8h	NS = 34,88 m/RT				
	Pompage pendant 1h30 à faible débit pour nettoyer le puits en vue du micro-moulinet				
	En fin de pompage : Q #12,7 m3/h, ND = 62,41 m/RT				
	Remontée de la pompe à 57 m				
10h	Arrivée de SOLEO. Installation de l'atelier de diagraphie, descente du micromoulinet dans GTA1				
	Difficultés à passer le micromoulinet dans le téléscopage : retrait du centreur				
	Descente du microumoulinet jusqu'en bas des crépines (97,5 m/sol). Calibration de l'outil				
	A partir de 94 m/sol, le micromoulinet ne tourne plus (présence probable d'eau chargée en matières ou de boue)				
	Descente de la pompe à 64 m/sol (au-dessus du téléscopage)				
12h25	Acquisition statique (sans pompage) : pas de flux interne. NS = 34,88 m/RT				
12h45	Acquisitions dynamiques (avec pompage) :				
	Run 1 (10 m3/h)				
	Run 2 (12,4 m3/h)				
	Run 3 (12,5 m3/h)				
	Run 4 (14 m3/h)				
	Run 5 (14 m3/h)				
	Impossible de monter le débit à plus de 14 m3/h (dénoyage de la pompe à cause du rabattement)				
	Derniers runs menés jusqu'à environ 96 m/sol (le micromoulinet tourne plus bas que 94 m/sol pour ces runs)				
	Résultats terrains provisoires : la quasi-totalité du flux provient de l'intervalle 71-73 m/sol. A confirmer avec les logs définitifs				
	La partie inférieure du log montre des artefacts, a priori liés au battement de la sonde car elle n'est pas centrée				
14h30	Début remontée pompe immergée				

SANFOR	1 foreur + 1 second
GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)
SOLEO	1 personne

Prévision pour le : 21/01/2022
Remontée de la pompe immergée

Préparation de l'atelier d'injection du peroxyde d'hydrogène





Date	21/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

	Description des opérations			
8h-16h	Remontés de la nomne immercés			
8n-16n	Remontée de la pompe immergée : Descente de la colonne air-lift, qui servira aussi à injecter le peroxyde d'hydrogène			
	Air-lift du forage de 70 m à 99,50 m : présence de sable-argile dans l'eau d'exhaure			
	Remontée de la colonne pour se positionner à 70 m/sol, en vue d'injecter le peroxyde dans le niveau producteur			
	SANFOR 1 foreur + 1 second CSOCIUD 1 type picture (France): Frámont)			
	SANFOR 1 foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)			
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)			
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont) Prévision pour le : 24/01/2022			
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)			





Date	24/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h	Préparation de l'atelier d'injection de peroxyde d'hydrogène : sur site, 200 litres de peroxyde Le sabot de la colonne est à 70 m/sol
10h48	Début injection du peroxyde d'hydrogène (200 litres injectés)
11h14	Fin injection du peroxyde d'hydrogène. Début injection de la chasse à l'eau de ville (400 l injectés)
12h05	Fin injection de la chasse
	Attente 1h de réaction du peroxyde d'hydrogène (vanne fermée en tête de colonne d'injection)
13h05	Ouverture vanne : dégagement gazeux
13h15	Pistonnage de l'ouvrage (piston + brosse au sabot de la colonne AL) de 70 m à 99,50 m
	Passe de 15-30 mn, puis ajout d'une tige pour poursuivre le pistonnage plus profondément
16h00	Fin du pistonnage. Attente réaction/décantation toute la nuit
	Top fond du puits à #91 m/sol : déjà environ 8 m de décantat (sachant que la décantation n'est pas finie)
	Remontée de la colonne de quelques mètres pour éviter qu'elle se retrouve coincée dans la matière en train de décanter

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)





<u>Prévision pour le : 25/01/2022</u>

Air-lift du forage





Date	25/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-16h	Top fond du puits : environ 8,5 m de décantat Curage par air-lift du puits de 70 m à 99,5 m
14h30 15h	Mesure de la teneur en sédiment par cône Imhoff (au début de l'air-lift à 99,5 m) : 42 ml de sédiments/1000 ml (cône 1) Mesure de la teneur en sédiment par cône Imhoff (après 30 mn d'air-lift à 99,5 m) : 0,1 ml de sédiments/1000 ml (cône 2)

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)







Prévision pour le : 26/01/2022
Remontée de la colonne air-lift
Descente de la pompe immergée





Date	26/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
1002 - 2222	
8h-16h	Remontée de la colonne d'air-lift
	Descente de la pompe immergée (cote prévisionnelle = aspiration à 68 m/sol)
	SANFOR 1 foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	1 supervised (François Fremont)
	Prévision pour le : 27/01/2022
	Descente de la pompe immergée
	Déménagement de la machine de forage





Date	27/01/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
8h-16h	Rangement de l'atelier de forage et déménagement de la foreuse Descente de la pompe : aspiration à 83 m/sol
	SANFOR 1 foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	Prévision pour le : 28/01/2022
	Développement du forage par pompage
	C A D L av assisted to 00 00 C CIDEN TO LEGATION DOC DON'T CICE. ADD 7440D



GTA1 TAVERNY



RAPPORT N° 55

Date	28/01/2022	Puits
Client	IDEX	Champ

Horaires	Description des opérations						
8h	NS = 34,28 m/rep	e PVC, à 0,15 m du	haut du casing (sol). Les cot	e annotate e contrata que las construires. Pero e entre e el contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata del la cont			
9h20-14h45	300-11-00-1 10-1 0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10		ontinu. Eau chargée de part			•	
	Heure	Durée	NS/ND (m/rep)	s (m)	Débit (m3/h)	Dépôt (ml/litre)	
	09:20	0	34.28	0	10		
	09:30	00:10	43.94	9.66	10.6	4	
	10:00	00:40	44.76	10.48	10.6	5	
	10:15	00:55 00:58	44.89 45.79	10.61	10.6		
	10:18	01:05	45.97	11.69	12.1	-	
	10:27	01:05	46.46	12.18	14.4		
	10:35	01:15	47.72	13.44	15.5		
	10:45	01:25	48.82	14.54	14.8	0.7	
	10:55	01:35	49.31	15.03	15.2	0.7	
	11:05	01:45	49.45	15.17	15.2		
	11:15	01:55	49.56	15.28	15.1		
	11:17	01:57	50.16	15.88	18.6		
	11:26	02:06	51.72	17.44	17.7	5	
	11:40	02:20	52.58	18.3	18.2		
	11:44	02:24	53.27	18.99	20.6	2	
	12:00	02:40	55.34	21.06	20.4		
	12:10	02:50	55.68	21.4	20.8		
	12:30	03:10	57.62	23.34	20		
	12:45	03:25	58.33	24.05	21.2		
	13:00	03:40	58.2	23.92	20.4	2.5	
	13:15	03:55	58.02	23.74	20.4		
	13:25	04:05	59.87	25.59	22.5	0.1	
	13:35	04:15	60.97	26.69	24		
	13:50	04:30	61.85	27.57	24.6	2.5	
	14:05	04:45	62.96	28.68	24.5	< 0.1	
	14:15	04:55	63.44	29.16	25.4		
	14:30	05:10	64.51	30.23	25.5		
	14:45	05:25	64.73	30.45	25.5		

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)

Prévision pour le : 31/01/2022
Développement du forage par pompage





Date	31/01/2022	
Client	IDEX	

Puits	GTA1	
Champ	TAVERNY	

Horaires	Á		Description d	es opérations		
8h30	Repère = haut du t	u puits par pompage alte ube PVC, à 0,15 m du ha 1h20 (0,2 ml/1l) ; 11h32	ut du casing (sol). Les co	nd arrobas on travel an escolutiva, service	rapport à ce repère	
	Heure	NS/ND (m/rep)	Débit (m3/h)	Heure	NS/ND (m/rep)	Débit (m3/h)
	08:30	34.28		14:10	57.76	26
	08:40	52.13	25.5	14:20	41.44	3
	08:50	39.02		14:30	59.18	30
	09:00	54.51	25.1	14:40	41.52	
	09:10	39.36		14:50	59.91	30
	09:20	54.81	25	15:00	41.88	
	09:30	39.82		15:10	61.01	30
	09:40	55.16	25	15:20	43.22	
	09:50	39.88		15:30	60.84	30
	10:00	55.19	25	15:40	42.53	2
	10:10	40.08		15:50	62.63	30
	10:20	55.46	25	16:04	45.42	
	10:30	40.64		17:00	68.5	29
	10:40	55.93	25			
	10:50	40.47				
	11:00	55.72	25			
	11:10	40.09				
	11:20	55.76	25			
	11:30	40.46				
	11:40	56.37	25			
	11:50	40.66				
	12:00	56.14	25			
	12:10	39.78				
	13:10	62.56	25			
	13:20	43.32				
	13:30	57.86	25			
	13:40	42.02				
	13:50	57.21	26			
	14:00	41.2				

SANFOR 2 personnes

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)

Prévision pour le : 01/02/2022

Retrait de la pompe et descente de la colonne d'injection du peroxyde d'hydrogène





Date	01/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

8h-16h Remontée de la pompe immergée Descente de la colonne air-lift à 71 m/sol, qui servira aussi à injecter le peroxyde d'hydrogène	
Descente de la colonne air-lift à 71 m/sol, qui servira aussi à injecter le peroxyde d'hydrogène	
SANFOR 1 foreur + 1 second	
GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)	
Defeates and the 03/03/2033	
Prévision pour le : 02/02/2022	
Injection du peroxyde d'hydrogène	





DA	PPOR	T Nº	50	

Date	02/02/2022
Client	IDEX

Puits	GTA1
Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations	
8h	Préparation de l'atelier d'injection de peroxyde d'hydrogène : sur site, 200 litres de peroxyde Le sabot de la colonne est à 71 m/sol	
	Injection du peroxyde d'hydrogène (200 litres injectés)	
	Injection de la chasse à l'eau de ville (400 l'injectés)	
9h20	Fin injection de la chasse	
	Attente 1h de réaction du peroxyde d'hydrogène (vanne fermée en tête de colonne d'injection)	
10h20	Pistonnage de l'ouvrage (piston + brosse au sabot de la colonne AL) de 70 m à 99,50 m	
16h00	Fin du pistonnage. Attente réaction/décantation toute la nuit	
	30 cm de décantât au fond du puits	
	I .	

SANFOR 1 foreur + 1 second

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)





Prévision pour le : 03/02/2022

Air-lift de l'ouvrage





PARIS-NORD II – Immeuble Business Park – Båt. 4A 165, rue de la Belle Etoile – BP 57072 – 95947 ROISSY CDG CEDEX Tél. 33 (0) 1 48 63 08 08 – Fax 33 (0) 1 48 63 08 89 – E-mail : office@geofluid.fr

	RAF		
Date	03/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Description des opérations

8-14h	Curage par air-lift du puits de 70 m à 99,5 m
L4h-17h	Remontée de la colonne d'air-lift
	SANFOR 1 foreur + 1 second
	SANFOR 1 foreur + 1 second GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont) Prévision pour le : 04/02/2022
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)





Date	04/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
28 822	
8h-12h	Descente de la pompe dans le forage. Echec de la tentative de démarrage
12h-15h	Remontée partielle de la pompe
	Passage du SIARE (en charge de l'assainissement) pour constat inopiné de l'état du réseau pluvial :
	du sable issu du chantier de forage est constaté dans le réseau. Demande du SIARE (par mail) de curer le réseau
	I
	SANFOR 2 opérateurs
	SANFOR 2 opérateurs GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont) Prévision pour le : 07/02/2022
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)





Date	07/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

sable issu du forage présent dans le réseau pluvial. transmet les coordonnées d'un prestataire à SANFOR : 47,78 m/sol. s = 13,52 m
transmet les coordonnées d'un prestataire à SANFOR
transmet les coordonnées d'un prestataire à SANFOR
= 47,78 m/sol. s = 13,52 m
: 47,78 m/sol. s = 13,52 m
47,78 m/sol. s = 13,52 m
: 47,78 m/sol. s = 13,52 m

SANFOR	2 opérateurs	
GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)	
Prévision pour l	<u>e: 08/02/2022</u>	





Date	08/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	1		Description d	es opérations		
8h30 10h40 13h00	Interruption du po	puits par pompage con mpage pour intervention pement du puits par po		N. 100		
	Heure	NS/ND (m/sol)	Débit (m3/h)	Heure	NS/ND (m/sol)	Débit (m3/h)
	08:30	34.16	0	14:20	54.82	30.2
	08:40	39.92	20.2	14:30	54.97	30.2
	08:50	45.22	20.2	14:40	55.04	30.1
	09:00	46.93	20.2	14:50	55.18	30.1
	09:10	47.22	20.2	15:00	55.14	30.1
	09:20	47.58	20.1	15:10	55.22	30.1
	09:30	47.59	20.1	15:20	55.36	30.1
	09:40	47.61	20.1	15:30	55.42	30.1
	09:50	47.62	20.1	16:10	59.68	34.4
	10:00	51.16	25.2			
	10:10	51.18	25.2			
	10:20	51.19	25.2			
	10:30	51.24	25.3			
	10:40	51.28	25.3			
	13:00	34.18	0			
	13:10	39.8	25.3			
	13:20	44.61	25.3			
	13:30	48.54	25.3			
	13:40	50.42	25.3			
	13:50	50.53	25.3			
	14:00	53.64	30.2			
	14:10	54.58	30.2			

2 opérateurs 1 superviseur (François Frémont)	





Date	09/02/2022	
Client	IDEX	

Puits	GTA1
Champ	TAVERNY

Horaires			Description d	es opérations		
8h30	Développement du	puits par pompage con	tinu			
	Heure	NS/ND (m/sol)	Débit (m3/h)	Heure	NS/ND (m/sol)	Débit (m3/h)
	08:30	34.22	30.2	13:45	55.16	29.1
	08:40	49.83	30.2	14:00	55.18	29.1
	08:50	53.38	30.2	14:15	55.19	29.1
	09:00	53.98	30.2	14:30	55.2	29.1
	09:10	54.26	30.2	14:45	55.2	29.1
	09:20	54.38	30.2	15:00	55.21	29.1
	09:30	54.57	29.4	15:15	55.21	29.1
	09:45	54.62	29.4	15:30	55.22	29.1
	10:00	54.73	29.4	15:45	55.22	29.1
	10:15	54.75	29.4	16:00	55.23	29.1
	10:30	54.78	29.4		X.) 108	
	10:45	54.84	29.4			
	11:00	54.88	29.4			
	11:15	54.91	29.2			
	11:30	54.96	29.2			
	11:45	54.98	29.2			
	12:00	55.01	29.2			
	12:15	55.04	29.2			
	12:30	55.06	29.2			
	12:45	55.08	29.1			
	13:00	55.11	29.1			
	13:15	55.14	29.1			
	13:30	55.14	29.1			


SANFOR 2 opérateurs	
2 Operateurs	
GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)	

Prévision pour le : 10/02/2022
Essais de pompage par paliers





Date	10/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

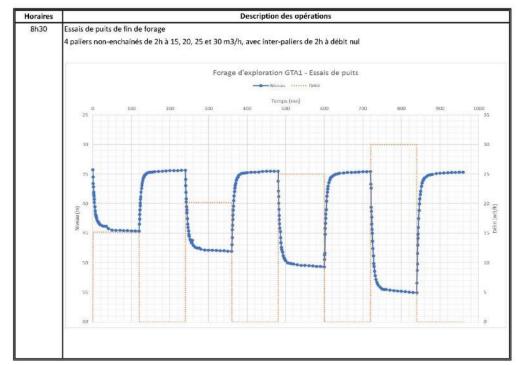

SANFOR	2 opérateurs	
GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)	


Prévision pour le : 14/02/2022
Essai de nappe longue durée






RAPPORT N° 65		
7		

Date	14/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

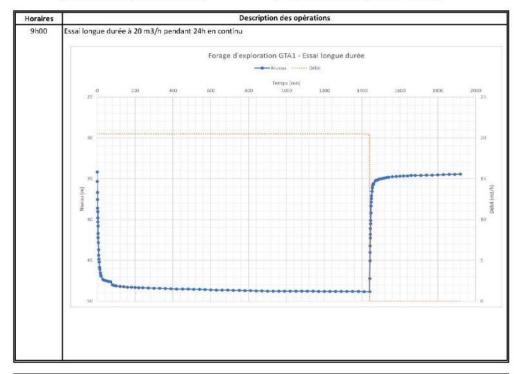


SANFOR	2 opérateurs
GEOFLUID	1 superviseur (François Frémont)







RAPPORT N° 66		
15/02/2022	Puits	GTA1
	702	V

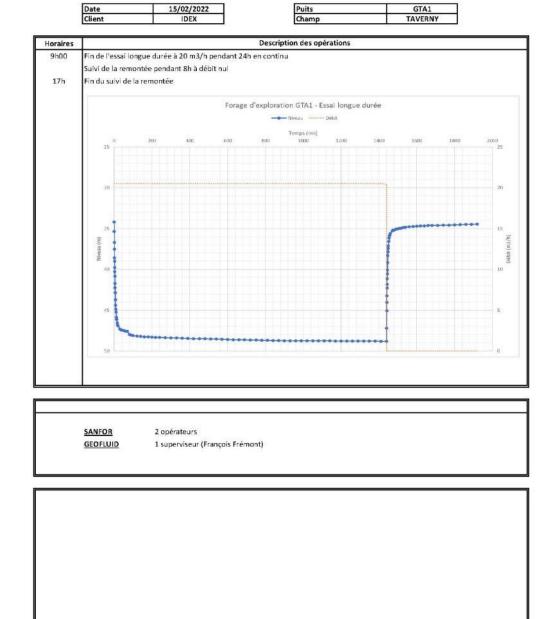

S.A.R.L. au capital de 65 000,00 € - SIREN 794 554 782 RCS PONTOISE - APE 7112B



Prévision pour le :

Remontée de la pompe

16/02/2022



Date	16/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
	Remontée de la pompe
	Soudure d'une bride sur le tubage 16" (haut de la bride à 27 cm du sol)
	SANFOR 2 opérateurs
	SANFOR 2 opérateurs GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont) Prévision pour le : 17/02/2022
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)
	GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont) Prévision pour le : 17/02/2022





Date	17/02/2022
Client	IDEX

Puits	GTA1	
Champ	TAVERNY	

Horaires	Description des opérations
8h	Intervention de SOLEO pour la réalisation des diagraphies :
	- Inspection vidéo
	- diagraphie gamma-ray
	- contrôle de la verticalité de l'ouvrage
	En parallèle, rangement du chantier

SANFOR 2 opérateurs

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)

SOLEO 2 opérateurs



Prévision pour le : 18/02/2022

Rangement du chantier et évacuation du matériel





Date	18/02/2022	Puits	GTA1
Client	IDEX	Champ	TAVERNY

Horaires	Description des opérations
	Rangement du chantier
	Equipement de la tête de puits : réalisation d'une margelle béton et pose d'une buse de protection
	Miles MA SHA SHA SHA SHA SHA MA MALA
	Fin du chantier de forage

SANFOR 2 opérateurs

GEOFLUID 1 superviseur (François Frémont)



