



COPIE

05422X0029/F.

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise:	<b>SARL VAN INGEN FORAGES</b>
Client:	<b>MR GRATEAU DIDIER</b> Le Pressoir 37350 LE GRAND PRESSIGNY
Maître d'oeuvre:	<b>MR GRATEAU DIDIER</b> Le Pressoir 37350 LE GRAND PRESSIGNY
Exploitant:	<b>MR GRATEAU DIDIER</b> Le Pressoir 37350 LE GRAND PRESSIGNY

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Le Pressoir

37350 LE GRAND PRESSIGNY

Coordonnées :

Longitude

536804

Latitude

0

Altitude :

0.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 11/03/2013

Resp. M. Ouvrage : MR GRATEAU

Date fin de l'ouvrage : 12/03/2013

Resp. M. Oeuvre : MR GRATEAU

Machine : Ecofore 903

Resp. Chantier : SARL VAN INGEN

Date début pompage : 12/03/2013

Niveau statique non perturbé : 15.80 m

Date fin de pompage : 12/03/2013

Débit Maxi. d'essai : 15.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

DREAL 18/03/2013



## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

**Client:** MR GRATEAU DIDIER  
**Maître d'oeuvre:** MR GRATEAU DIDIER  
**Lieu de l'ouvrage :** Le Pressoir  
 37350 LE GRAND PRESSIGNY

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Argile et calcaire
3.00	7.00	Calcaire jaune
7.00	18.00	Calcaire gris
18.00	19.00	Argile grise
19.00	25.00	Calcaire gris
25.00	26.00	Argile grise
26.00	41.00	Calcaire blanc
41.00	84.00	Argile grise
84.00	95.00	Grès + sable

#### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	95.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	9"	230.00	3.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	83.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
83.00	91.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

#### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	40.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Annulaire			1.16
40.00	83.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Autre	2.00-4.00	3.00
83.00	91.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Autre	0.95	1.50

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Travaux réalisés : 111  
du : 11/03/2013 au : 12/03/2013


Client : MR GRATEAU DIDIER  
 Maître d'oeuvre : MR GRATEAU DIDIER  
 Localisation de l'ouvrage : Le Pressoir  
 37350 LE GRAND PRESSIGNY

Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): 0  
 Latitude (Y): 0  
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/480

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

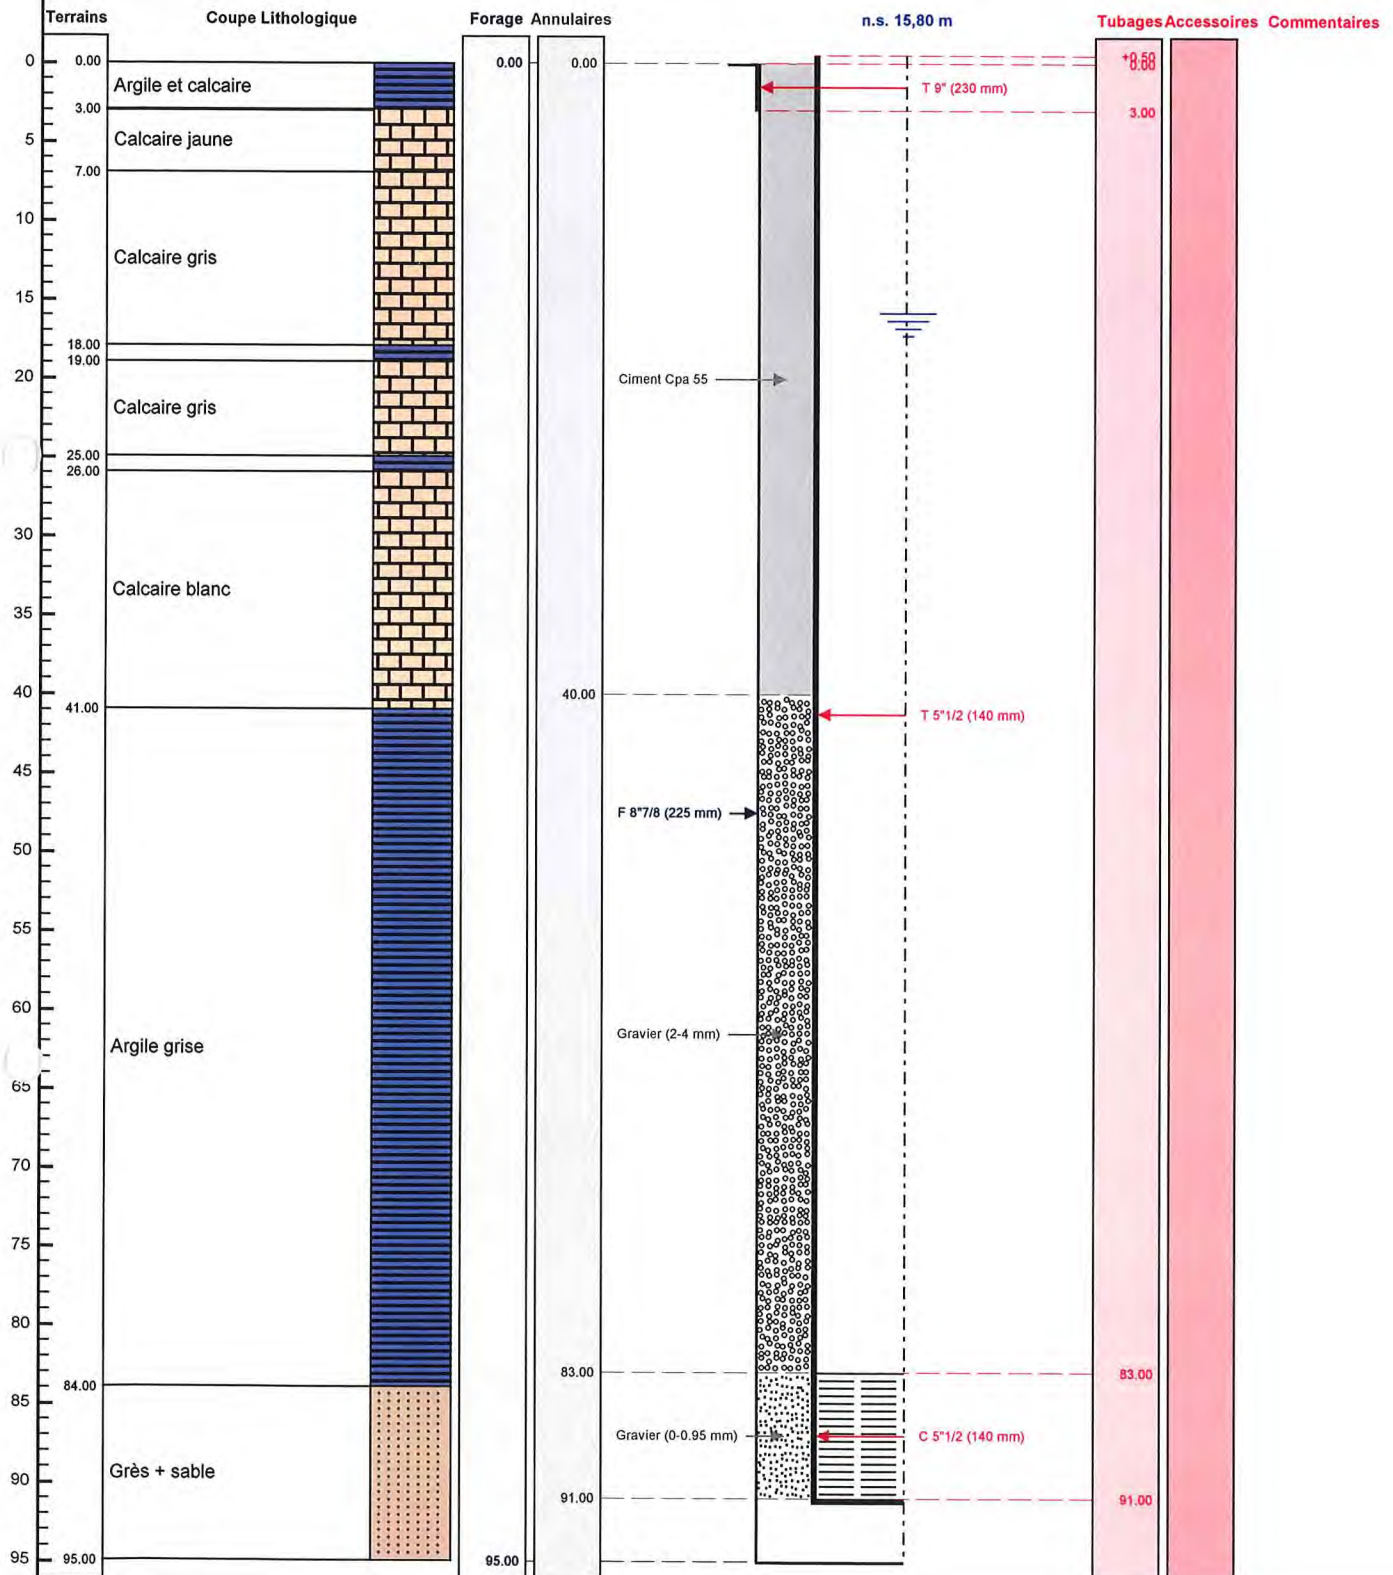

Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise
