

# DOSSIER TECHNIQUE

## PIEZO 5



Charte qualité

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Route de l'Orguichon  
14540 ROCQUANCOURT

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 15/10/2019

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 21/10/2019

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Ecofore 1604

**Resp. Chantier :** DUBREUIL

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.50 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## PIEZO 5



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

14540

ROCQUANCOURT

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.30	Terre végétale
0.30	4.60	Calcaire silex blanc
4.60	32.60	Calcaire assez dur blanc
32.60	40.60	Schiste gris foncé
40.60	49.60	Schiste très argileux marron

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	9"3/8	238.00	M.f.t.	Air
2.00	49.60	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
40.60	0.50

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	8.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
8.00	49.60	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.00	3"1/2	90.00	Ciment	Clk	Annulaire			

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
6.00	6.00	Packer

# PIEZO 5

Travaux réalisés : 11/1  
du 15/10/2019 au 21/10/2019

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Route de l'Orguichon

14540 ROCQUANCOURT

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0.000 m

Echelle : 1/249

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

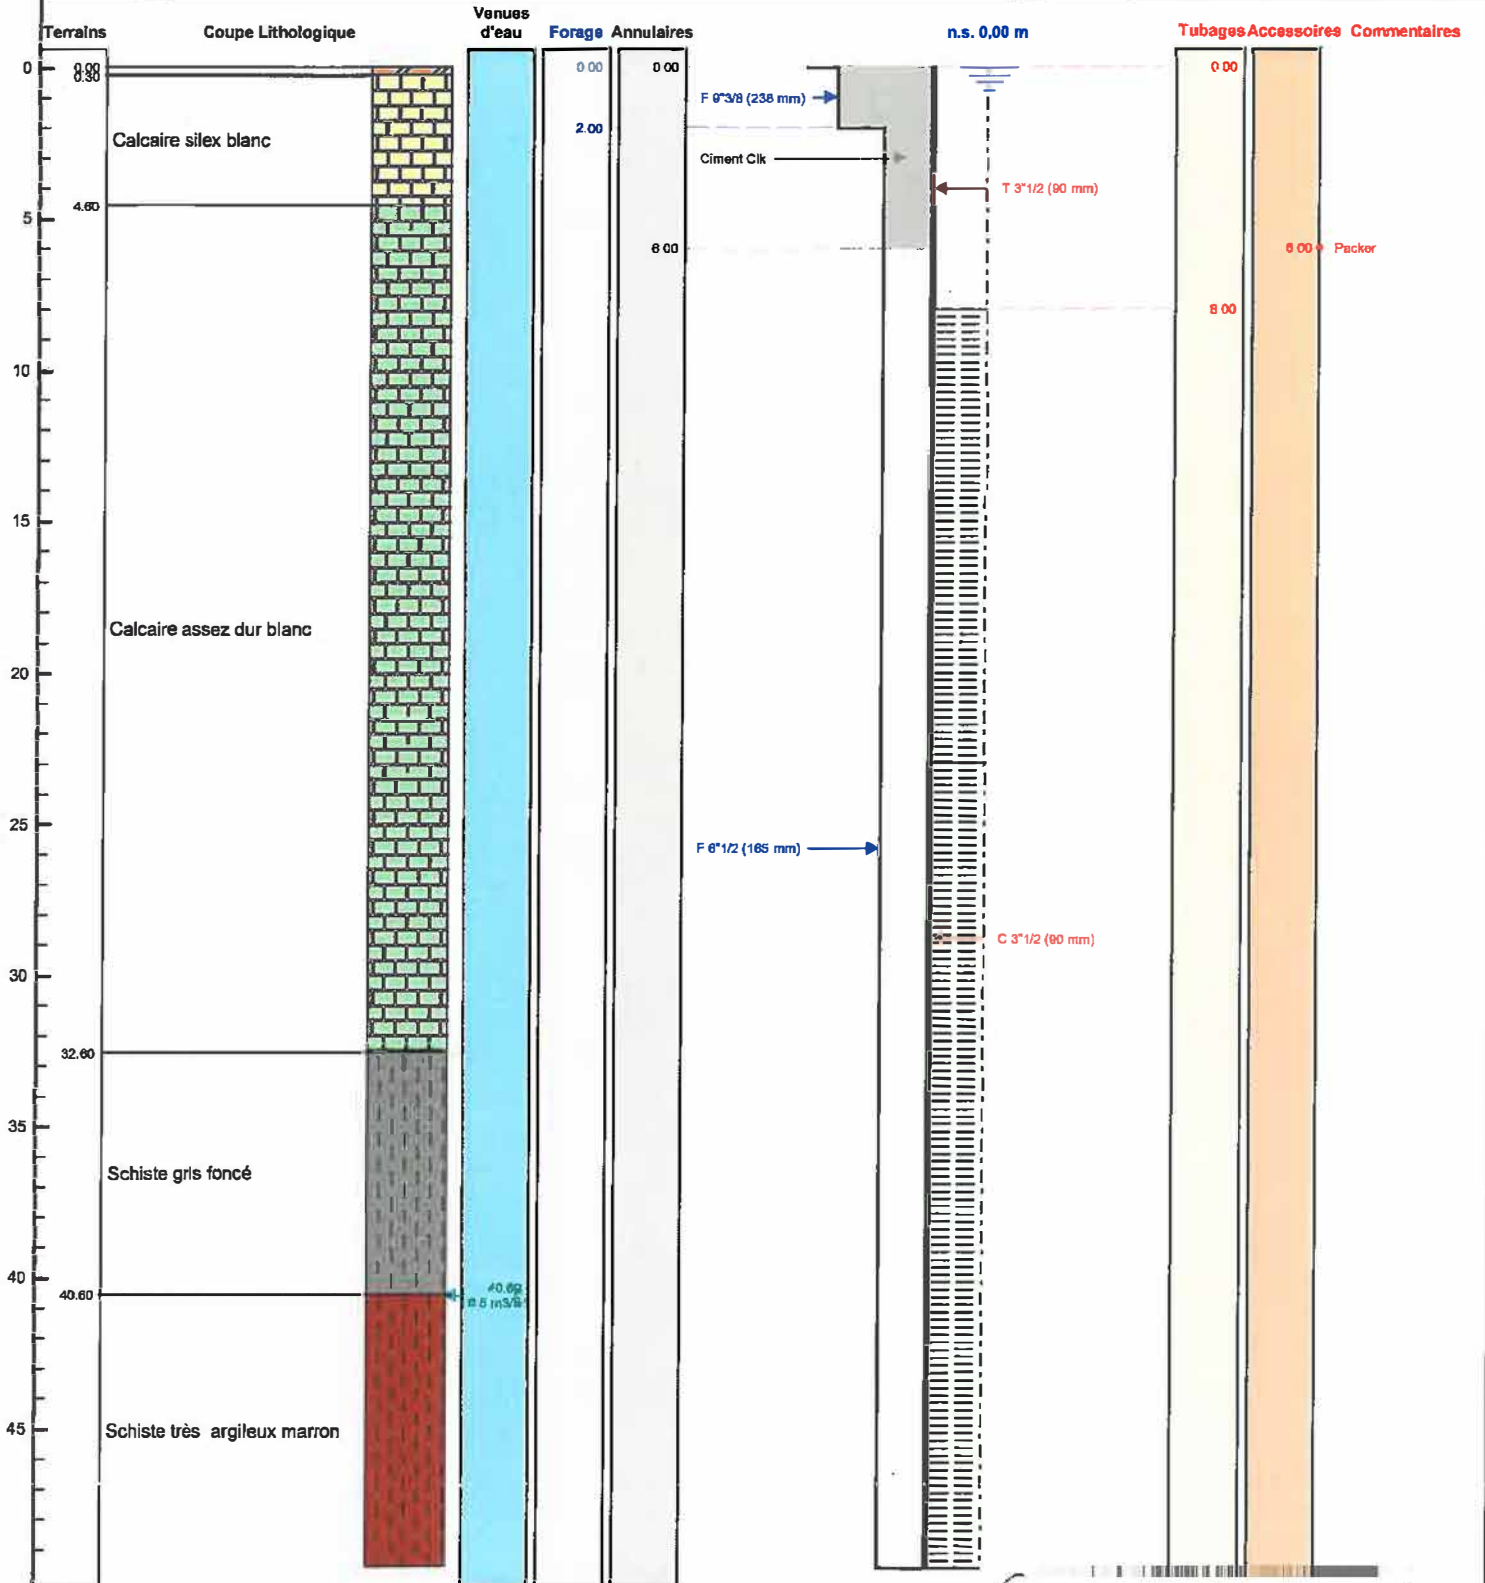

Le 13/NOV. 2019 à LA GUERCHE DE BRETAGNE

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0.000 m

333 329 055 R.M. 35

PAGE: 3
