

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004BYDD

N° Déclaration ** : 93843

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : CHEMIN DE L'ANTENNE MONT PINCON

14770 LE PLESSIS GRIMOULT

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 351.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/12/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 06/12/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 25.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 1.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : CHEMIN DE L'ANTENNE MONT PINCON

14770 LE PLESSIS GRIMOULT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	18.00	CALCAIRE MARRON, BLANC, JAUNE
18.00	20.00	ARGILE GRIS
20.00	40.00	CALCAIRE DEGARDE + SCHISTE GRIS
40.00	43.00	SCHISTE + PASSAGE SABLE NOIR
43.00	47.00	SCHISTE ROUGE ET BLANC
47.00	49.00	SCHISTE GRIS ET MARRON

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
27.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
29.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
20.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 11
du : 06/12/2021 au : 06/12/2021 1


Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +351,000 m

Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrage : CHEMIN DE L'ANTENNE MONT PINCON
14770 LE PLESSIS GRIMOULT

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

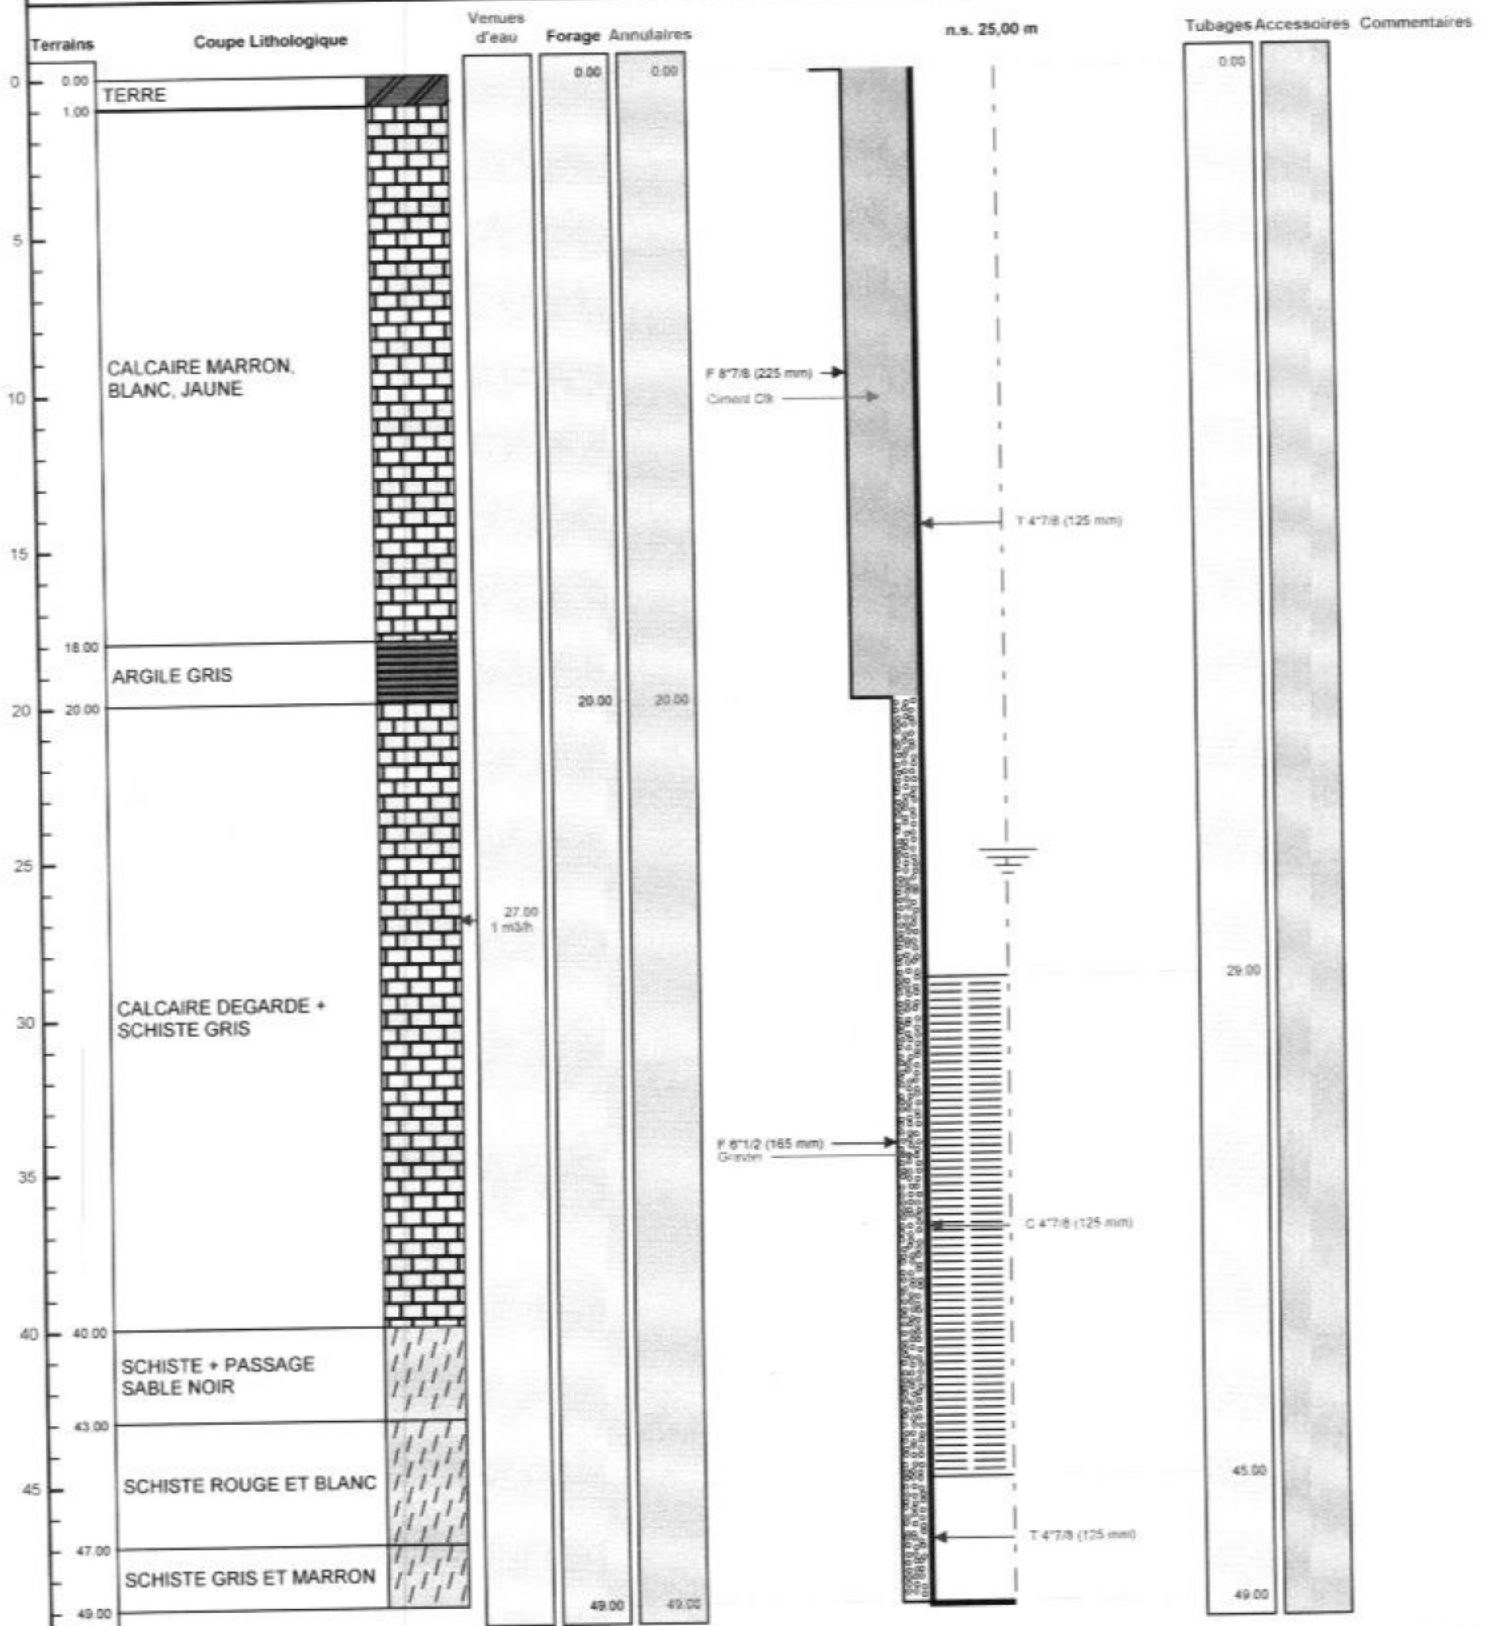

Le 06/12/2021 à 15h00
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE
Tampon et signature du chef d'entreprise

AGE

Lambert 1 carto métrique

Long : 06 10 27 10 00
Port : 06 15 05 68 74
N° Siren 420 697 708 00022

PAGE: 3
