

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS: **BSS004CWFV**

N° Déclaration ** : 151546

Police de l'eau *:

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : IMPASSE DE LA FERME

76330 ST MAURICE D ETELAN

Coordonnées :

Longitude 0

Latitude 0

Altitude : 0.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 31/05/2021

Resp. M. Ouvrage : DE BELLOY

Date fin de l'ouvrage : 31/05/2021

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 6.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 24.00 m

Notes : débit estimatif de 6m3/h

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

76330

ST MAURICE D ETELAN

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.00 | 1.00 | TERRE |
| 1.00 | 24.00 | SABLE GRIS BLANC |
| 24.00 | 34.00 | CRAIE BLANCHE + SILEX |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 10.00 | 8"7/8 | 225.00 | M.f.t. | Air |
| 10.00 | 34.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 24.00 | 6.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 18.00 | 30.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | 50 |
| 30.00 | 34.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |

REEMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|----------|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Autre | Gravitaire | | | |
| 10.00 | 34.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier | Graviers de Loire | Gravitaire | Roule | | |

FORAGE D'EAU


Travaux réalisés : 11
du 31/05/2021 au 31/05/2021 21

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +0.000 m

Echelle : 1/171

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

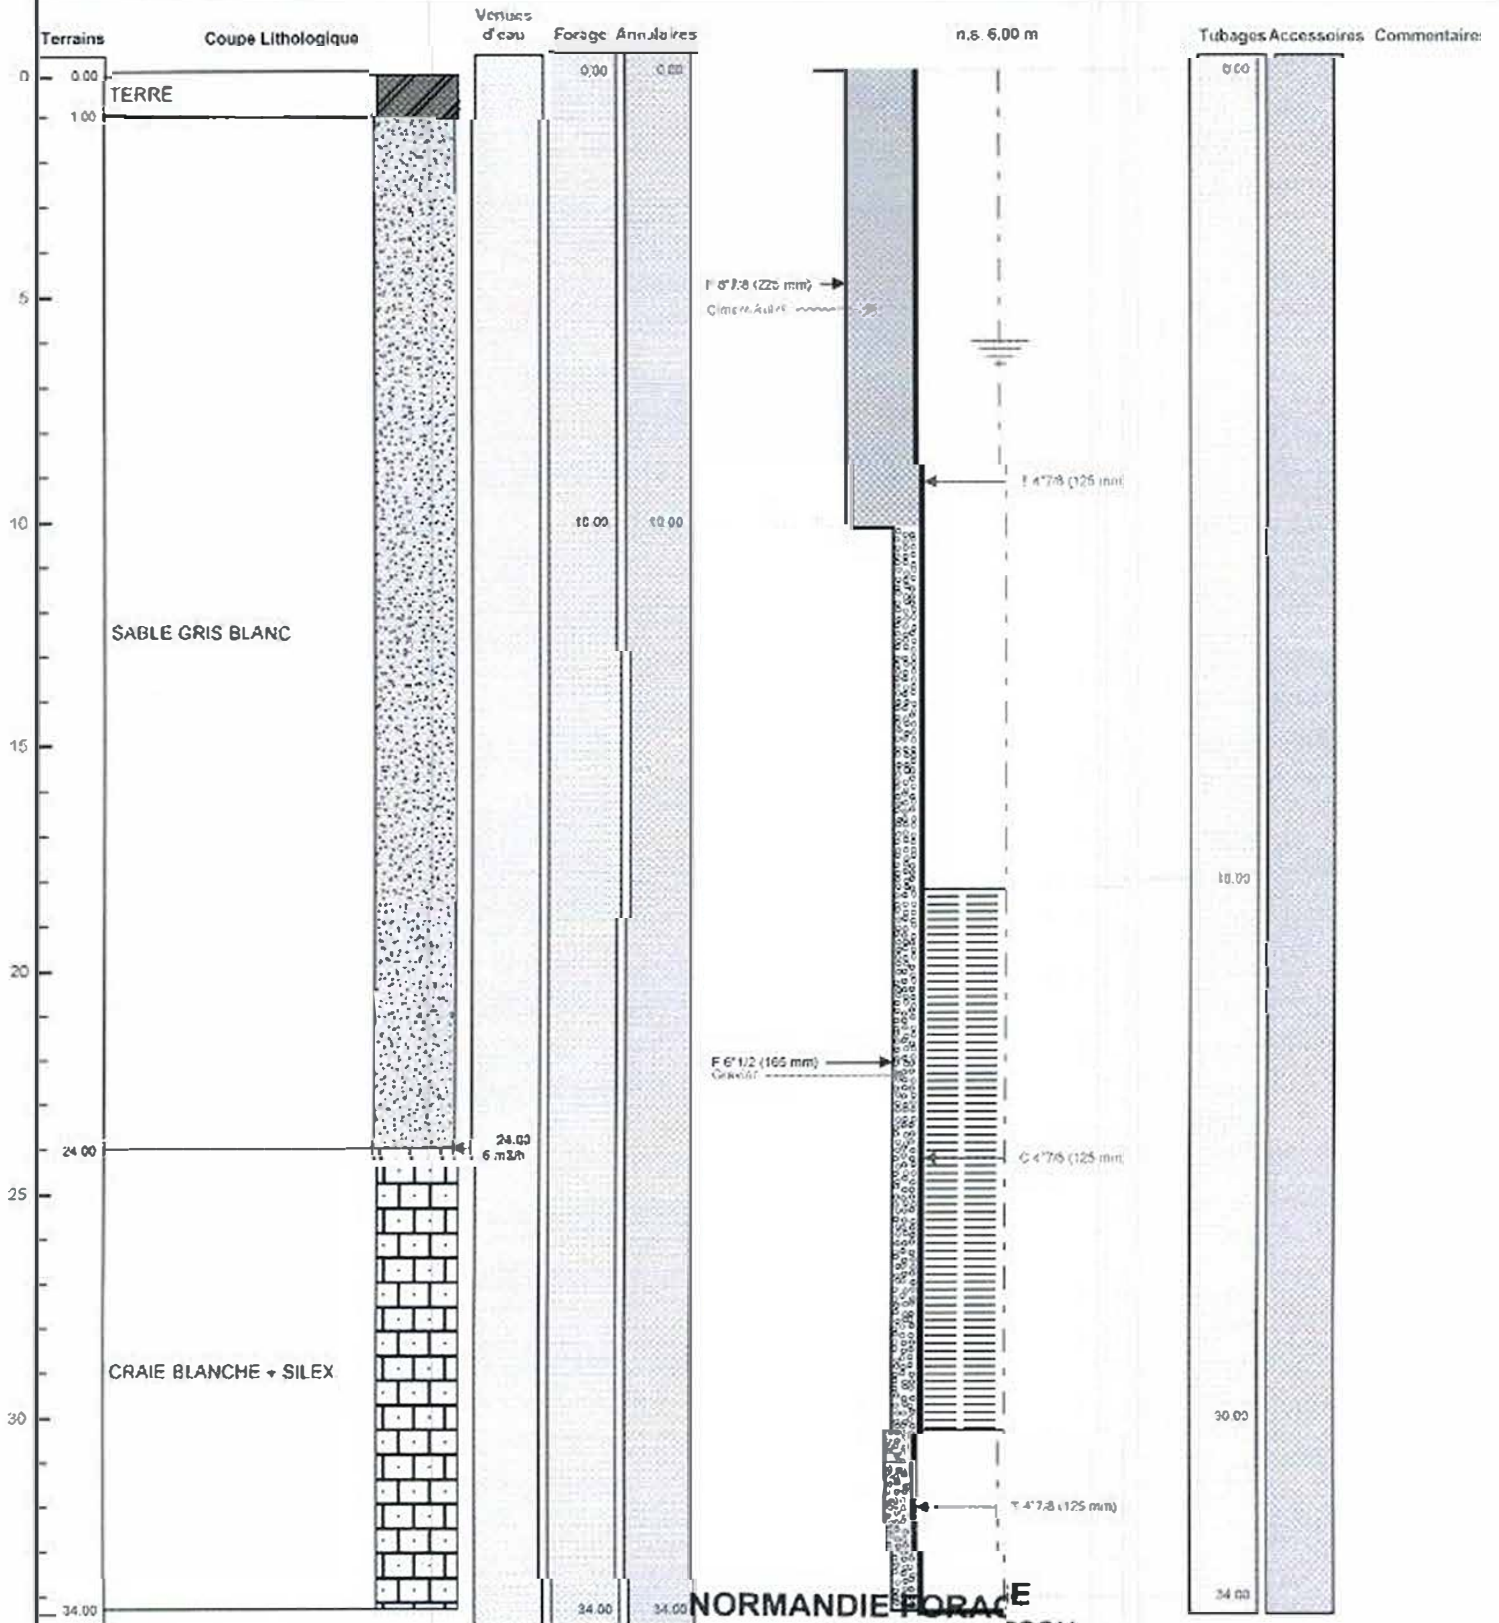

251, rue de l'Odon - 14790 VERNON

Le 21/06/2021 à Vernon Tél. : 02 31 06 10 27 - Port. : 06 15 05 68 74

CERTIFIÉ CONFORME À L'OUVRAGE ET À LA LOI N° 2004-550 du 12 juin 2004

Tampon et signature du chef d'entreprise

N° Siren 420 697 708 00022

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0.000 m

PAGE: 3
