

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	
Client:	
Maitre d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 87718

Police de l'eau * : 2022 00232

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LA CHAPELLE

14130 ST PHILBERT DES CHAMPS

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 126.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/01/2022

Resp. M. Ouvrage : LETELLIER

Date fin de l'ouvrage : 20/01/2022

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 32.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 1.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'œuvre:

Lieu de l'ouvrage :

14130 ST PHILBERT DES CHAMPS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	ARGILE ROUGE A SILEX
3.00	7.00	ARGILE BLANC MARRON CLAIR
7.00	9.00	ARGILE GRIS BLANC
9.00	18.00	SABLE FIN VERT BLANC
18.00	30.00	CALCAIRE FIN BLANC
30.00	42.00	CALCAIRE DUR + CAILLOUX
42.00	50.00	SABLE VERT + CALCAIRE DUR + GLOCONIE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	50.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
36.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	34.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
46.00	50.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cik	Sous pression			
20.00	50.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : du 19/01/2022 au 20/01/2022


Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert 1 carto métrique
 Longitude (X):
 Latitude (Y):
 Altitude sol (Z): +126,000 m

Client :
 Maître d'oeuvre :
 Localisation de l'ouvrage : **LA CHAPELLE**
14130 ST PHILBERT DES CHAMPS

Echelle : 1/251

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

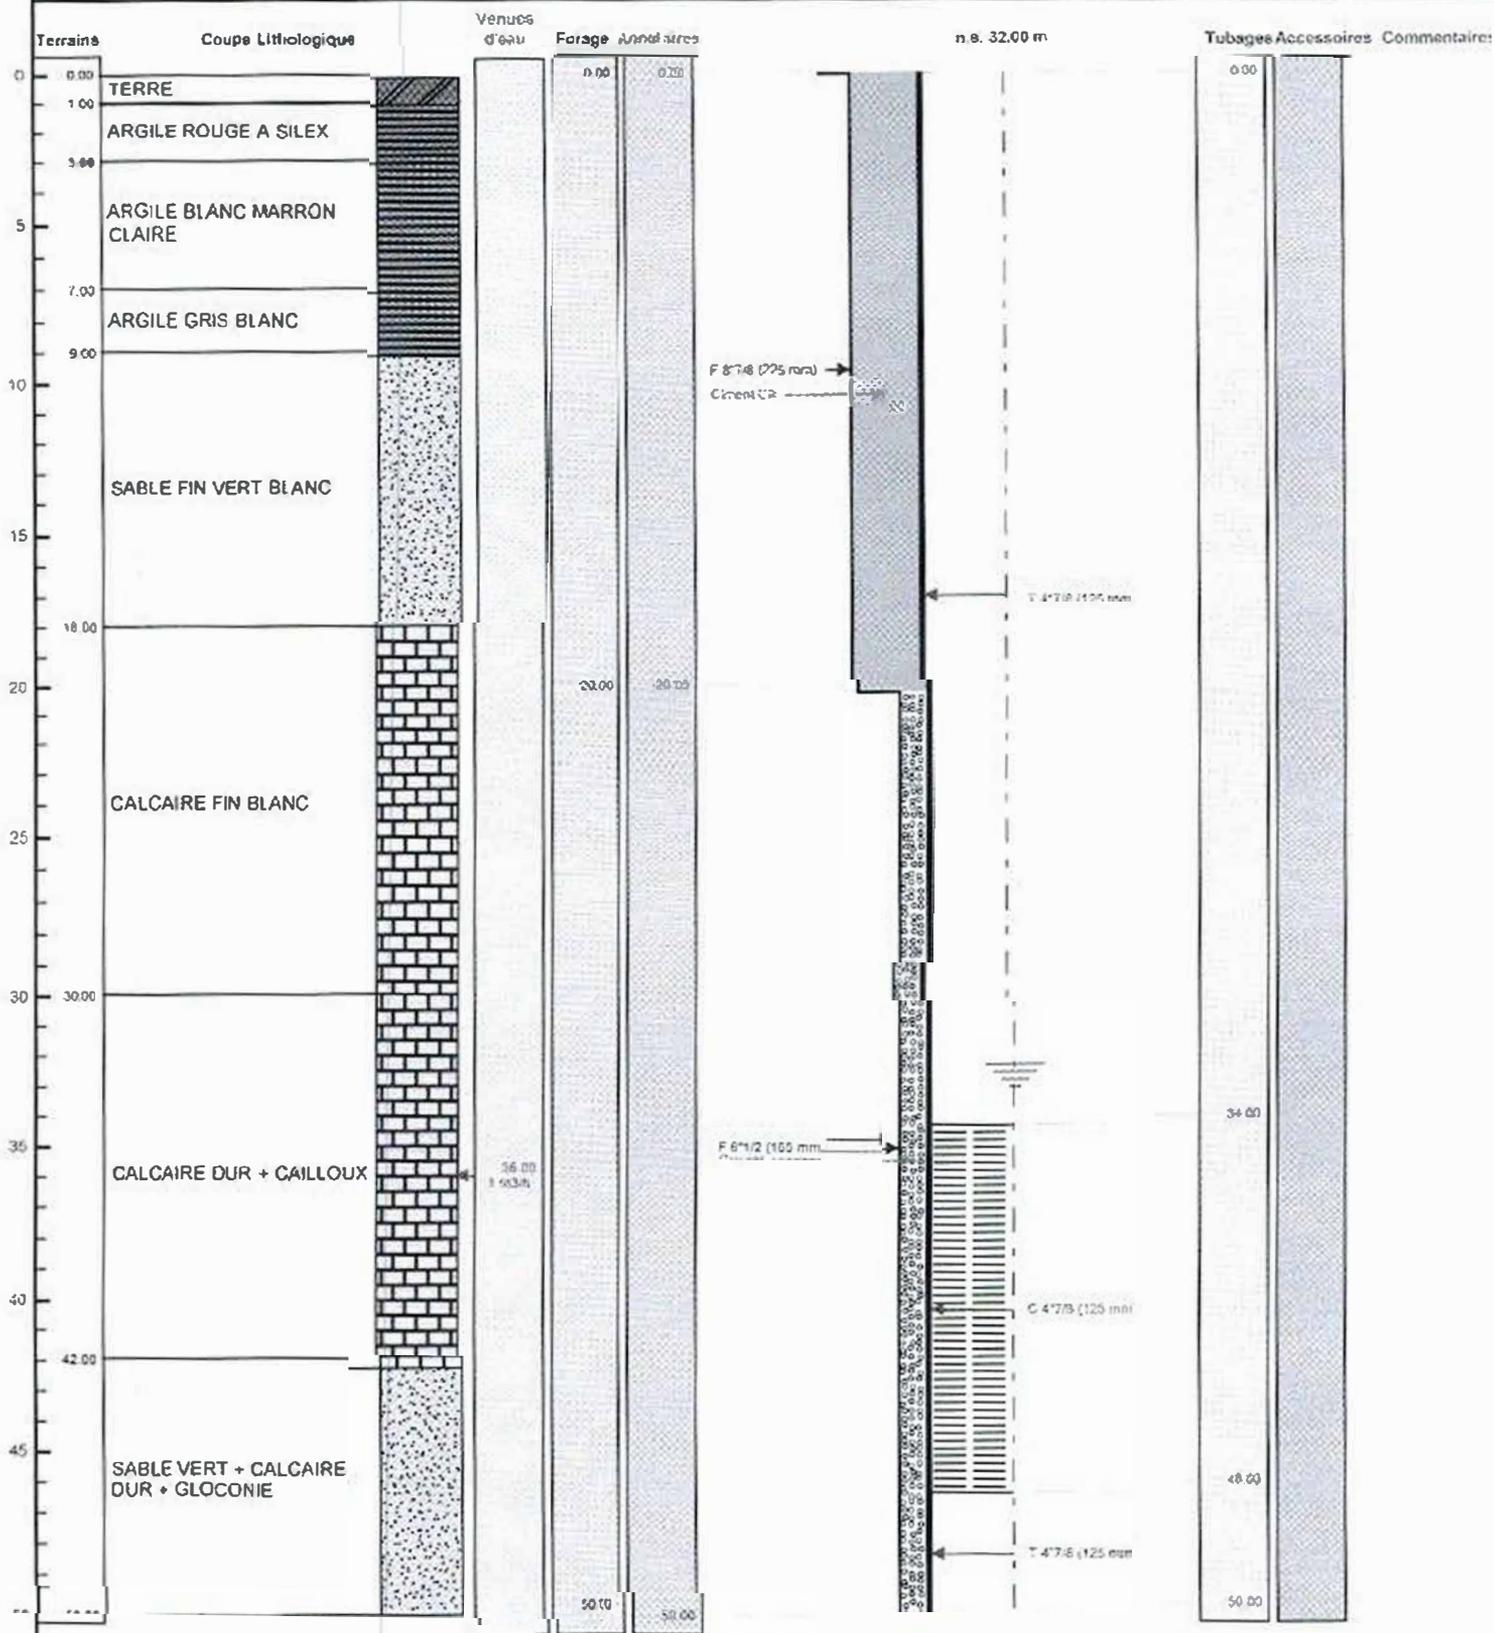

Le 16/01/2022 à 14790 Verson
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef de chantier
NORMANDIE FORAGE
 14790 VERNON
 Tél : 06 15 05 68 74
 @wanadoo.fr
