

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	
Client:	
Maitre d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS : B55004BTTY

N° Déclaration ** : 87721

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LIEU DIT LA CRAPOTIERE

14170 EPANEY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 137.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 25/10/2021 **Resp. M. Ouvrage :** DAGUET

Date fin de l'ouvrage : 25/10/2021 **Resp. M. Oeuvre :** GAUTIER

Machine : ECOFORE **Resp. Chantier :** GODEY

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 35.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 3.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

14170 EPANEY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	26.00	CALCAIRE BLANC
26.00	38.00	CALCAIRE JAUNE
38.00	41.00	CALCAIRE JAUNE DEGRADE + ARGILE MARRON
41.00	47.00	CALCAIRE GRIS + GALLET + ARGILE BLANC GRIS
47.00	49.00	CALCAIRE GRIS + GALLET + SABLE BLANC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
38.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cik	Sous pression			
20.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU


Client :
 Maître d'oeuvre :
 Localisation de l'ouvrage :

Travaux réalisés : 11
 du : 25/10/2021 au : 25/10/2021 1
 Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert 1 carto métrique
 Longitude (X): 0
 Latitude (Y): 0
 Altitude sol (Z): +137.000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages :
1

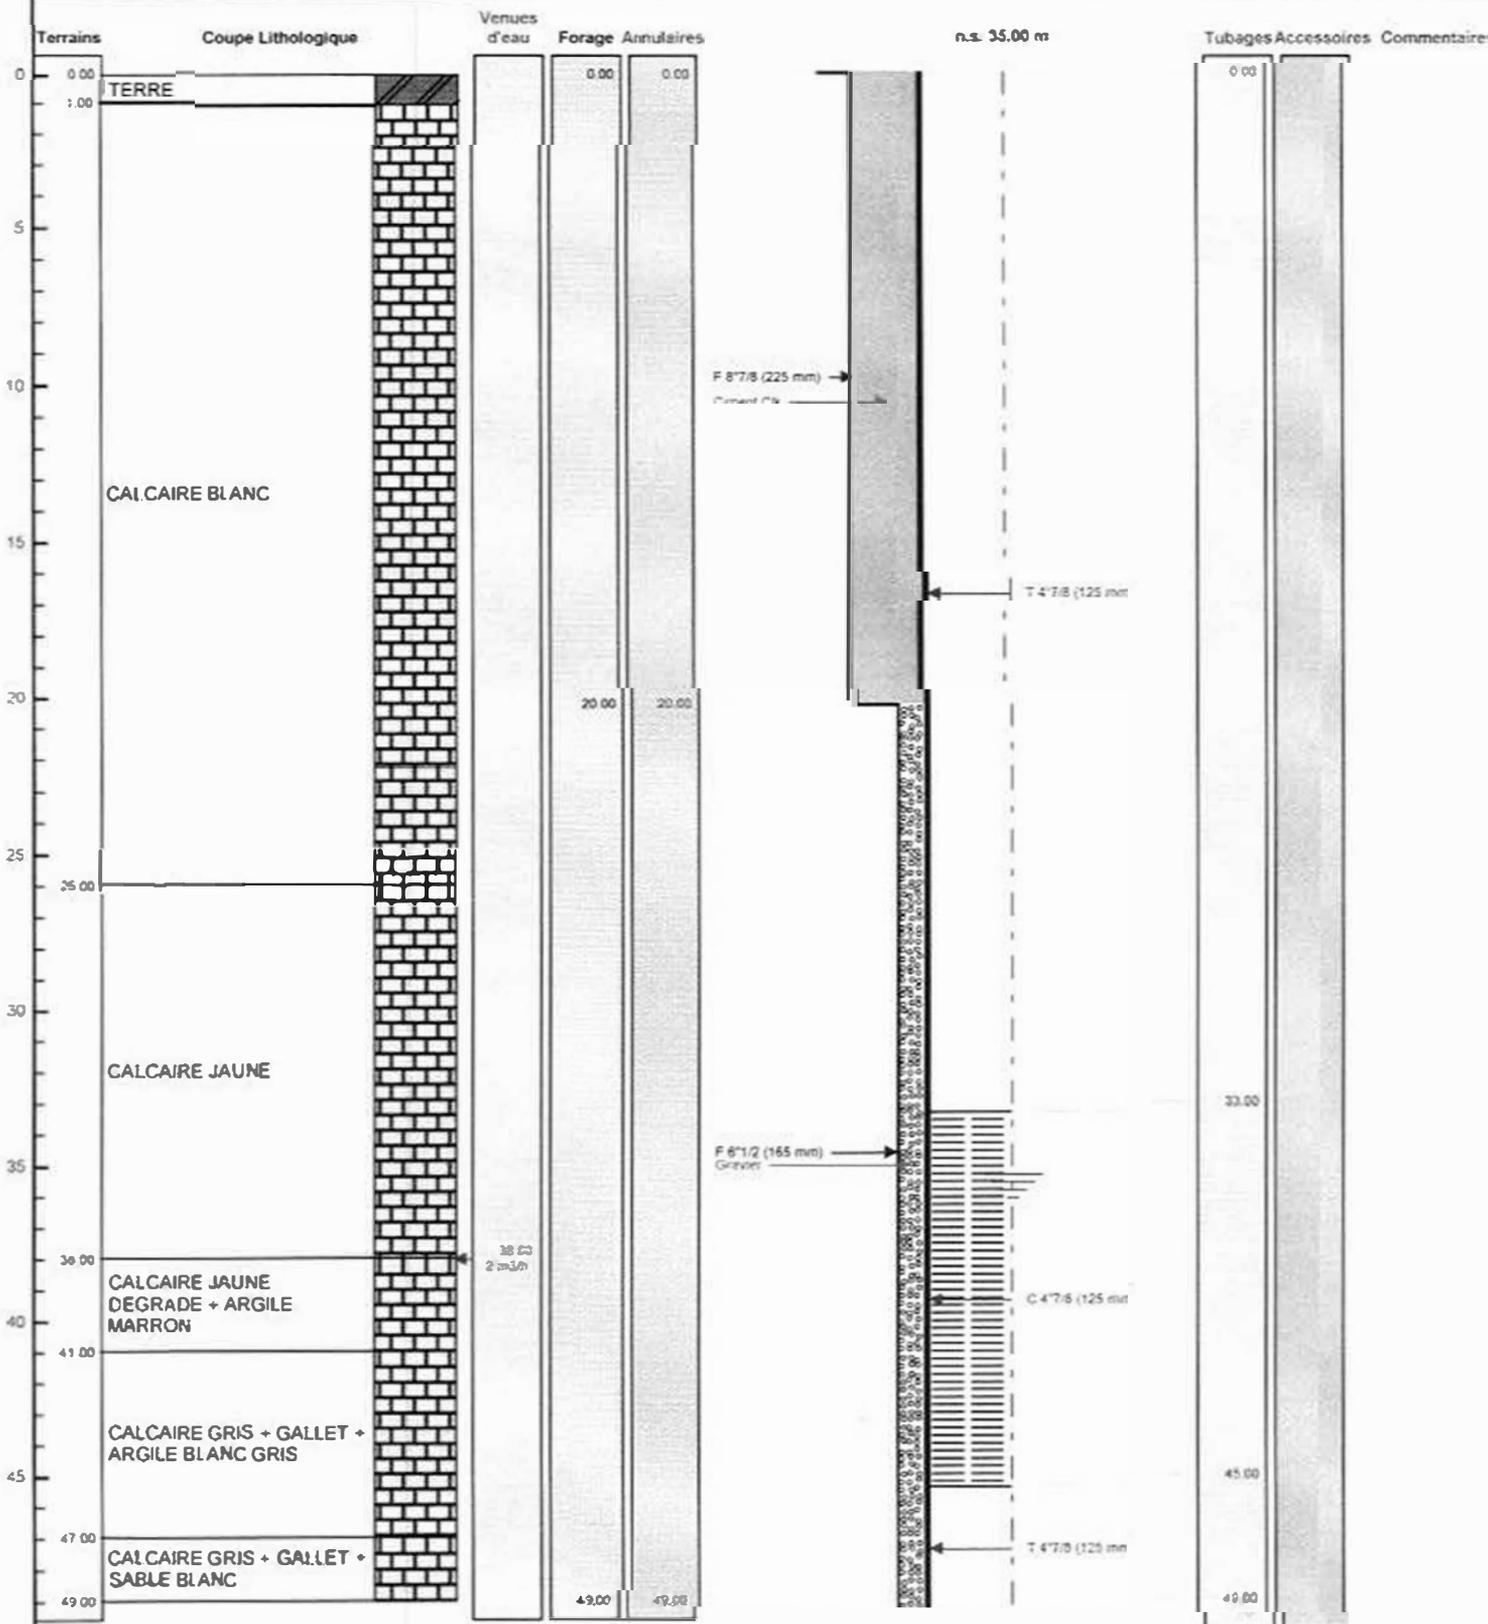

Le 09/11/2021 à 14h00
NORMANDIE FORAGE
 CERTIFIE CONFORME à la norme NF S 44-010
 Tampon et signature du chef de chantier
 4790 VERNON
 Tel : 02 31 68 10 27 Port : 06 15 05 68 74
