

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BOURGEOIS FORAGE
Client:	
Maitre d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 12 RUE SAINT JEAN
51240 CHEPY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/05/2018

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 03/05/2018

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 1.32 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 15.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 1.48 m

Notes : 1 FORAGE DE REJET DE 20 METRES

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.30	TERRE VEGETALE
0.30	3.50	ALLUVIONS
3.50	19.00	CRAIE BLANCHE
19.00	20.00	CRAIE MARNEUSE BLANCHE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	11.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
11.00	20.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
1.00	6.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.10
6.00	8.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
8.00	20.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.24

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
20.00	20.00	Bouchon

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 1/1
du : 03/05/2018 au : 03/05/2018

Client :

Maitre

d'oeuvre

Localisation de l'ouvrage : 12 RUE SAINT JEAN

51240 CHEPY

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/101

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

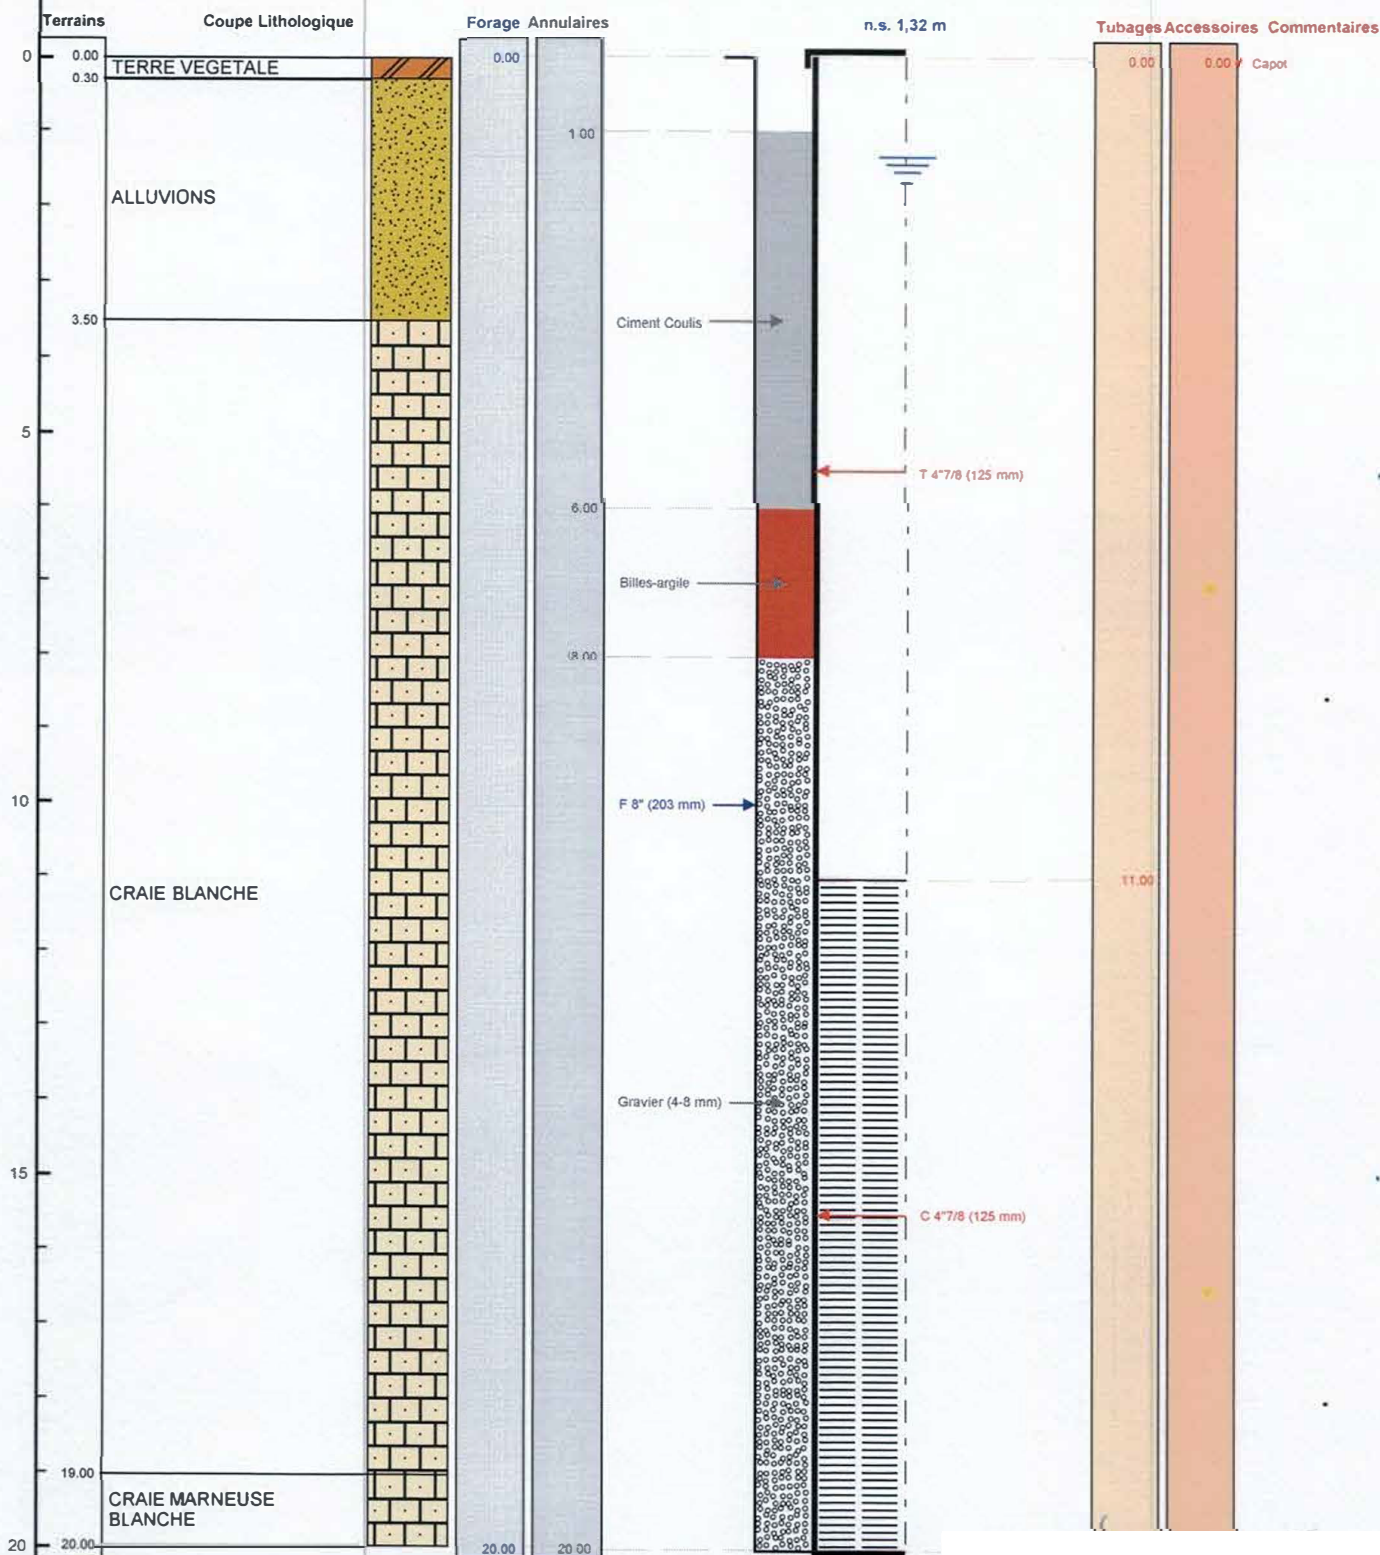

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
