

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: LES FORAGES DU GATINIAS

Client: PARTICULIER

45160 OLIVET

Maître d'oeuvre: LES FORAGES DU GATINIAS

10 ter, rue de Vimory

45200 MONTARGIS

Exploitant:

10 ter, rue de Vimory

45200 MONTARGIS

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Rue Paulin Labarre

45160 OLIVET

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 08/11/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 12/11/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage : 12/11/2021

Niveau statique non perturbé : 14.00 m

Date fin de pompage : 12/11/2021

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Client: | PARTICULIER |
| Maître d'oeuvre: | LES FORAGES DU GATINIAS |
| Lieu de l'ouvrage : | Rue Paulin Labarre |
| | 45160 OLIVET |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.00 | 0.50 | Terre végétale |
| 0.50 | 5.00 | Argile coloris divers |
| 5.00 | 18.00 | Argile et calcaire |
| 18.00 | 30.00 | Calcaire et eau |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 10.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 0.00 | 20.00 | 6"5/8 | 168.00 | 0.00 | | Acier-api | Tube-plein | | |
| 10.00 | 30.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111
du : 08/11/2021 au : 12/11/2021


Client : PARTICULIER
Maitre d'oeuvre : LES FORAGES DU GATINIAS
Localisation de l'ouvrage : Rue Paulin Labarre
45160 OLIVET

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/151

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

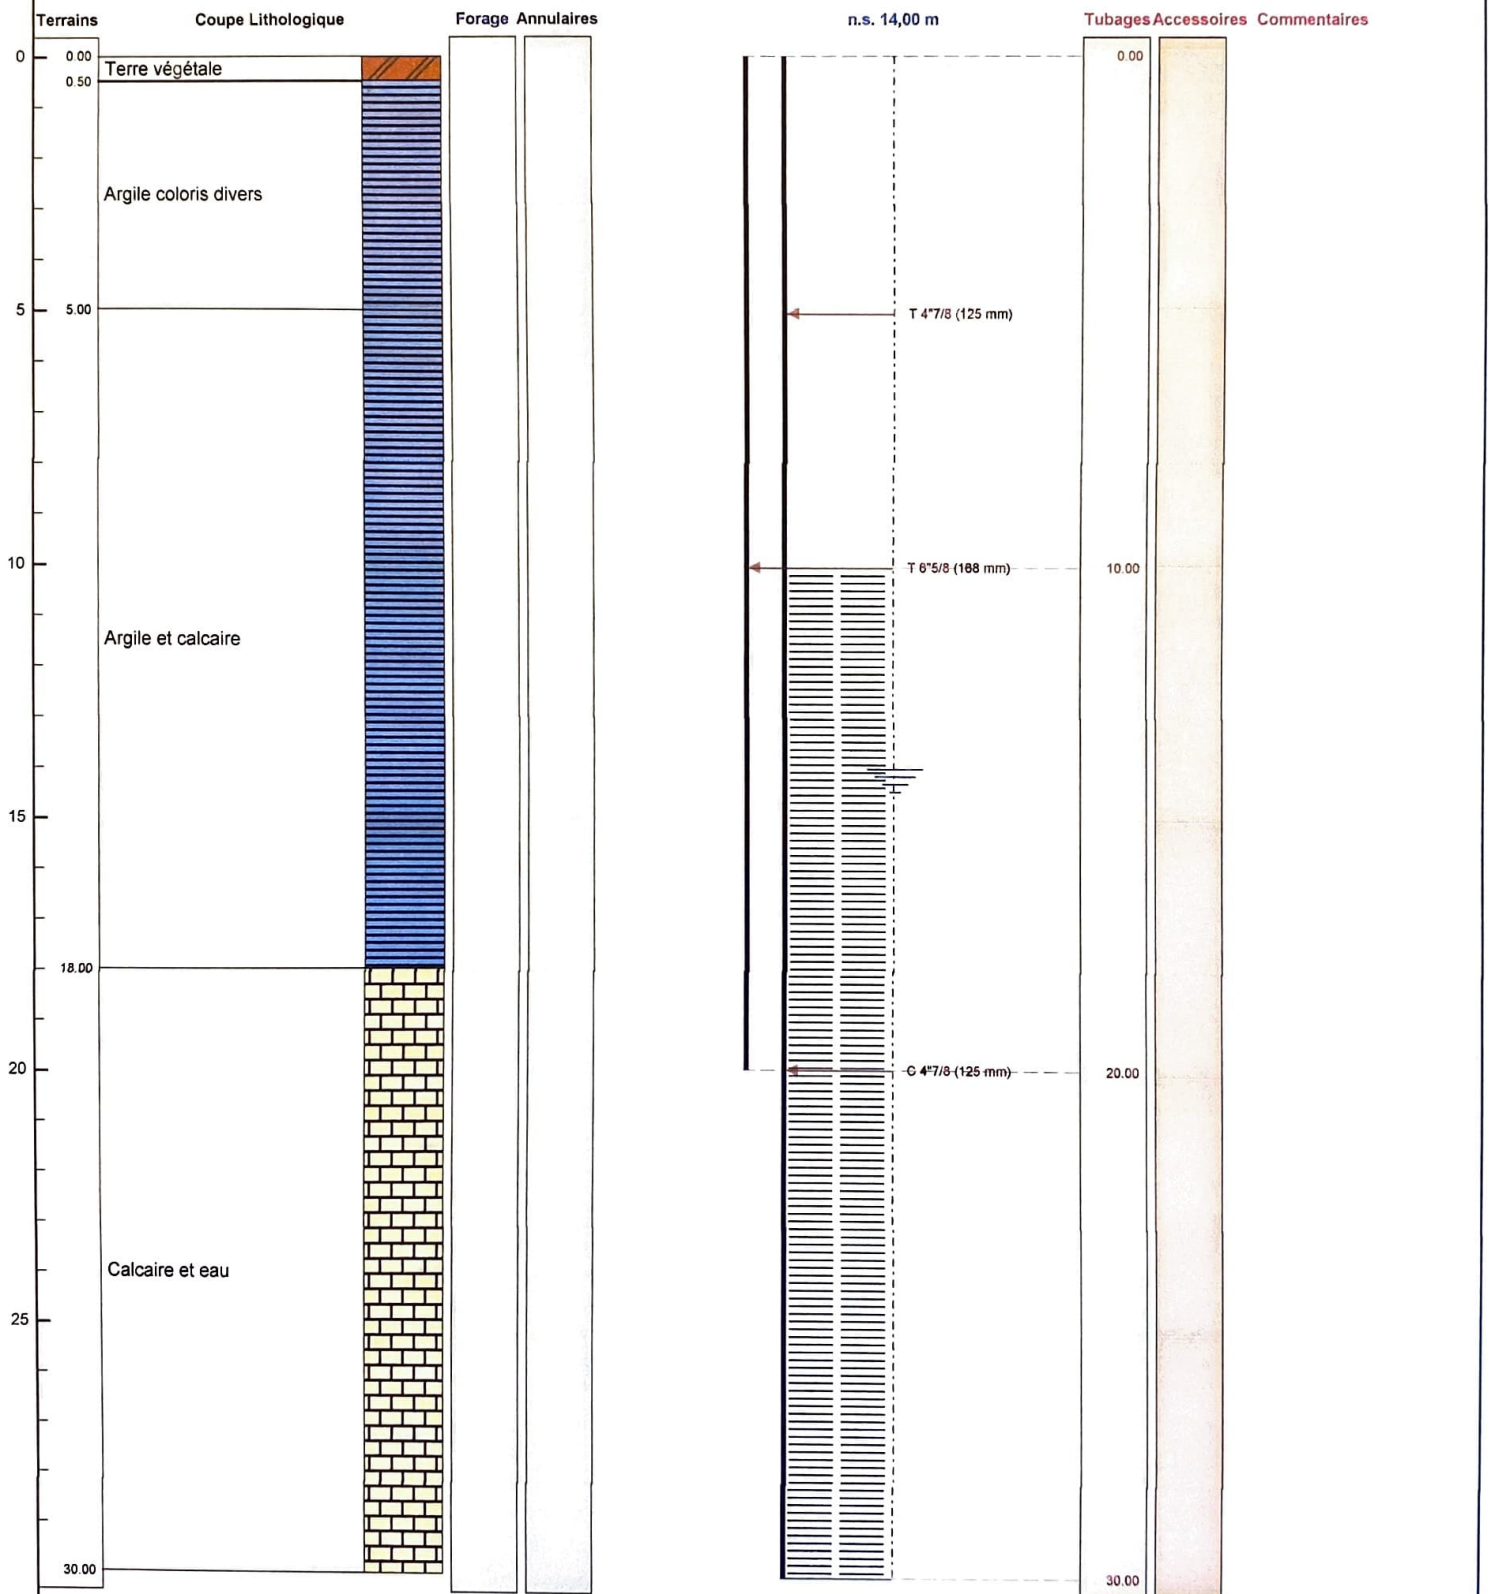

Le à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|-------|----|
| Client: | PARTICULIER | | | | |
| Maître d'oeuvre: | LES FORAGES DU GATINIAS | | | | |
| Lieu de l'ouvrage : | Rue Paulin Labarre | | | | |
| | 45160 OLIVET | | | | |
| Profondeur utile du forage: | 30.00 | m | Niveau repère/sol: | 0.00 | m |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 168 | mm | Niveau statique/sol: | 14.00 | m |
| Type de la pompe: | 4 S R 4/14 | | Puissance de la pompe: | 1 | Kw |
| Diamètre nominal: | 4" | | Diamètre hors tout de la pompe: | 0 | mm |
| Débit maxi de la pompe: | 0.00 | m3/h | Hauteur de refoulement maxi: | 0 | mm |
| Installée à (profondeur): | 29.00 | m | Longueur de refoulement: | 50 | m |

Observations :Date et heure de début de pompage le **12/11/2021** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
| 12/11/2021 | 10:01 | 0h01 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| | 10:05 | 0h05 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| | 10:20 | 0h20 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| | 10:40 | 0h40 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| | 11:00 | 1h00 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| | 11:30 | 1h30 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| | 12:00 | 2h00 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
