

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: **LES FORAGES DU GATINAIS**

Client: **PARTICULIER**  
La Perrière  
18260 VILLEGONON

Maître d'oeuvre: **LES FORAGES DU GATINAIS**  
10 ter, rue de Vimory  
45200 MONTARGIS

Exploitant: **PARTICULIER**  
La Perrière  
18260 VILLEGONON

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La Perrière  
18260 VILLEGONON

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/08/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 18/08/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage : 17/08/2023

Niveau statique non perturbé : 21.90 m

Date fin de pompage : 17/08/2023

Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

<b>Client:</b>	<b>PARTICULIER</b>
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>LES FORAGES DU GATINAIS</b>
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>La Perrière</b>
	<b>18260 VILLEGON</b>

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale
0.50	26.00	Marne, craie + passage de particules de calcaire
26.00	41.00	Calcaire gris + passage d'argile + eau

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	6.00	6"5/8	168.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	25.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
25.00	41.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.50	3.50	6"5/8	168.00	Ciment	Ciment-bentonite	Autre			
3.50	4.50	6"5/8	168.00	Billes-argile	Oregonite				
4.50	41.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU


Client : **PARTICULIER**  
 Maître d'oeuvre : **LES FORAGES DU GATINAIS**  
 Localisation de l'ouvrage : **La Perrière**  
**18260 VILLEGENON**

Travaux réalisés : **111**  
 du : 10/08/2023 au : 18/08/2023  
 Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): **0**  
 Latitude (Y): **0**  
 Altitude sol (Z): **+0,000 m**

Echelle : 1/206

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

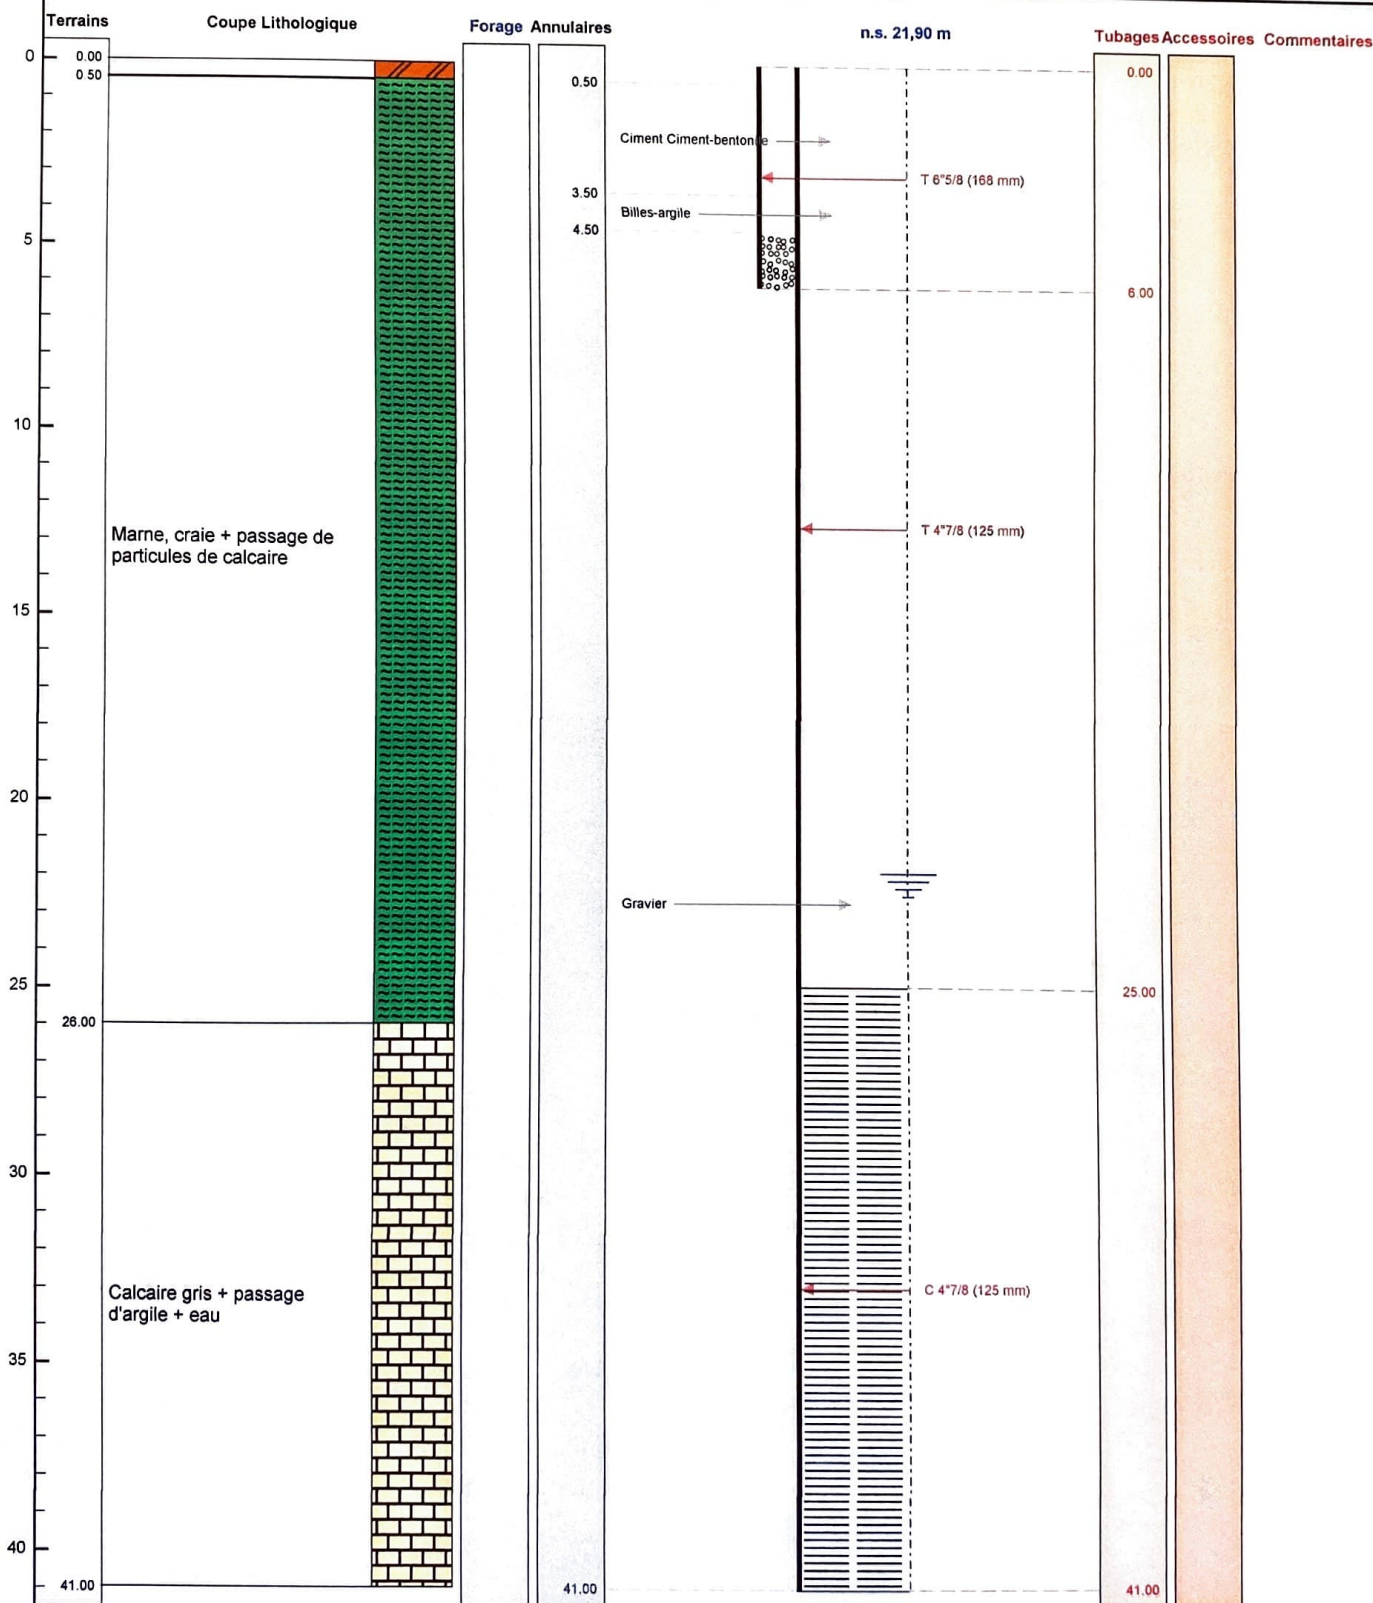

Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise
