

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Entreprise: | NORMANDIE FORAGE . |
| Client: | |
| Maître d'oeuvre: | |
| Exploitant: | |

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 692615

Police de l'eau * : 231123-162512-021-02

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : ZAC DE LA DEMI LUNE
95420 MAGNY EN VEXIN

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 101.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 16/05/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 17/05/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 22.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 1.30 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

| | |
|----------------------------|--|
| Client: | |
| Maître d'oeuvre: | |
| Lieu de l'ouvrage : | |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|------|-------|------------------------------|
| 0.00 | 1.00 | TERRE |
| 1.00 | 3.00 | ARGILE A SILEX MARRON CLAIRE |
| 3.00 | 45.00 | CRAIE BLANCHE A SILEX |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 10.00 | 8"7/8 | 225.00 | M.f.t. | Air |
| 10.00 | 45.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 35.00 | 2.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 29.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 29.00 | 41.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | 50 |
| 41.00 | 45.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Clk | Sous pression | | | |

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111
du : 16/05/2024 au : 17/05/2024


Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrage :

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +101,000 m

Echelle : 1/226

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

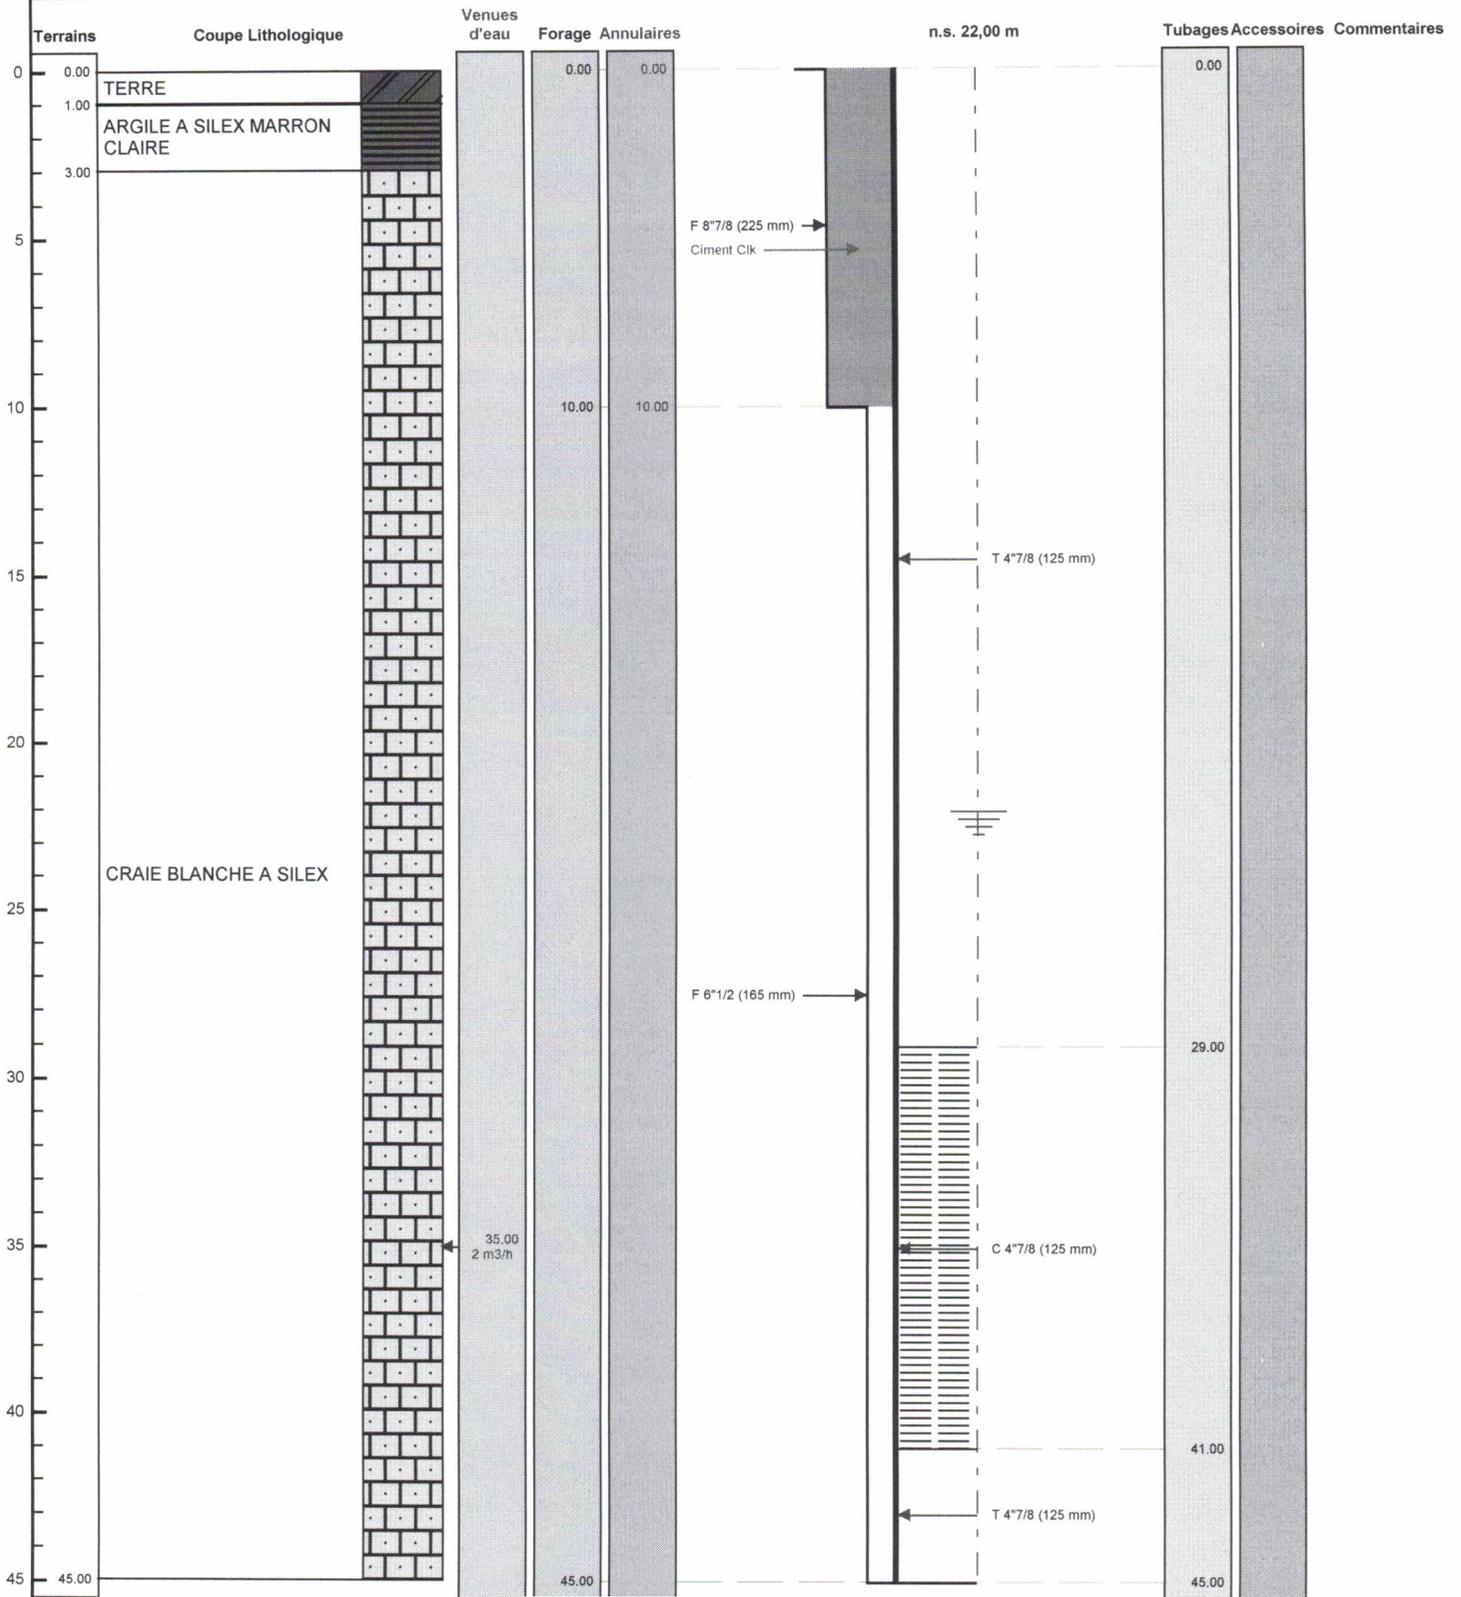

Le 17.05.2024 à
CERTIFIE CONFORME A
Tampon et signature du ch

Lambert 1 carto mét

t.: +101,000 m

PAGE: 3
