


RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry	
Date :	07/11/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Condé les Autry : PZ 3	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	08/11/2006	Niveau statique :	1,66					
Heure déb :		Hauteur du repère :	0,63					
Heure fin :		Refoulement :	100m					
Distance piézomètre :		Niveau statique piézo :						
Descente				Remontée				
Temps		ND	Débit	Piézo	Temps		Forage	Piézo
1mn					1mn			
1mn30		4,550			1mn30			
2mn		3,940			2mn			
2mn30		3,840			2mn30			
3mn		4,120			3mn			
3mn30					3mn30			
4mn		4,620			4mn			
4mn30		4,740			4mn30			
5mn					5mn			
6mn		4,745	2,467		6mn			
7mn		4,700			7mn			
8mn		4,690			8mn			
9mn		4,590	2,319		9mn			
10mn		4,510			10mn			
12mn		4,600	2,390		12mn			
14mn		4,700			14mn			
16mn		4,840	2,460		16mn			
18mn		4,830			18mn			
20mn		4,700			20mn			
25mn		4,710	2,424		25mn			
30mn		4,840			30mn			
45mn		5,230	2,325		45mn			
1h		5,130	2,254		1h			
1h30		4,830	2,089		1h30			
2h		4,900	1,938		2h			
3h		5,000	1,893		3h			
4h		4,990	1,862		4h			

Pompage de 4h00 sur PZ3 le 08/11/2006

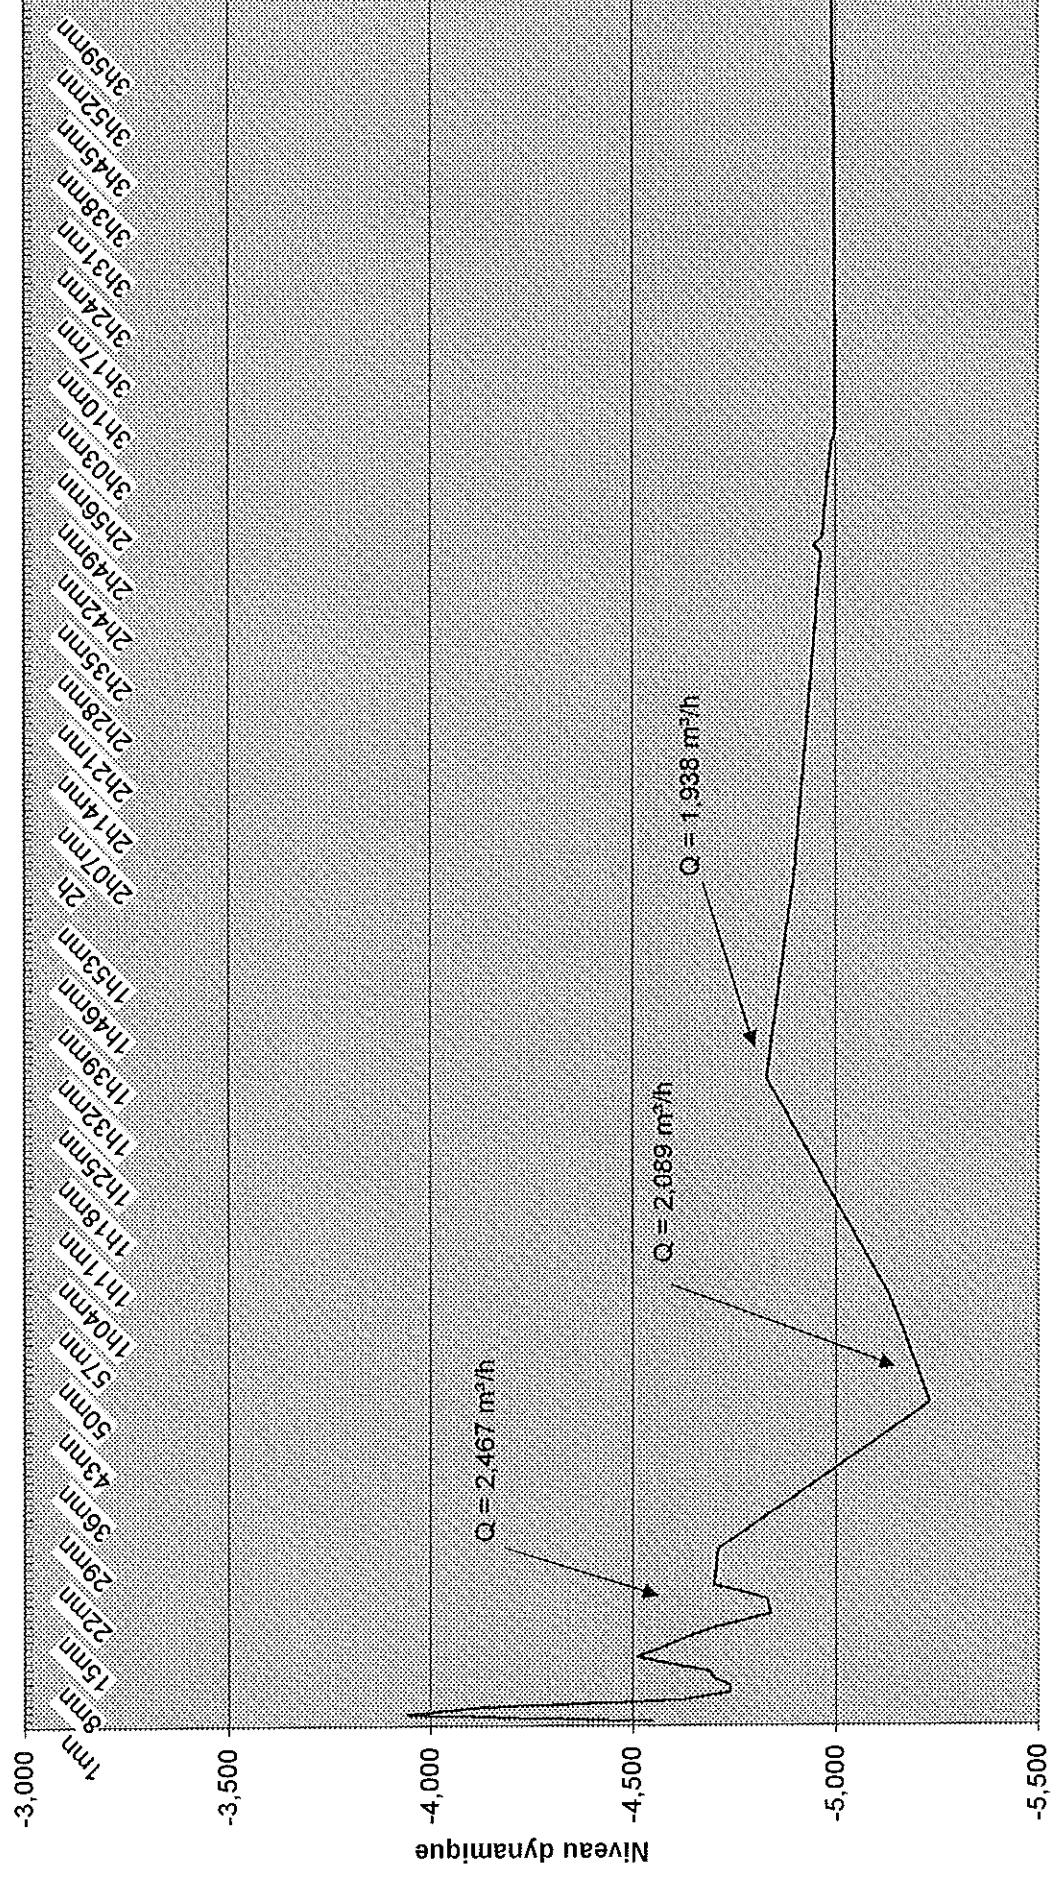

Temps
