

Indice: 01604X1015

Désignation: 3

Commune: NEUFOR(LE) (55)

Date fin de travaux: 01/03/1974

Lieu-dit: STATION DE POMPAGE DE MAISON-DIEU

Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

Nature : FORAGE

Pompage d'essai PLD 21/02/1974

X : 792,935 km

Débit spécifique :

4,26 m²/h

Y : 161,94 km

Piézométrie indicative (25/01/1974)

Transmissivité :


0,0027 m²/s

Z : 154 m (coupe : 154 m)

Profondeur d'eau : 3,3 m/sol

Perméabilité :

m/s

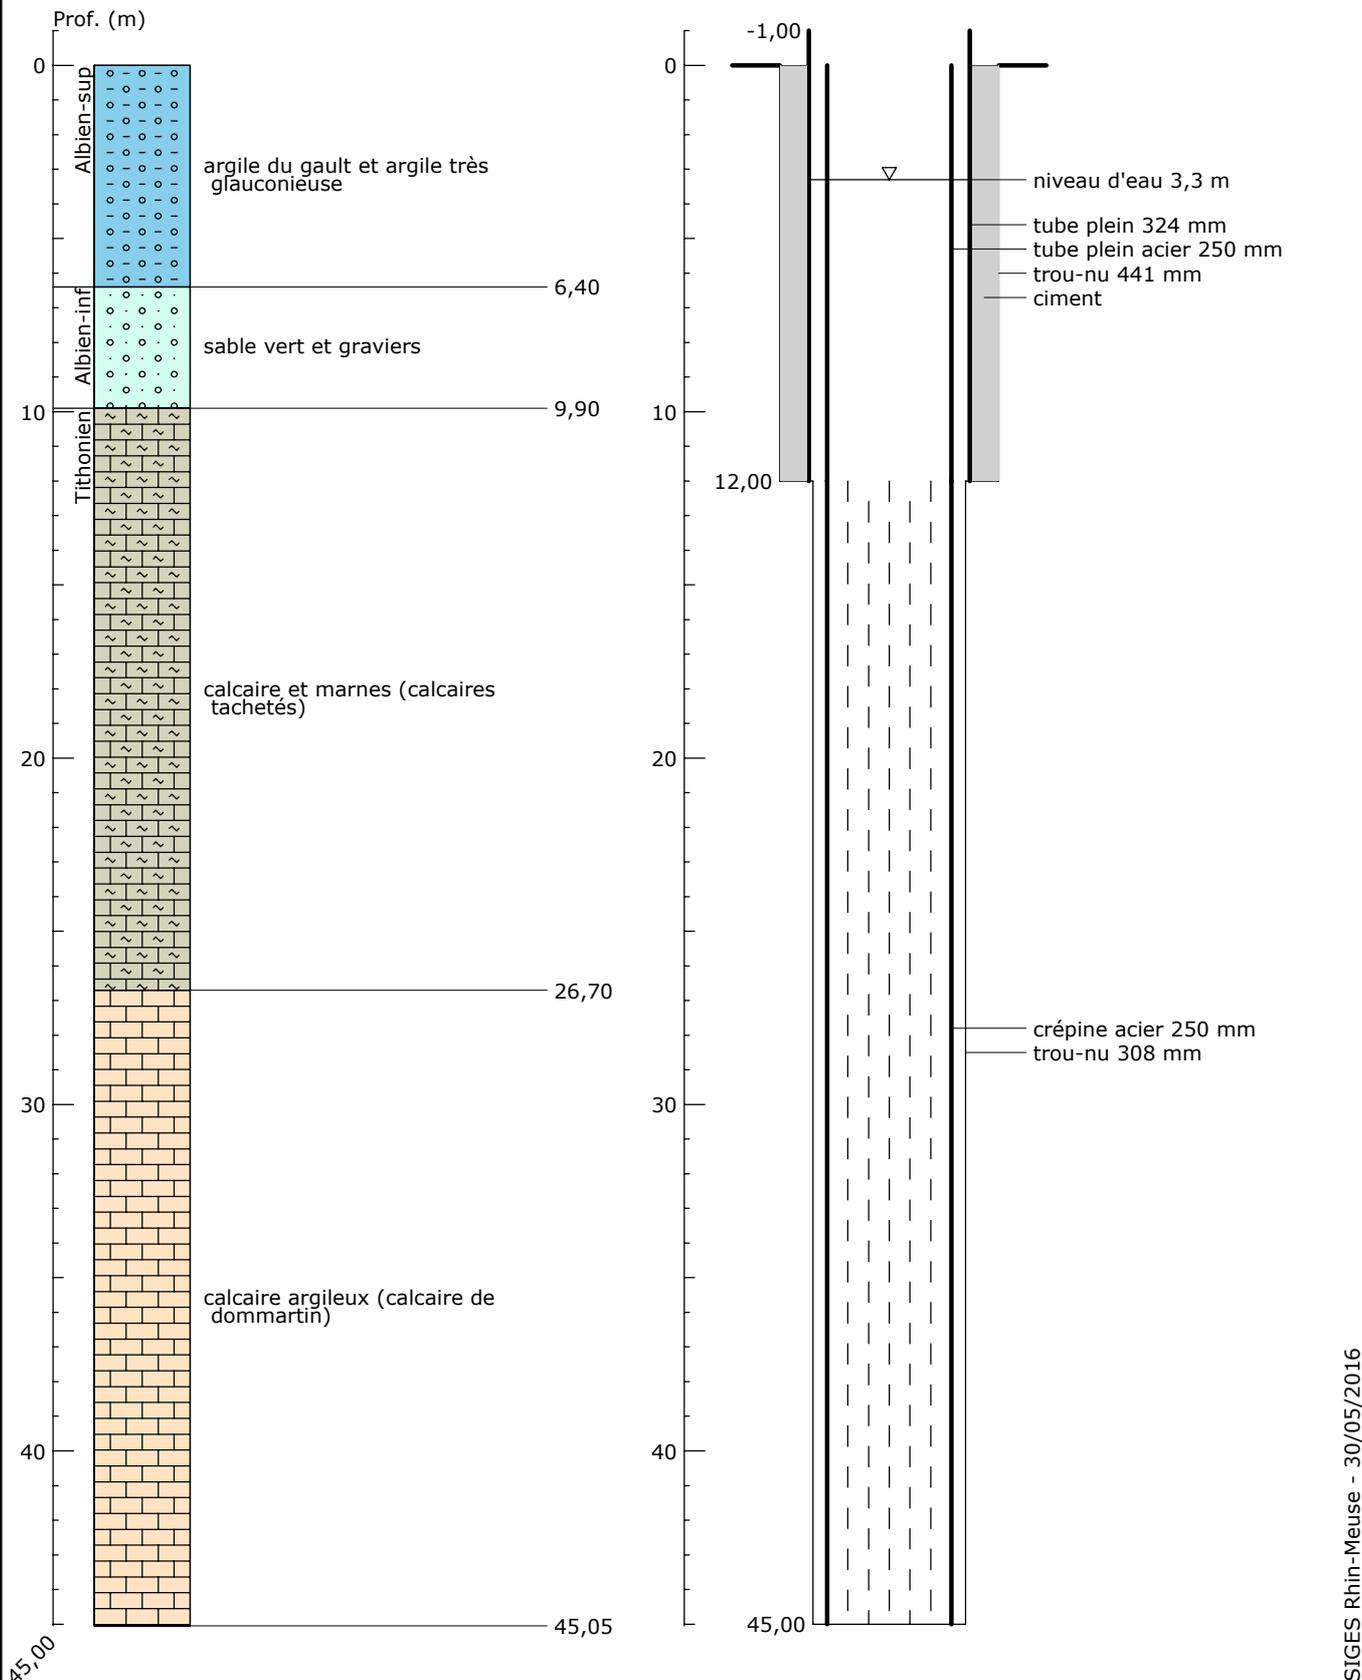

SIGES Rhin-Meuse - 30/05/2016

