

CHARTRE QUALITE

PUITS ET FORAGES D'EAU

FORAGE D'EXPLOITATION F13

Entreprise: EURO FORAGE
Client: SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO
Maître d'oeuvre:

Lieu du forage Site de Pont-Cariou
22290 LANLEFF

Coordonnées GPS: Latitude Longitude Altitude m

Date début du forage 07/11/2001

Date fin du forage 27/11/2001 Machine D12

Date début pompage Niveau statique m

Débit maxi. d'essai m3/h

Date fin de pompage Rabatement correspondant 0,00 m

Notes - PROF. : 90 m

AVANCEMENT DES TRAVAUX

FORAGE D'EXPLOITATION F13

Client: SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO

Maître d'oeuvre:

Du	Au	Travaux réalisés
07/11/2001		: - Mise en station - Remonter busage PVC Diam 115/125
08/11/2001		: - Foration ROTARY Diam 17"1/2 de 0 à 5 m
12/11/2001		: - Busage acier Diam 406
13/11/2001	14/11/2001	: - Foration MFT 15"
15/11/2001	16/11/2001	: - Busage Diam 323 de 0 à 20 m - Cimentation 1,5 T - Remonter busage acier Diam 406 - Complément cimentation 1 T
19/11/2001		: - Foration MFT 10" de 20 à 52 m
20/11/2001	27/11/2001	: - Foration MFT 10" de 52 à 90 m - Busage PVC 178/195 de 0 à 90 m

PHASES du FORAGE

FORAGE D'EXPLOITATION F13

Cliant:	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO
Maître d'oeuvre:	
Lieu du forage:	Site de Pont-Cariou
	22290 LANLEFF

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	3,00	Alluvion
3,00	90,00	Volcanites avec des passages fracturés

FORAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Mode de forage	Fluide de forage
0,00	5,00	17"1/2	444,00	Rotary	Eau
5,00	20,00	15"	381,00	MFT	Air
20,00	90,00	10"	254,00	MFT	Air

TUBAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0,00	5,00	16"	406,00			Acier provisoire	Tube plein		
0,00	20,00	12"3/4	323,00	4,00		Acier	Tube plein		
0,00	27,30	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
27,30	38,70	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11
38,70	44,40	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
44,40	61,50	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11
61,50	67,20	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
67,20	72,90	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11
72,90	78,60	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		
78,60	84,30	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Crépine fendue	2,00	11
84,30	90,00	7"5/8	195,00	8,50	6	PVC	Tube plein		

CIMENTATION

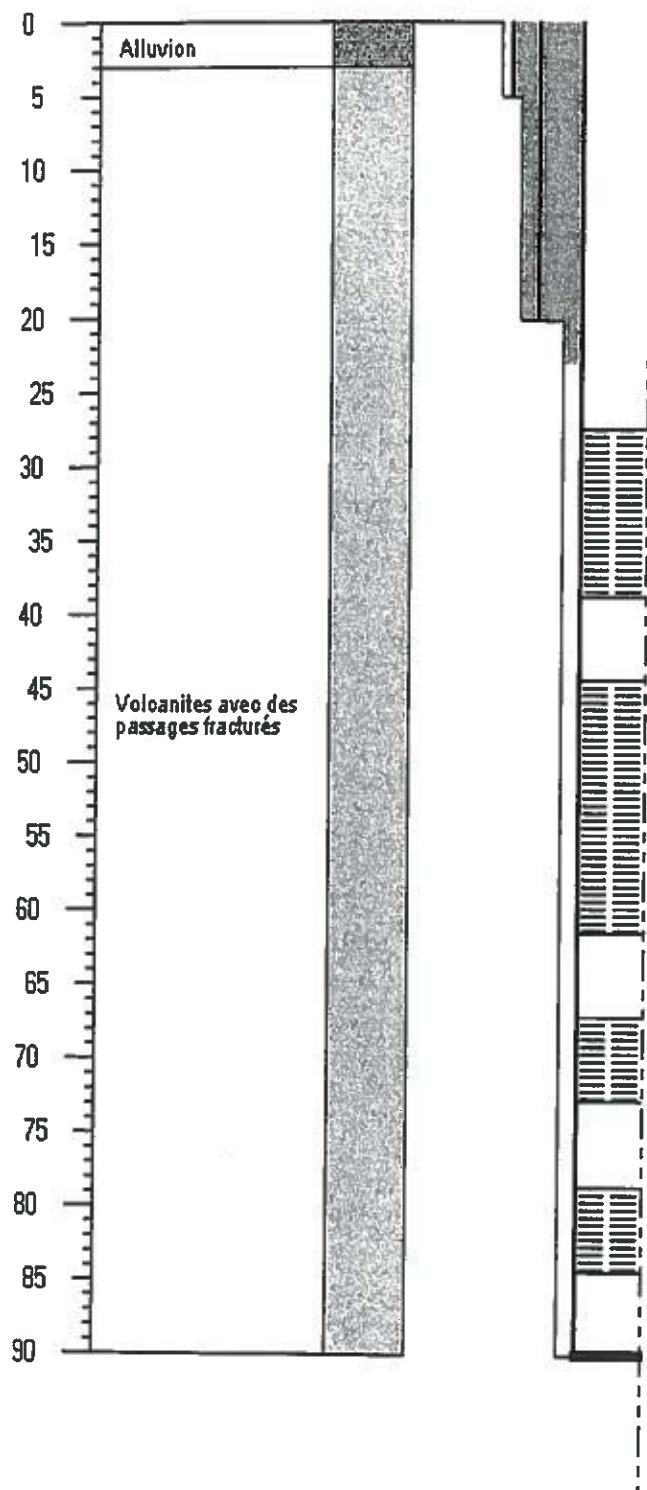
De	à	Ø "	Ø mm	Nature du ciment	Méthode de pose	Vol. m3
0,00	20,00	12"3/4	323,00	CPJ 45	Gravitaire	1,82
0,00	23,00	7"5/8	195,00	CPJ 45	Sur packer	1,20

FORAGE D'EXPLOITATION F13

Client :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOELO

Maitre d'oeuvre :

Travaux réalisés

du : 07/11/2001

au : 27/11/2001

Développement
et pompages

du :

au :

DébitFinal : 50 m³/h

Rabatt: m

A Louvain-la-Neuve
Le 24.01.02

Certifié conforme

EURO FORAGE

SARL au capital de 150.000 Frs

ZA Route de Mons

53210 LOUVAIN

Tél. 02 43 26 17 01
R.C.S. LAVAL B 388 174 864
