


01327X0145

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE



5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR POSE DE PIEZOMETRE DE CONTRÔLE DE NAPPE

à
Val de Vesle

Affaire suivie par :

Monsieur BEHAGUE, AMODIAG

TRAVAUX REALISES
LE
6 Janvier 2015

01327X0145

DÉCLARATION DE SONDAGE, OUVRAGE SOUTERRAIN OU TRAVAIL DE FOUILLE SI PROFONDEUR SUPÉRIEURE A 10 MÈTRES

(Article 131 du Code Minier)

Imprimé à renvoyer dûment complété à la :

DREAL Champagne-Ardenne Services risques et sécurité

40 boulevard Anatole France - 51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

- 15 jours avant le début des travaux pour les ouvrages ne dépassant 50 m de profondeur
- 60 jours avant le début des travaux pour les ouvrages devant dépasser 50 m de profondeur

Réservé à l'administration

245/81/14

MAÎTRE D'OUVRAGE ⁽¹⁾ Nom, Prénom (ou raison sociale) : Nicolas de Val de Veste
 Adresse : 16 rue Général de Gaulle - 51360 Val de Veste
 Tél. : 03 26 23 91 18

MAÎTRE D'OEUVRE ⁽²⁾ Nom, Prénom (ou raison sociale) : AMODIAG Environnement
 Adresse : 9 av. Marc Lefrancq - 51121 PRONVY
 Tél. : 03 27 20 11 82

ENTREPRENEUR ⁽³⁾ Nom, Prénom (ou raison sociale) : BONIFACE SARL
 Adresse : 5 rue Pierre Baileau - 51120 WITRY LES RAINS
 Tél. : 03 26 37 11 61

Nature puits - forage ⁽⁴⁾ : Nombre : 1

Objet ⁽⁵⁾ : - forage de recherche ☐ Indiquer la substance :
 - forage d'exploitation ☐ Indiquer la substance :
 - forage de reconnaissance ☐ Indiquer la nature (sol, fondations, autres) :
 - piézomètre ☒
 - arrosage ☐
 - irrigation ☐
 - eau potable ☐
 - eau industrielle ☐ Préciser :
 - rabattement ☐
 - climatisation ☐
 - autres ☐ Préciser :

- date d'envoi de la déclaration ⁽⁶⁾ en Préfecture ⁽⁷⁾ :

Profondeur prévue de l'ouvrage : 20 m

TRAVAUX Emplacement : commune (département) : Val de Veste (51)
 Rue et n° (ou lieu-dit) : Château Jean
 Référence cadastrale (section et parcelle) :
 Date de début des travaux : Dec 14 / Jan 15 Durée probable : 1 jour
 (Joindre un extrait de carte à 1/25000 avec localisation du projet)
 - date d'envoi de la déclaration ⁽⁶⁾ pour la rubrique 1.1.1.0 en Préfecture ⁽⁷⁾ :

FORAGE D'EAU S'il s'agit d'un ouvrage de prélèvement d'eau, indiquer :
 - le nom de la nappe dans laquelle le prélèvement va être effectué : Craie
 - le débit annuel escompté sur la base des données disponibles : 2 m³/an
 - date d'envoi de la déclaration ⁽⁶⁾ en Préfecture ⁽⁷⁾ :
 (si débit est > à 10 000 m³/an et < 200 000 m³/an)
 - date d'envoi de la demande d'autorisation ⁽⁶⁾ en Préfecture ⁽⁸⁾ :
 (si le débit est ≥ à 200 000 m³/an)
AUTRES RUBRIQUES ⁽⁹⁾ : - date d'envoi de la déclaration ou autorisation ⁽⁶⁾ en Préfecture ⁽⁷⁾ :
 - rubriques concernées :
 - date de déclaration en mairie pour les forages domestiques (< 1000 m³/an) :

DIVERS Le déclarant est ⁽⁴⁾ : Maître d'œuvre - Maître d'ouvrage - Entrepreneur

Date et signature

02-12-2014

(1) Propriétaire de l'ouvrage.

(2) Personne ou société qui fait réaliser les travaux.

(3) Personne ou société qui réalise les travaux.

(4) Rayer la mention inutile ou compléter le cas échéant.

(5) Cocher la case correspondante et compléter éventuellement

(6) Au titre de l'article L214-1 à L214-6 (ancienne loi sur l'eau du 3 janvier 1992) et de ses décrets d'application n° 93-742 et n° 93-743

(7) Les déclarations doivent être adressées au Préfet un mois avant le début des travaux.


(8) La demande d'autorisation nécessite un délai d'instruction de 6 à 8 mois.

(9) Décret n° 93-743 du 29 mars 2003 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du

03/01/1992

N.B. : Une déclaration détaillée pourra vous être demandée sur ces travaux

01327X0145

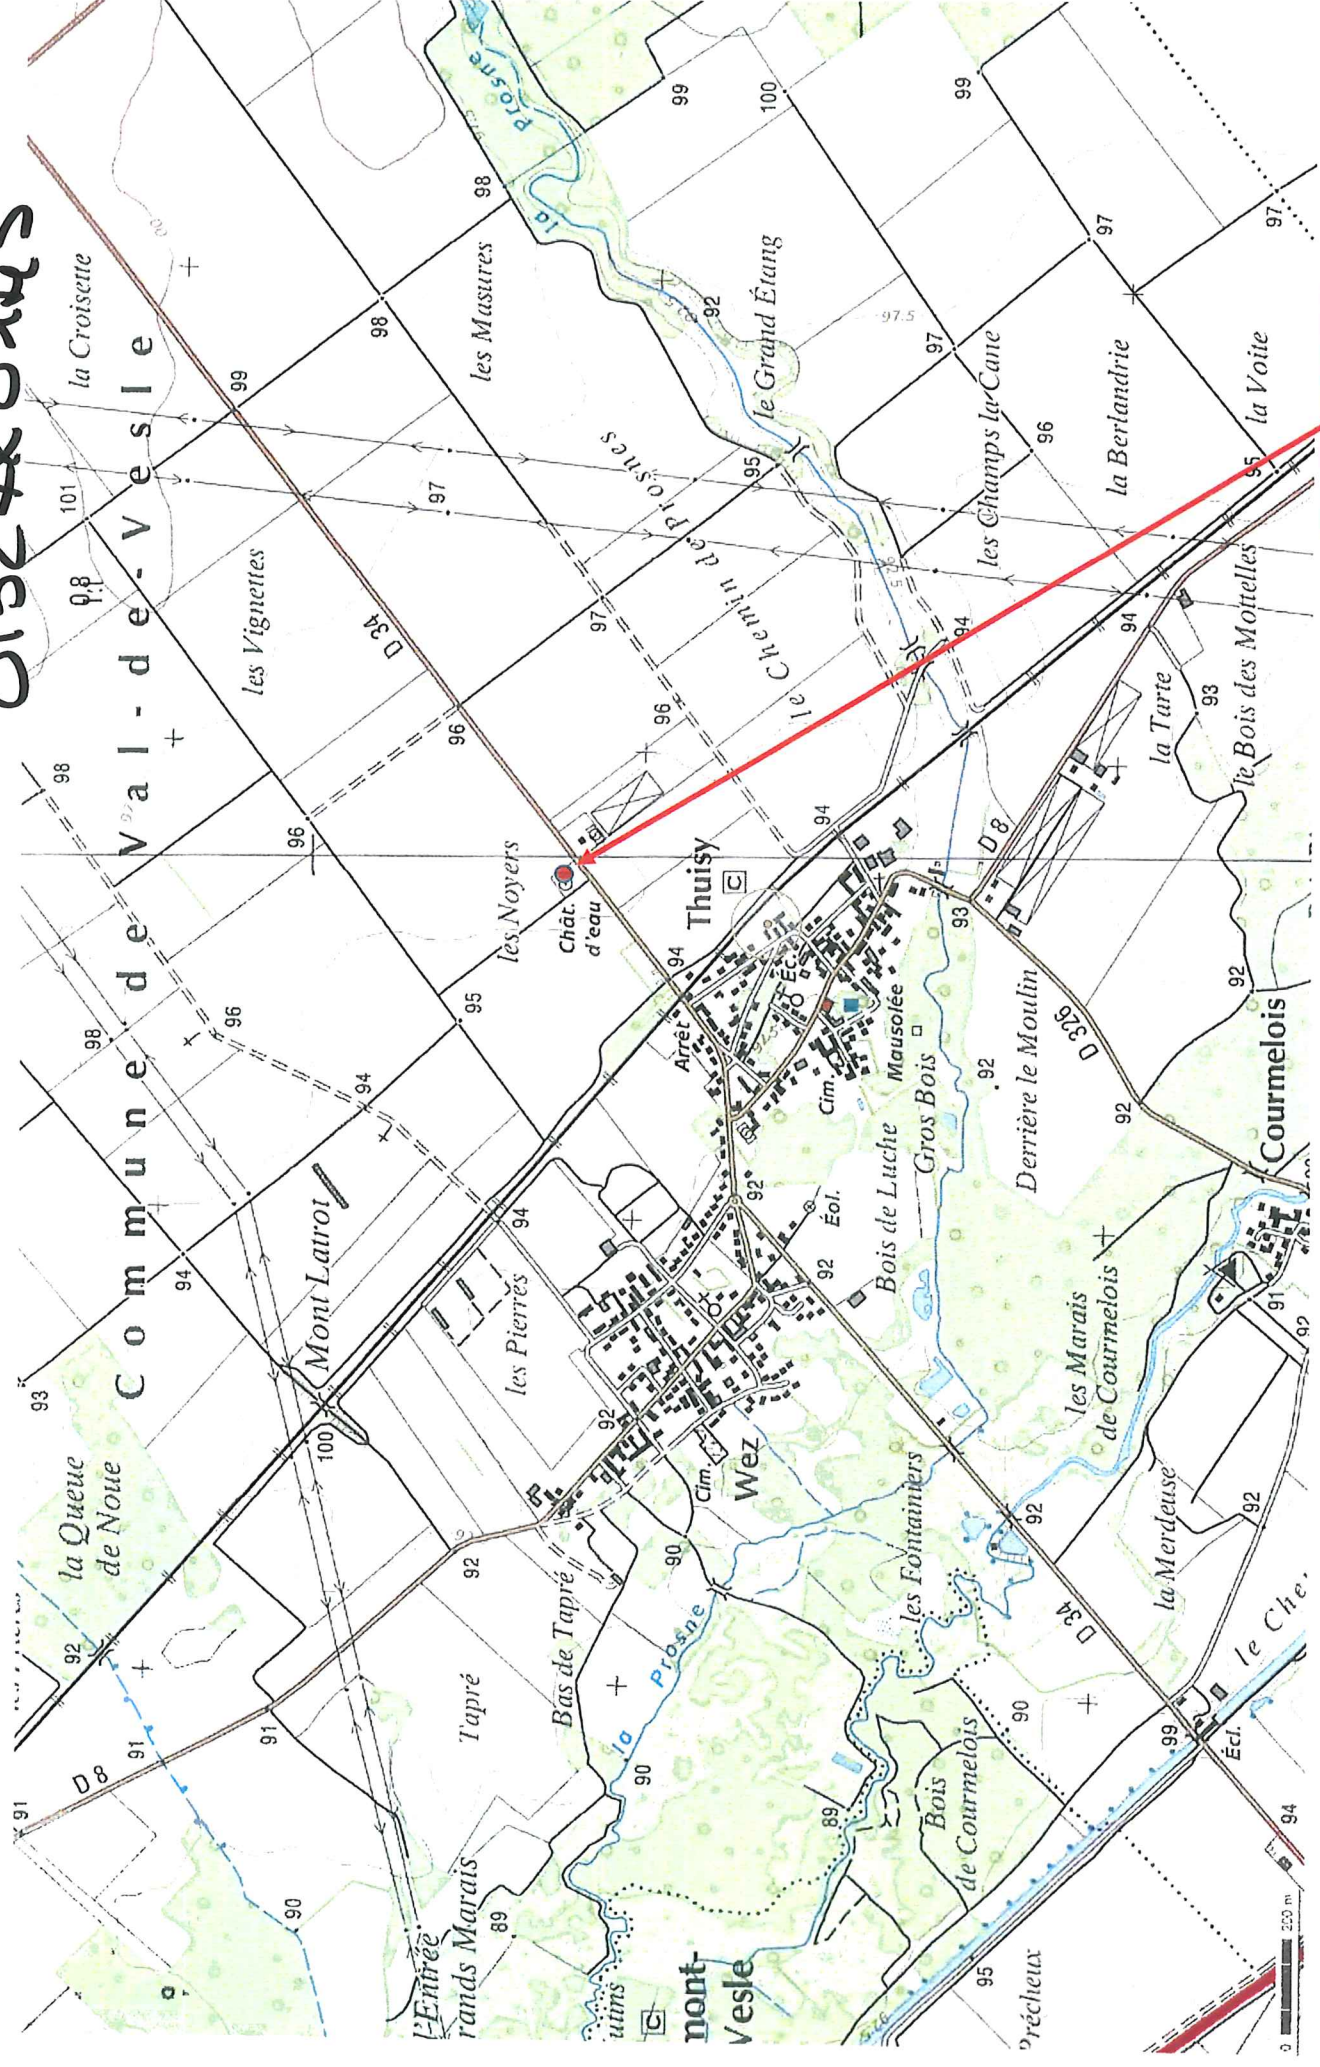

PROJET
Alt : 96 m

lat 49, 180-183°
long 4, 225544°

RAPPORT DE CHANTIER

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Entreprise : | Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS | TEL : 03.26.97.11.61 |
| Client : | Mairie de Val de Vesle, 16 rue du Général De Gaulle - 51360 Val de Vesle | |
| Date : | 06/01/2015 | n° DRIRE : 2145/51/14 |
| Affaire suivie par : | Mr BEHAGUE Aurélien, AMODIAG | |
| Type de chantier : | Piézomètre de contrôle de nappe | |
| Lieu du chantier : | Val de Vesle (Thuisy), Station de pompage | |

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

| | |
|----------------------------|--------------|
| Profondeur finale : | 20,00 |
|----------------------------|--------------|

| De | à | Ø en mm | Mode de foration | Fluide de foration |
|------|-------|---------|----------------------------|--------------------|
| | | | Rotary / Tarière / Battage | Air / Eau / Boue |
| 0,00 | 22,00 | 171 | Tarière | à sec |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TUBAGE

| De | à | Ø en mm | Epaisseur | Matière tube | Crépiné/ouv | Plein |
|-------|-------|---------|-----------|--------------|-------------|-------|
| -0,30 | 7,70 | 125 | 125/112 | PVC | | x |
| 7,70 | 20,00 | 125 | 125/112 | PVC | x 2 mm | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RAPPORT DE CHANTIER

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| Entreprise : | Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS | | TEL : 03.26.97.11.61 |
| Client : | Mairie de Val de Vesle, 16 rue du Général De Gaulle - 51360 Val de Vesle | | |
| Date : | 06/01/2015 | n° DRIRE : | 2145/51/14 |
| Affaire suivie par : | Mr BEHAGUE Aurélien, AMODIAG | | |
| Type de chantier : | Piézomètre de contrôle de nappe | | |
| Lieu du chantier : | Val de Vesle (Thuisy), Station de pompage | | |

MASSIF DE GRAVIERS

| De | à | Granulo | Méthode | | Entre Ø | et Ø |
|----|---|---------|---------|------|---------|------|
| | | | Gravité | Tube | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CIMENTATION

| De | à | Type de | Méthode | | Entre Ø | et Ø |
|------|------|---------|---------|------|---------|------|
| | | ciment | Gravité | Tube | | |
| 0,00 | 6,00 | CPJ45 | x | | 171 | 125 |
| 6,00 | 6,50 | Jupe | | | 171 | 125 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------|----------------|
| POMPAGE | NS (m) : | 3,9 | Côte / Sol (m): | 0,7 | Pompe : | 14 m³/h |
|----------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------|----------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| ND (m) | Q (m3) | Temps |
| 7,40 | 14,00 | 2h |
| | | |
| | | |
| | | |
| Acidification : | 0 tonne(s) | |
| ND (m) | Q (m3) | Temps |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ND (m) | Q (m3) | Temps |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ND (m) | Q (m3) | Temps |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ND (m) | Q (m3) | Temps |
|--------------------------|----------|------------------------|
| | | |
| 7,40 | 14,00 | 2h |
| Débit spécifiques | | |
| Q' = | 4,00 | m ³ / h / m |
| | | |

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

01327X0145

RAPPORT DE CHANTIER

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Entreprise : | Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS | TEL : 03.26.97.11.61 |
| Client : | Mairie de Val de Vesle, 16 rue du Général De Gaulle - 51360 Val de Vesle | |
| Date : | 06/01/2015 | n° DRIRE : 2145/51/14 |
| Affaire suivie par : | Mr BEHAGUE Aurélien, AMODIAG | |
| Type de chantier : | Piézomètre de contrôle de nappe | |
| Lieu du chantier : | Val de Vesle (Thuisy), Station de pompage | |

