


BSS003RMCW

BSS003RMEK



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau
51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61
Fax 03.26.97.21.75
Voit.06.22.92.65.22

Capital de 100 000 Euros
Siren B 330 588 278 84 B 241
SIRET 330 588 278 B 00029
APE 452 U

TRAVAUX DE FORAGE POUR

CONTRÔLE DE NAPPE

à

RECY

salle de Sport Pierre Arnaud

Rue Marcel Jesson

Affaire suivie par :
Antea Mr Ballin


796481
6877003

TRAVAUX REALISES LE
26 et 27 /11/2001

pas de DCL
pas de plan

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	ANTEA REIMS	
Date :	27/11/2001	n° DRIRE : inconnu
Affaire suivie par :	Frank BALLIN	
Type de chantier :	Forage à la craie	
Lieu du chantier :	RECY	

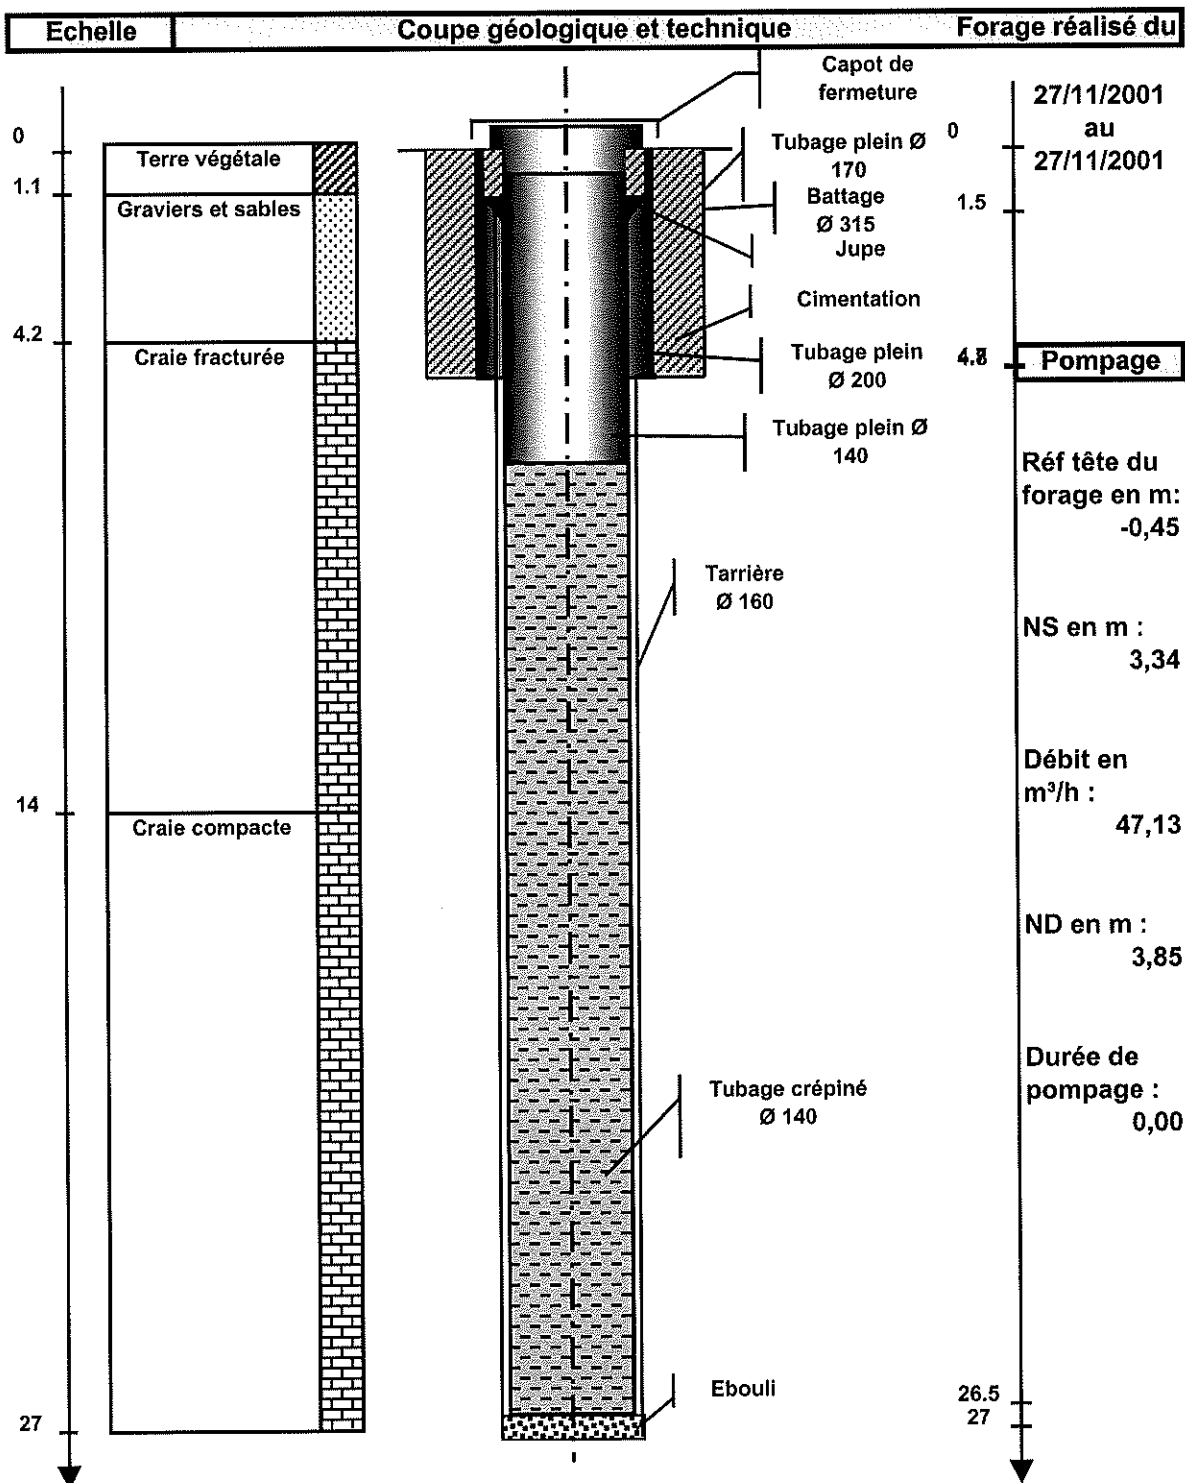

TERRAIN

FORAGE

Profondeur finale : 6,75

TUBAGE

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	ANTEA REIMS	
Date :	27/11/2001	n° DRIRE : inconnu
Affaire suivie par :	Mr BALLIN	
Type de chantier :	Forage aux alluvions	
Lieu du chantier :	RECY Salle de sports . Essai d'infiltration	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,50	6,75	2à3 mm	x		220	140

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	1,50	CLK		x	220	140

POMPAGE

NS (m) : 3

Côte / Sol (m) : -0,45

Pompe : Surface

ND (m)	Q (m3)	Temps
4,95	12,25	2h
Acidification :		0 tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
4,95	12,25	2h
Débit spécifiques		
Q' =	6,28	m ³ / h / m


Observations :

Le forage a été réalisé avec un tubage provisoire pour tenir les alluvions.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	ANTEA REIMS	
Date :	27/11/2001	n° DRIRE : inconnu
Affaire suivie par :	Mr BALLIN	
Type de chantier :	Forage aux alluvions	
Lieu du chantier :	RECY Salle de sports . Essai d'infiltration	

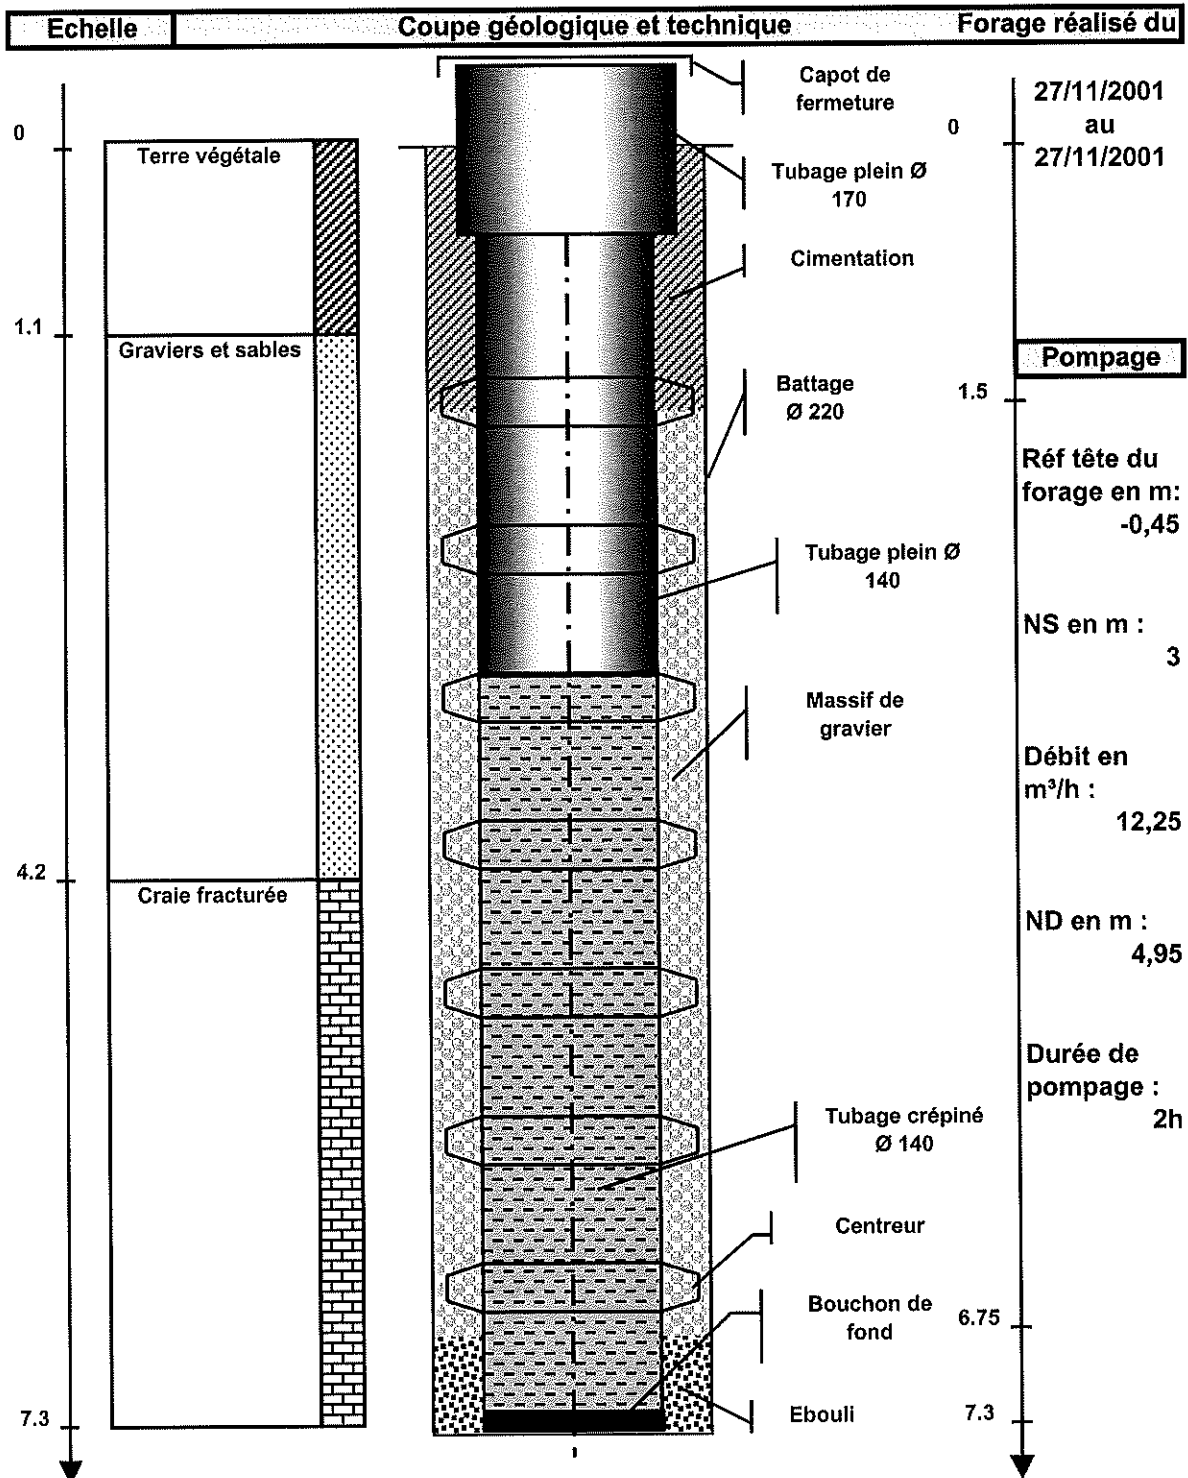

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client : ANTEA REIMS	
Date : 27/11/2001	n° DRIRE : inconnu
Affaire suivie par : Mr BALLIN	
Type de chantier : Forage aux alluvions	
Lieu du chantier : RECY	Salle de sports . Essai d'infiltration

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date : 27/11/2001	Niveau statique : 3
Heure déb :	Hauteur du repère : 0,1
Heure fin :	Refoulement : EP
Distance piézo craie : 4m	Niveau statique piézo :

Descente			Remontée		
Temps	ND	Débit	Piézo	Temps	Forage
1mn				1mn	3,45
1mn30				1mn30	3,4
2mn				2mn	3,38
2mn30				2mn30	
3mn				3mn	3,37
3mn30				3mn30	
4mn	3,32	4,9		4mn	3,37
4mn30				4mn30	
5mn				5mn	
6mn	3,35	11,55		6mn	3,37
7mn				7mn	
8mn	3,35	11,2		8mn	3,37
9mn				9mn	
10mn	3,35	11		10mn	3,36
12mn				12mn	
14mn				14mn	3,36
16mn				16mn	
18mn				18mn	
20mn	4,19	12,2		20mn	3,35
25mn				25mn	
30mn	4,65			30mn	3,34
45mn	4,73			45mn	
1h	4,86	12,3		1h	
1H10	4,87			1h30	
1H20	4,9	12,1		2h	
1H30	4,92			3h	
1H45	4,93			4h	
2H	4,95	12,25		5h	
6h				6h	
