

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	FORASUD S.A.
Client:	NESTLE WATERS SUPPLY SUD Zone aeropole de garons 30128 GARONS
Maître d'oeuvre:	NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Exploitant:	NESTLE WATERS SUPPLY SUD Zone aeropole de garons 30128 GARONS

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : F16-3 Puech de Guigno parcelle 168 section AB
30600 VESTRIC ET CANDIAC

Coordonnées : **Longitude** 800 407 **Latitude** 6 295 693 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/02/2017

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 16/02/2017

Resp. M. Oeuvre :

Machine : F8

Resp. Chantier : DOS SANTOS

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 22.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Maître d'oeuvre:	NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Lieu de l'ouvrage :	F16-3 Puech de Guigno parcelle 168 section AB 30600 VESTRIC ET CANDIAC

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre vegetale
1.00	8.00	Calcaire jaune
8.00	15.00	Calcaire gris
15.00	30.00	Calcaire jaune
30.00	37.00	Calcaire gris
37.00	68.00	Calcaire jaune
68.00	72.00	Calcaire noir
72.00	80.00	Calcaire jaune
60.00	95.00	Calcaire jaune
80.00	100.00	Calcaire noir

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	17"1/2	444.00	M.f.t.	Air
12.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
60.00	2.50
75.00	1.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	16"	406.00	6.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	16"	406.00	Ciment	Cpj 45	Sous pression			0.63

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Bride Ø 406 boulonnée

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111
du : 01/02/2017 au : 16/02/2017


Client : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Maitre d'oeuvre : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Localisation de l'ouvrage : F16-3 Puech de Guigno parcelle 168 section AB
30600 VESTRIC ET CANDIAC

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 800 407
Latitude (Y): 6 295 693
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

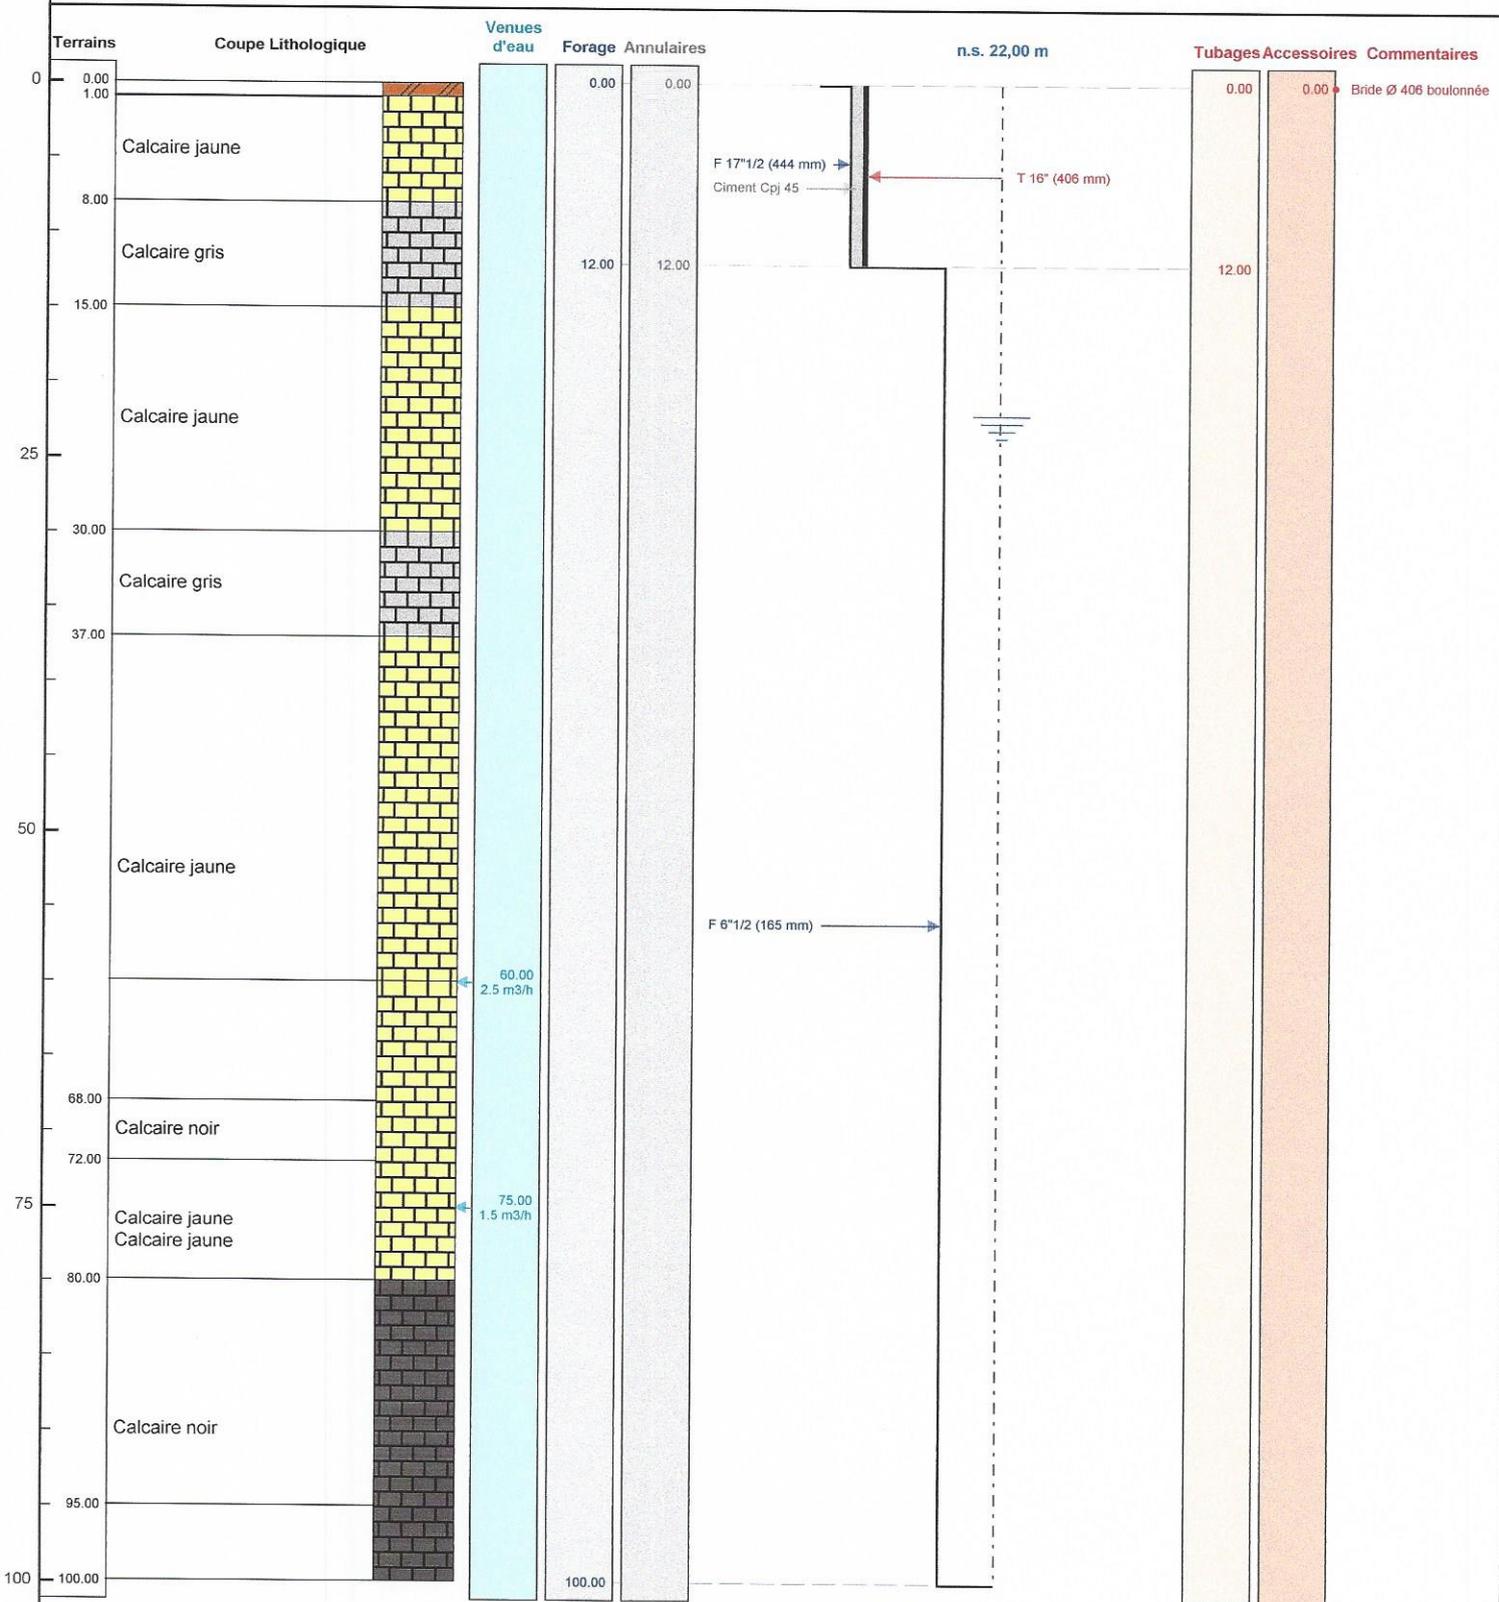

Le 03.03.2017 à V. D. ...
CERTIFIÉ CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
