

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS003CLWU


TRAVAUX DE RECONNAISSANCE POUR LES BESOINS INDUSTRIELS

à
Haussimont (51)
TEREOS

Affaire suivie par :

Mr DESBOURDES, FIAM

**TRAVAUX REALISES
DU
23 au 25 Mai 2018**

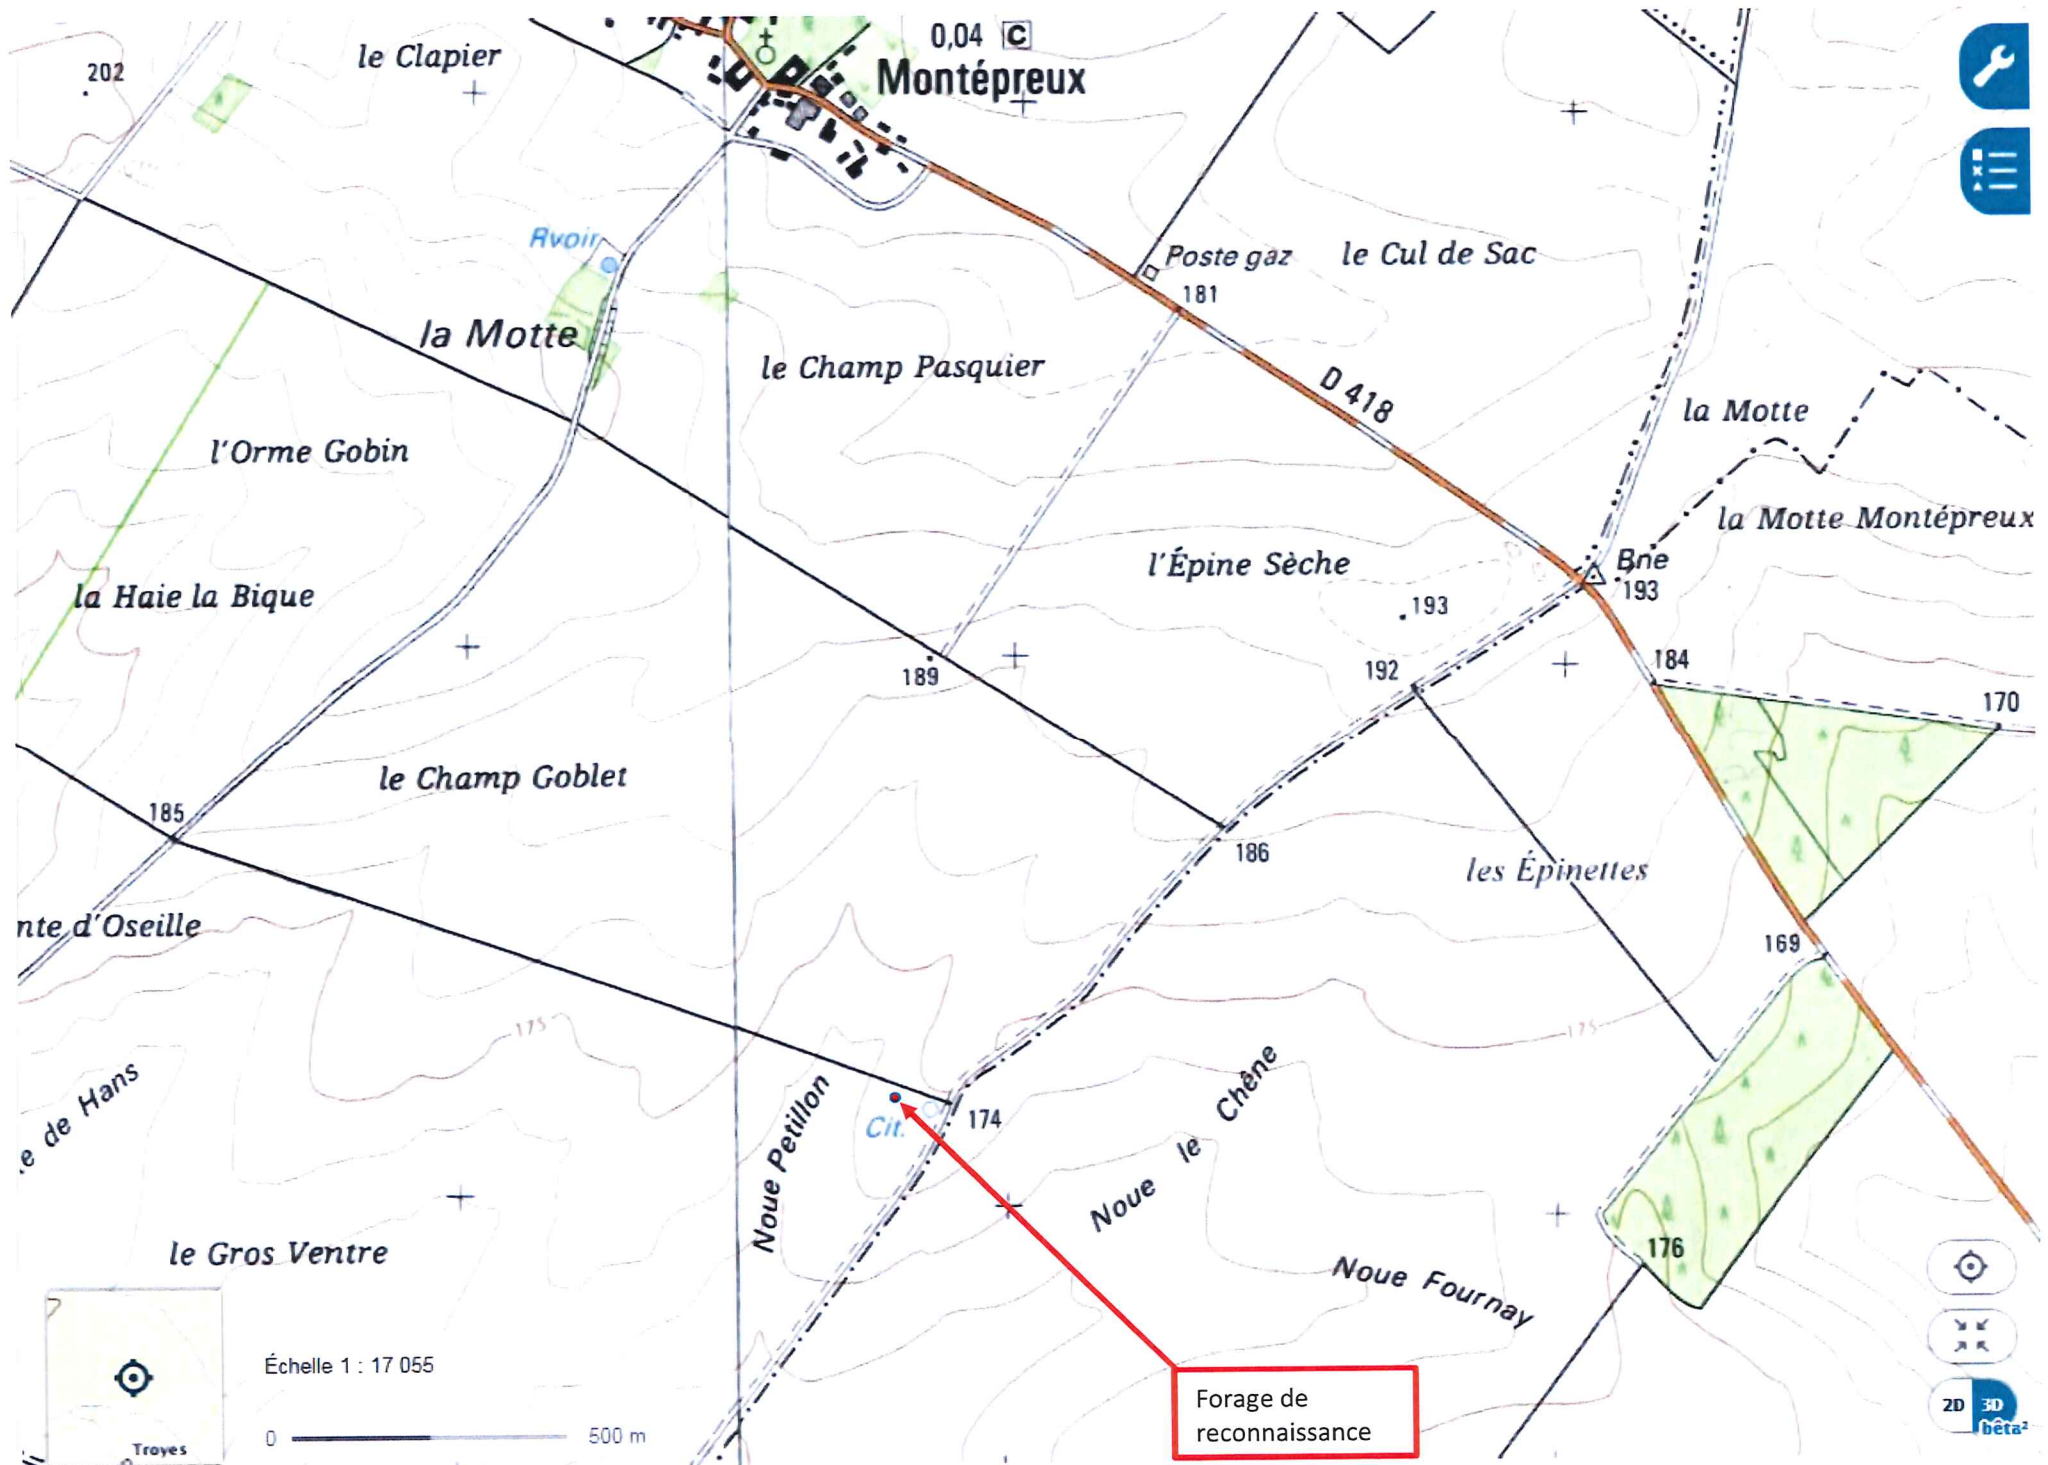

B55003CLWk

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	TEREOS, 23 route de Montépoux - 51320 Haussimont	
Date :	23/05/2018	n° DREAL : ICPE (voir client)
Affaire suivie par :	Mr DESBOURDES, FIAM	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Haussimont / Montépoux	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	70,50
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	311	Tarière	à sec
3,00	70,50	250	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	273	273/263	Acier E24.2		x
-0,20	27,80	180	180/163	PVC		x
27,80	70,50	180	180/163	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entrepri se : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	TEREOS, 23 route de Montépreux - 51320 Haussimont	
Date :	23/05/2018	n° DRIRE : PE (voir client)
Affaire suivie par :	Mr DESBOURDES, FIAM	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Haussimont / Montépreux	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		311	273
7,50	8,00	Jupe			250	180

POMPAGE	NS (m) :	18,53	Côte / Sol (m):	-0,2	Pompe :	60 m³
----------------	----------	-------	-----------------	------	---------	-------

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
56,30	3,20	1h00
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m ³ /h)	Temps
56,30	3,20	2h
Débit spécifiques		
Q' =	0,08	m ³ / h / m

Observations :

Ce forage d'un débit actuel de 0,08 m³/h/ml peut être amélioré par acidification.

Si ce forage est transformé en forage définitif pour des besoins domestiques, il est envisagé de réaliser une cimentation sur paker à -8 mètres après une éventuelle acidification.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	TEREOS, 23 route de Montépreux - 51320 Haussimont	
Date :	23/05/2018	n° DREAL : ICPE (voir client)
Affaire suivie par :	Mr DESBOURDES, FIAM	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Haussimont / Montépreux	

