

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE PAC F1

REÇU LE

26 AVR. 2010

05193X023 1/ F2 PAC.

05193X023 2/ F1 PAC.

Entreprise: GAUDAIS JEAN BERNARD

Client: SEM TERRITORIA

Maître d'oeuvre: BARON BONNIVIN

Code National BSS :

N° Déclaration :

Lieu de l'ouvrage : Rue Maurice Roy
18000 BOURGES

Coordonnées : X 605 875 Y 2 231 250 Altitude : 137.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Date début de l'ouvrage : 08/03/2010

Resp. M. Ouvrage : SEM.TERRITORIA

Date fin de l'ouvrage : 10/03/2010

Resp. M. Oeuvre : BARRON BONIVIN

Machine : S440 stenuickSE

Responsable Chantier : GAUDAIS JB

Date début pompage : 17/03/2010

Profondeur hydrostatique/sol : 12.00 m

Date fin de pompage : 31/03/2010

Débit Maxi. d'essai : 60.00 m3/h

Rabatement correspondant : 8.80 m

Notes : le debit maximun effectu   est de 60 m  tre cube heures

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE PAC F1

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Client: | SEM TERRITORIA |
| Maître d'oeuvre: | BARON BONNIVIN |
| Lieu de l'ouvrage : | Rue Maurice Roy |
| | 18000 BOURGES |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|------------------------------|
| 0.00 | 3.00 | Remblais |
| 3.00 | 6.00 | Calcaire marneux |
| 6.00 | 22.00 | Calcaire |
| 22.00 | 29.00 | Calcaire gris |
| 29.00 | 36.00 | Calcaire |
| 36.00 | 46.00 | Calcaire avec limon argileux |
| 46.00 | 48.00 | Calcaire destabilisé |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|--------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 6.20 | 12"7/8 | 326.00 | M.F.T. | AIR |
| 6.20 | 48.00 | 10" | 254.00 | M.F.T. | AIR |

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 18.00 | 25.00 |
| 40.00 | 80.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature matériau | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------------|------------|------|--------|
| 0.00 | 7.00 | 10"3/4 | 273.00 | 6.00 | | ACIER-API | TUBE-PLEIN | | |
| 7.00 | 11.00 | 7"7/8 | 200.00 | 10.00 | | P.V.C. | TUBE-PLEIN | | |
| 11.00 | 23.00 | 7"7/8 | 200.00 | 10.00 | | P.V.C. | FENTE | 1.00 | |
| 23.00 | 46.00 | 7"1/8 | 180.00 | 8.00 | | P.V.C. | FENTE | 1.00 | |

REPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|------|--------|--------|----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 6.30 | 10"3/4 | 273.00 | CIMENT | CPA 55 | Gravitaire | | | 0.50 |
| 0.00 | 9.00 | 7"7/8 | 200.00 | CIMENT | CPA 55 | Gravitaire | | | 0.60 |

05493X0231/F2 PAC.

05493X0232/F1 PAC.

REMPLISSAGE (suite)

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 9.00 | 46.00 | 7"7/8 | 200.00 | GRAVIER | Graviers de Loire | Autre | Roule | 4.00-6.00 | 2.00 |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|------|------|-------------------|
| 0.00 | 0.00 | BOUCHON |


FORAGE PAC F1

Travaux réalisés :
du : 13/03/2010 au : 18/03/2010

Client : SEM TERRITORIA
 Maître d'oeuvre : BARON BONNIVIN
 Localisation de l'ouvrage : Rue Maurice Roy
 18000 BOURGES

Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert 2 étendu métrique
 X: 605 875
 Y: 2 231 250
 Z altitude sol: +137,000 m

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

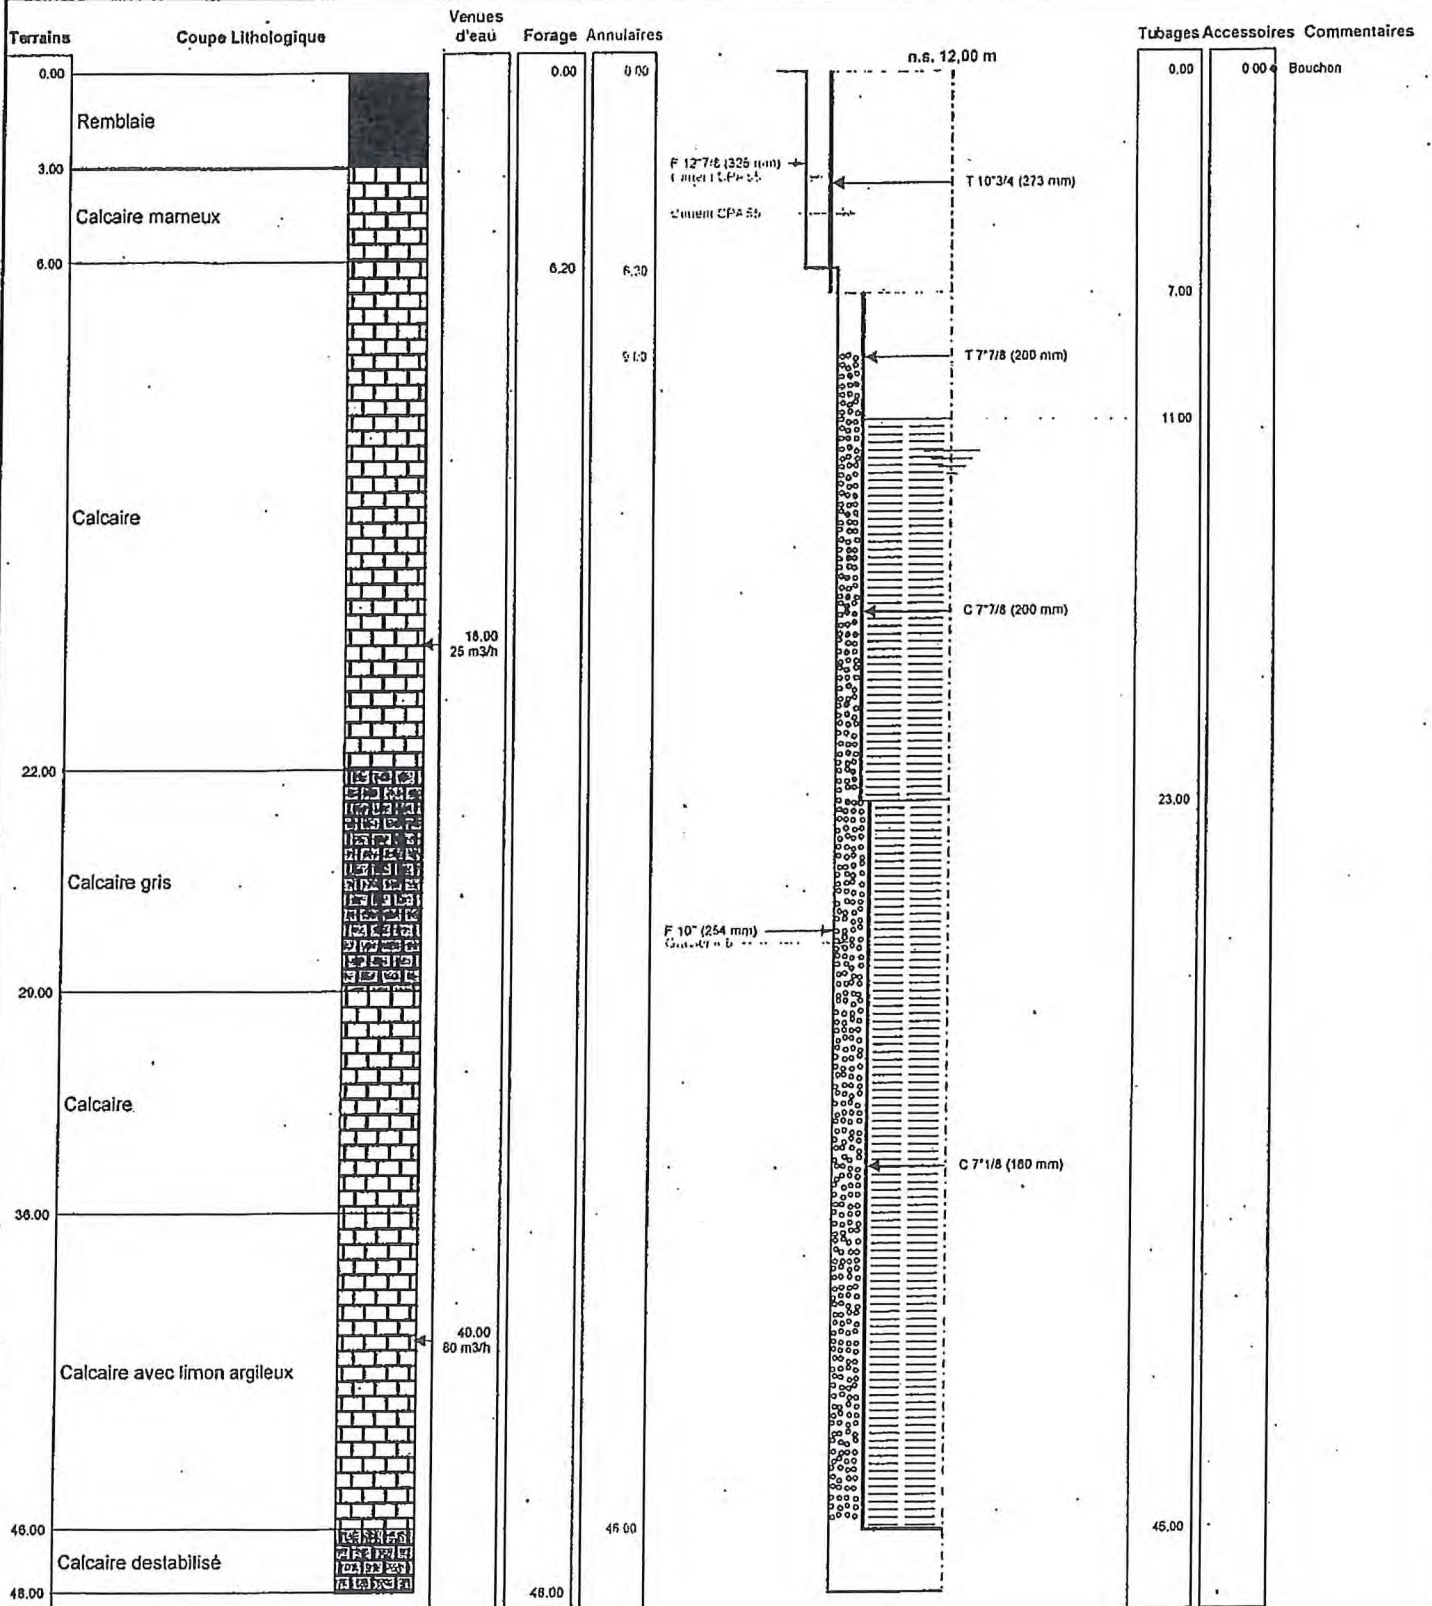

Le à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
