

DOSSIER TECHNIQUE

BSS003FKGG

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BOURGEOIS FORAGE
Client:	THEVENOT SEBASTIEN 2 IMPASSE DU PRIEURÉ 10500 MOLINS SUR AUBE
Maître d'oeuvre:	THEVENOT SEBASTIEN 2 IMPASSE DU PRIEURÉ 10500 MOLINS SUR AUBE
Exploitant:	THEVENOT SEBASTIEN 2 IMPASSE DU PRIEURÉ 10500 MOLINS SUR AUBE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 2 IMPASSE DU PRIEURÉ
10500 MOLINS SUR AUBE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 29/10/2018

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/10/2018

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 9.68 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.80 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.84 m

Notes : 1 FORAGE DE POMPAGE DE 21 METRES

FORAGE D'EAU

Client: THEVENOT SEBASTIEN
 Maître d'oeuvre: THEVENOT SEBASTIEN
 Lieu de l'ouvrage : 2 IMPASSE DU PRIEURE
 10500 MOLINS SUR AUBE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.40	TERRE VEGETALE
0.40	1.50	ARGILE JAUNE
1.50	2.80	ALLUVIONS SECHES
2.80	4.00	ARGILE MARRON
4.00	20.50	CRAIE BLANCHE
20.50	21.00	MARNE NOIRE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	21.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	8.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
8.00	21.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.70	6.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Gravitaire			0.10
6.00	21.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.30

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
21.00	21.00	Bouchon

FORAGE D'EAU

Client :

THEVENOT SEBASTIEN

Maitre d'oeuvre :

THEVENOT SEBASTIEN

Localisation de l'ouvrage :

2 IMPASSE DU PRIEURÉ

10500 MOLINS SUR AUBE

Travaux réalisés :

du : 29/10/2018 au : 30/10/2018

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/106

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

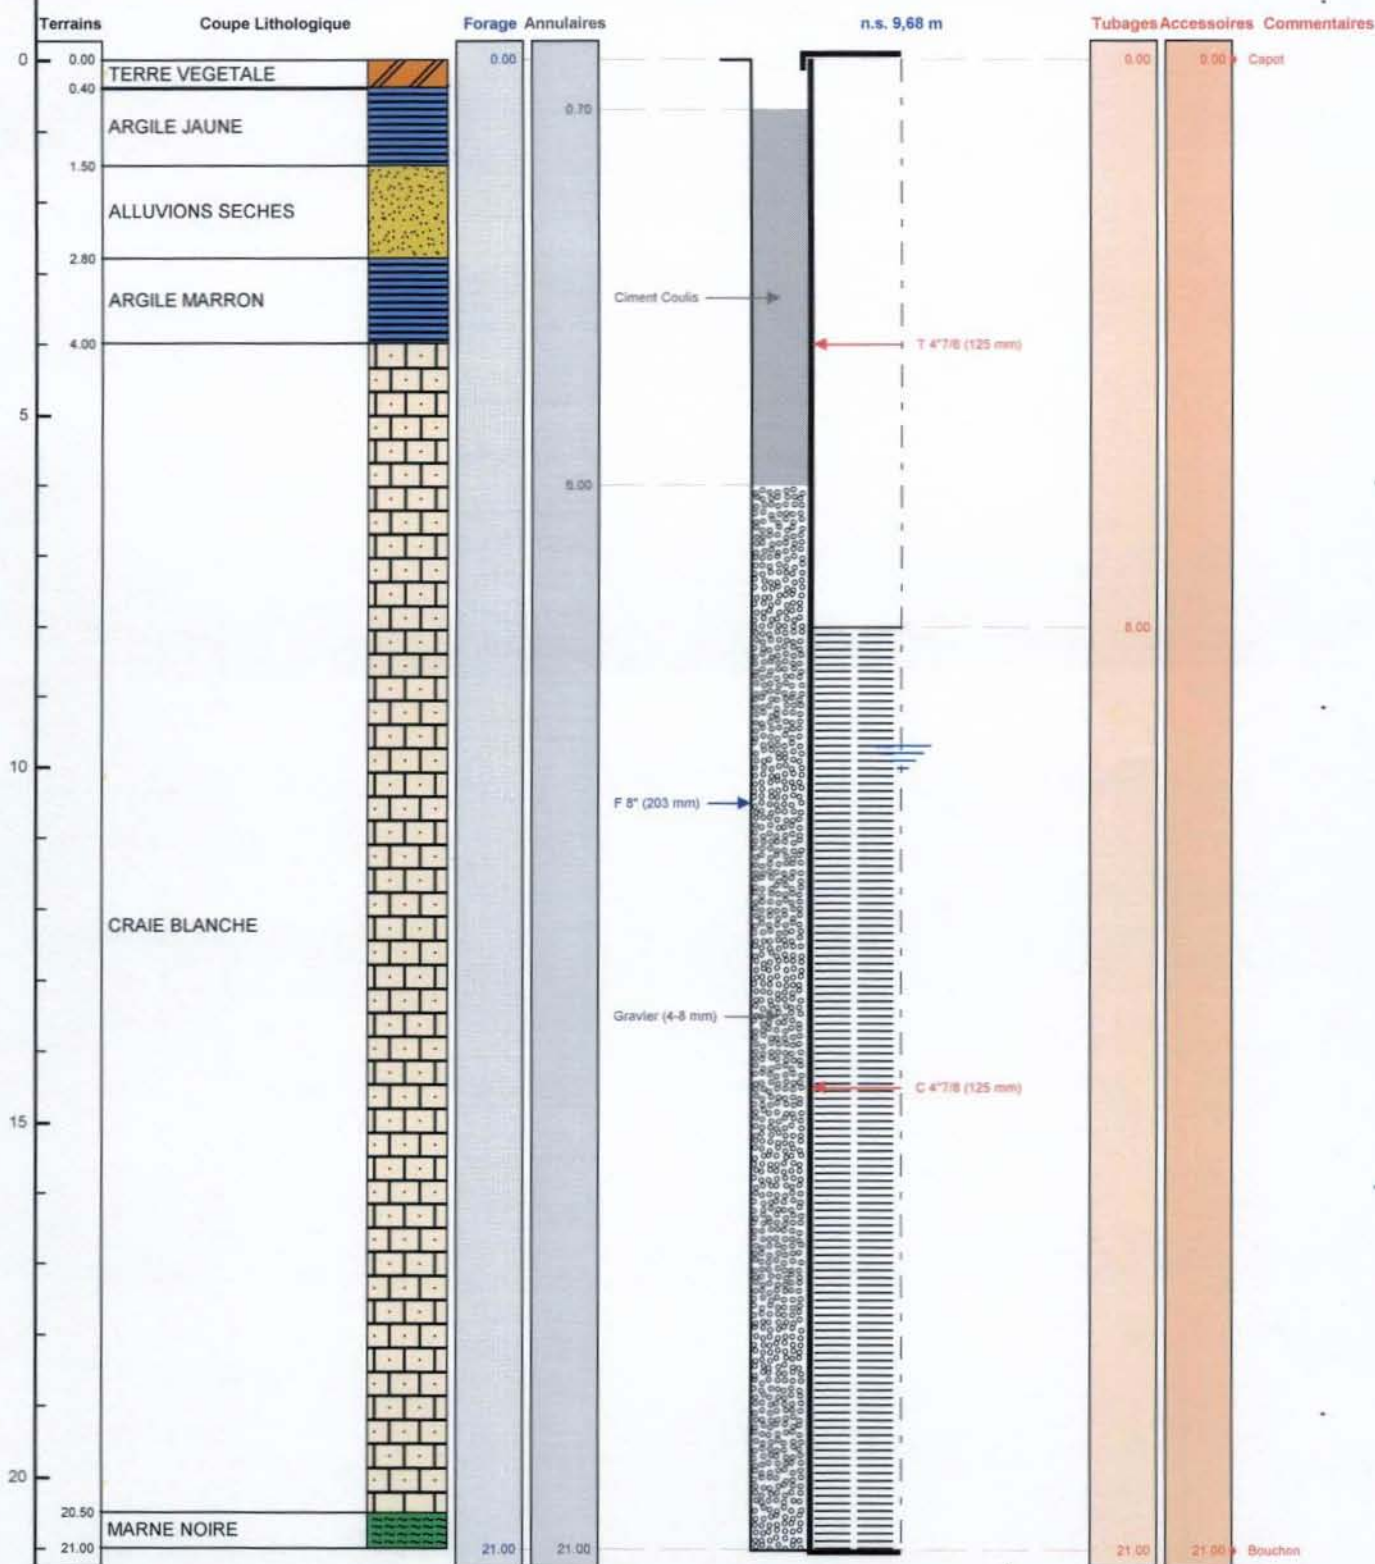

Le 12/11/2018 à 10h00
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

SARL BOERGEON "FORAGE"
24 Rue du Corps de Garde
10700 CHATELAIN VALLON

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m - Tél/Fax 03 25 47 30 72 PAGE: 3
Siret 403 692 125 00014

BSS003FKGG
