

RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DE TRAVAUX

COMMUNE DE GUILLEVILLE
DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR

COMBLEMENT DE L'ANCIEN FORAGE AEP 03271X0006/F



EXEAU TP
Le Bois Chesneau
282 RD 948
45460 BOUZY LA FORET
Tél : 02 38 28 30 56
exeau@exeau.com



Maitre d'ouvrage

**Mairie de Guilleville
1 rue Charles-de-Gaulle
28310 Guilleville**

Interlocuteur : Monsieur le Maire

Entreprise

**EXEAU TP
282 RD 948
Le Bois Chesneau
45460 BOUZY LA FORET**



☎ 02 38 58 30 56

📠 02 38 58 30 50

Mail : exeau@exeau.com



SOMMAIRE

1. Nature et consistance des travaux	4
2. Adresse du chantier.....	4
3. Date d'intervention sur site	6
COMPTE RENDU DES COMBLEMENTS	7
COUPE TECHNIQUE DU FORAGE COMBLÉ	9


1. Nature et consistance des travaux


La réalisation des travaux consistait au :

- Le comblement de l'ancien forage AEP 03271X0006/F
- Le déséquipement de la pompe immergée et de sa colonne

2. Adresse du chantier

Le présent chantier se situe au château d'eau de la commune de Guilleville à la sortie sur la D 354.

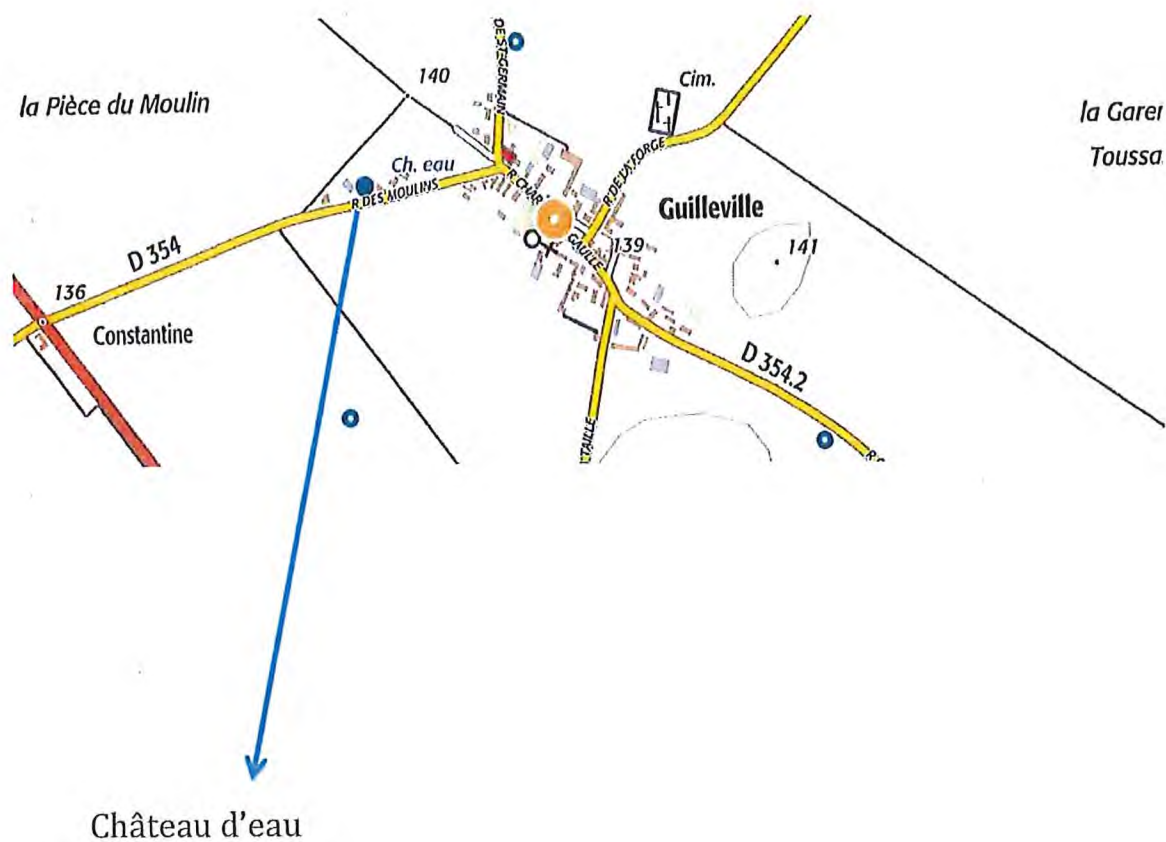

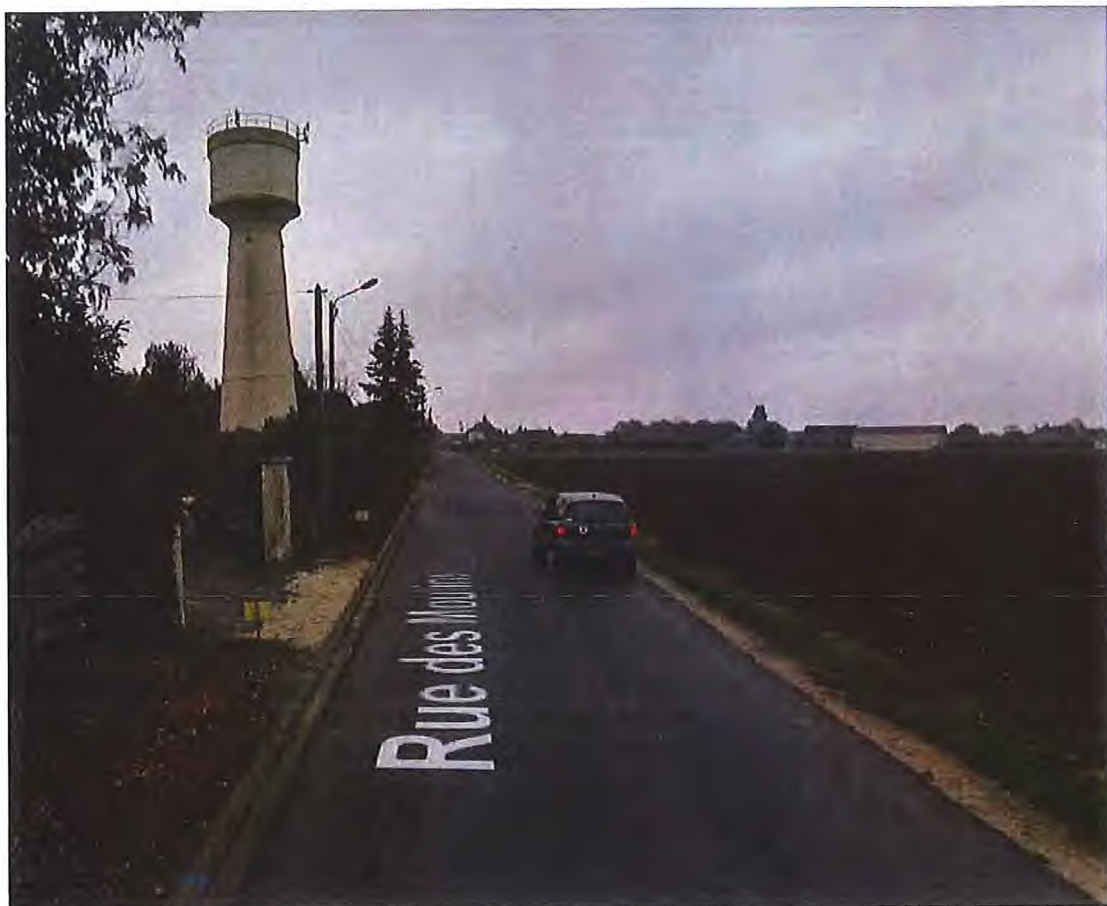



3. Date d'intervention sur site

Nous sommes intervenus sur site du 18 avril 2016 au 19 avril 2016 pour le démontage des colonnes de pompe et le comblement du forage.

Vous trouverez ci-joint le compte-rendu ainsi que la coupe technique des travaux exécutés.



COMPTE RENDU DES COMBLEMENTS



**COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE COMBLEMENT DE FORAGE AEP
De GUILLEVILLE**

Lundi 18.04.2016	Amenée du matériel, préparation du palan électrique et mise en place sur la poutre de soutien Démontage de la pompe immergée (profondeur 47 mètres) Contrôle du fond de forage (55 mètres) Contrôle du niveau statique (22.60 m) Contrôle de la tête de puits 0.00 à 9.90 m Diamètre 1.20 mètres De 9.90 m à 55 mètres acier Ø407mm
Mardi 19.04.2016	Fourniture et mise en œuvre de gravillon siliceux 12/22 de -55 à -4.50 m (soit 14 m³) Fourniture et mise en œuvre de ciment dosé 350 kg de -4.40 m à 0.00 m

Bouzy la Forêt, le 11 avril 2017

EXEAU TP SAS
282 route départementale 948
45460 BOUZY LA FORET
RCS Orléans 434 032 645 / APE 4221 Z
Siret 434 032 645 00013
E.mail : exeau@exeau.com
Tél. 02 38 58 30 56 - Fax 02 38 58 30 50
TVA INTRACOM FR 17 434 032 645

TRAVAUX PUBLICS
et PARTICULIERS
TERRASSEMENTS
VIABILISATION
RESEAUX DIVERS
CANALISATIONS


EXEAU TP - Le Bois Chesneau - 282, route Départementale 948 - 45460 BOUZY-LA-FORÊT
Tél. 02 38 58 30 56 - 02 38 58 90 00 - Télécopie 02 38 58 30 50 - e-mail : exeau@exeau.com
Agence du Cher : Tél. 02 48 58 91 61 - Agence I.D.F. : Tél. 02 37 31 95 04



COUPE TECHNIQUE DU FORAGE COMBLÉ

COMBLEMENT DE FORAGE

Ancien forage AEP - 03271X0006 / F

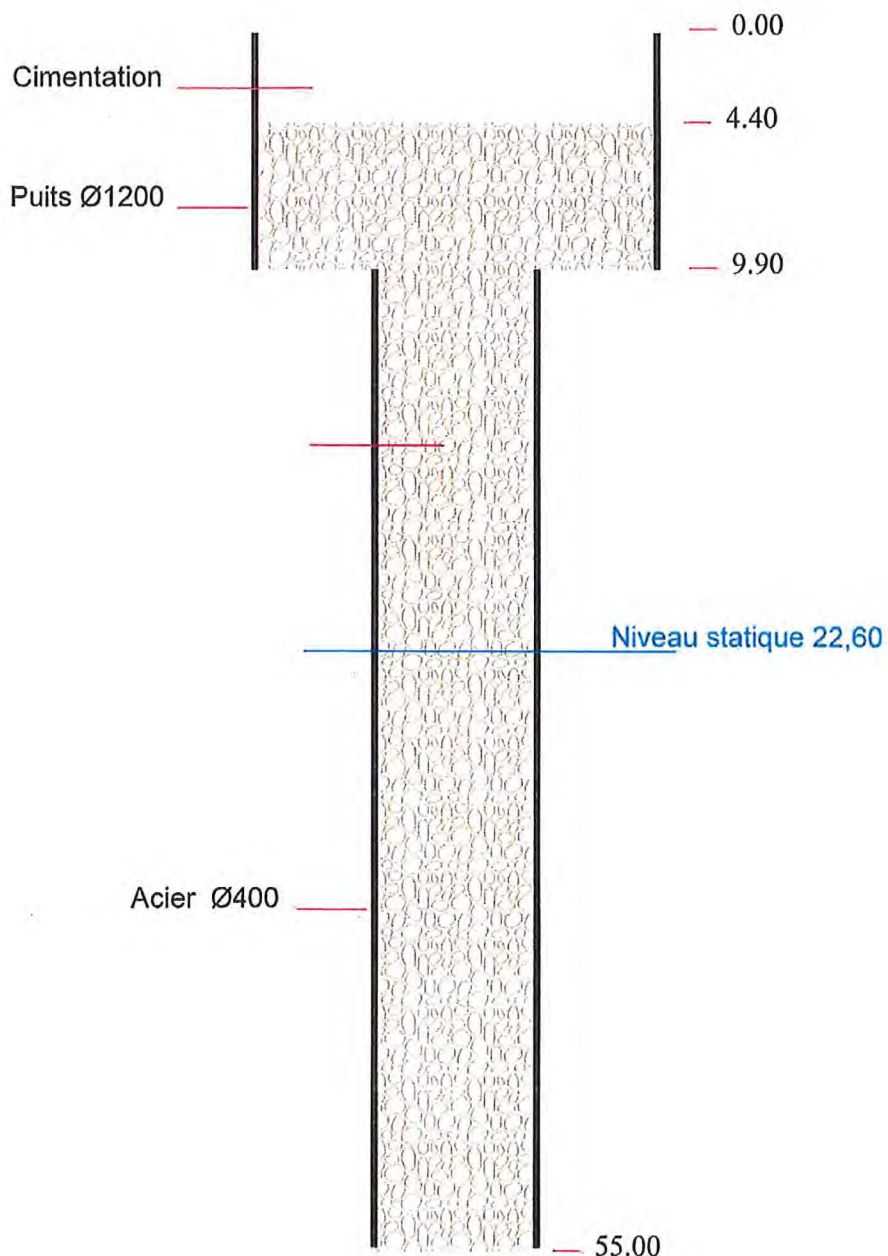

De: Environnement <environnement@coeurdebeauce.fr>
Envoyé: jeudi 5 juillet 2018 12:04
A: Le Boucher Eric; Salquebre Damien
Objet: Rapport Barmainville.pdf; Rapport Oinville saint Liphard.pdf; Rapport Allaines-Mervilliers.pdf; Rapport Guilleville.pdf
Pièces jointes:

Indicateur de suivi:
Etat de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

Bonjour,

Comme vous le savez, la Communauté de communes Cœur de Beauce est en cours d'interconnexion d'eau potable sur l'ensemble de son territoire.

L'ex Communauté de communes Beauce de Janville a commencé les travaux en 2015.

Les communes d'Allaines Mervilliers et de Guilleville ont été interconnectées en 2016 et les communes de Barmainville et Oinville Saint Liphard ont été interconnectées en 2017.
Suite au bon déroulement de travaux, chaque forage communal a été comblé par les communes à la fin des travaux d'interconnexion.

Je vous prie de trouver ci-joint les rapports techniques de fin de travaux des quatre compléments de forages. Souhaitez-vous un envoi papier.

Je reste à votre disposition pour toutes questions,

Sincères Salutations,

Emilie LEGENDRE
Pôle Ressources – Patrimoine
SPANC et environnement
Ligne Janville : 02 37 90 99 89
Ligne Voves : 02 37 99 29 97

