

RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DE TRAVAUX

COMMUNE D'ALLAINES – MERVILLIERS
DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR

COMPLEMENT DE L'ANCIEN FORAGE AEP 03271X0005/F



EXEAU TP
Le Bois Chesneau
282 RD 948
45460 BOUZY LA FORET
Tél : 02 38 28 30 56
exeau@exeau.com



Maitre d'ouvrage

**Mairie d'Allaines Mervilliers
1 rue du 11-Novembre
28310 Allaines-Mervilliers**

Interlocuteur : Monsieur le Maire

Entreprise

**EXEAU TP
282 RD 948
Le Bois Chesneau
45460 BOUZY LA FORET**



☎ 02 38 58 30 56

📠 02 38 58 30 50

Mail : exeau@exeau.com



SOMMAIRE

1. NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
2. ADRESSE DU CHANTIER	4
3. DATE D'INTERVENTION SUR SITE	6
COMPTE RENDU DES COMBLEMENTS.....	7
COUPE TECHNIQUE DU FORAGE COMBLÉ.....	9


1. Nature et consistance des travaux

La réalisation des travaux consistait au :

- Le comblement de l'ancien forage AEP 03271X0005/F
- Le déséquipement de la pompe immergée et de sa colonne

2. Adresse du chantier

Le présent chantier se situe au château d'eau de la commune d'Allaines Mervilliers à l'angle de la RN 154 et de la D 118.

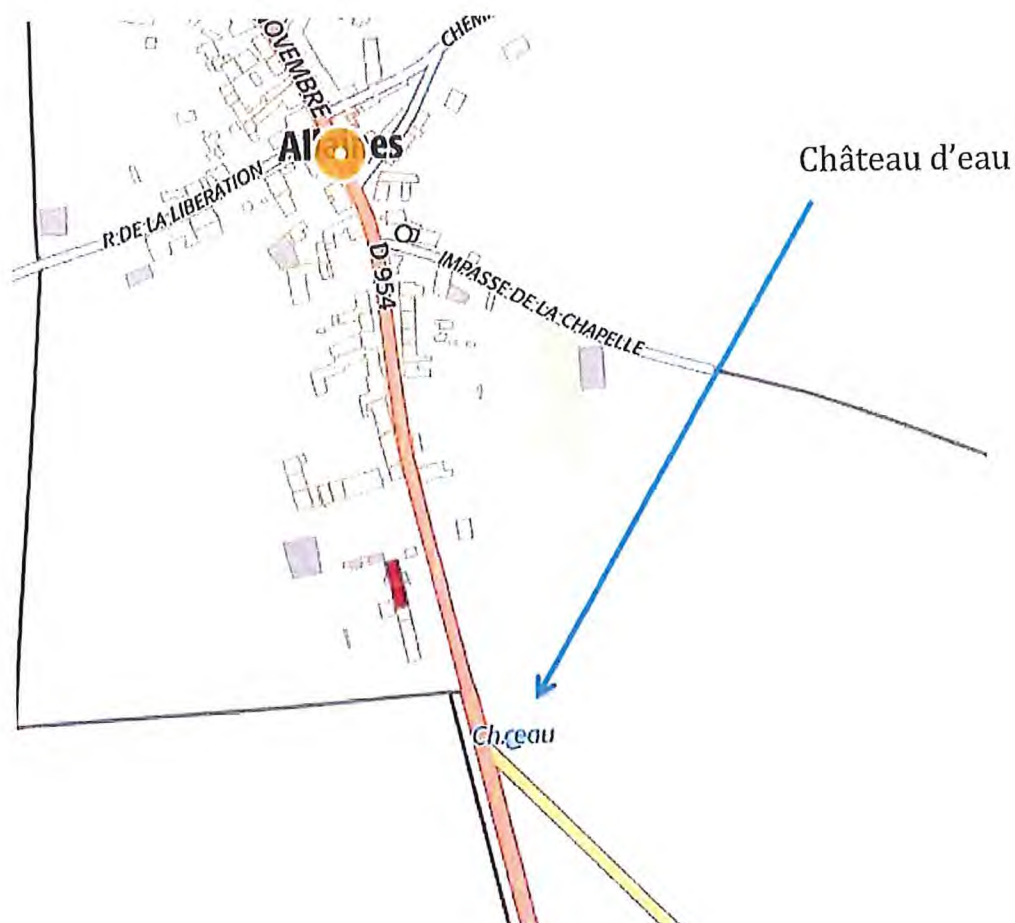





3. Date d'intervention sur site

Nous sommes intervenus sur site du 07 mars 2016 au 09 mars 2016 pour le démontage des colonnes de pompe et le comblement du forage.

Vous trouverez ci-joint le compte-rendu ainsi que la coupe technique des travaux exécutés.



COMPTE RENDU DES COMBLEMENTS



**COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE REBOUCHAGE
AVEC FORAGE AEP DE LA COMMUNE D'ALLAINES MERVILLIERS**

Lundi 07.03.2016	Amenée du matériel et personnel (2 personnes) Mise en place d'un palan électrique sur la poutre pour enlèvement de la colonne de pompe Démontage de la colonne de pompe et de la pompe immergée (laissées sur le site à la demande du client) Contrôle du forage (voir plan)
Mardi 08.03.2016	Préparation du site pour mise en œuvre de gravillons et du ciment 10h à 11h : mise en œuvre de gravillons 7m ³ (voir bon de livraison) 11h à 12h : 8m ³ de gravillons (voir bon de livraison) 15h à 16h : 7m ³ de gravillons (voir bon de livraison) 17h à 18h : 7m ³ de gravillons (voir bon de livraison)
Mercredi 09.03.16	8h à 9h : mise en œuvre de béton 5m ³ (voir bon de livraison) -3.00 à 0.00 Nettoyage et enlèvement du matériel

Bouzy la Forêt, le 28 Juillet 2016

EXEAU TP SAS
282 route départementale 948
45460 BOUZY LA FORET
RCS Orléans 434 032 645 - APE 4221 Z
Siret 434 032 645 00013
E-mail : exeau@exeau.com
Tél. 02 38 58 30 56 - Fax 02 38 58 30 50
TVA INTRACOM FR 17 434 032 645

TRAVAUX PUBLICS
et PARTICULIERS
TERRASSEMENTS
VIABILISATION
RESEAUX DIVERS
CANALISATIONS

EXEAU TP - Le Bois Chesneau - 282, route Départementale 948 - 45460 BOUZY-LA-FORET
Tél. 02 38 58 30 56 - 02 38 58 90 00 - Télécopie 02 38 58 30 50 - e-mail : exeau@exeau.com
Agence du Cher : Tél. 02 48 58 91 61 - Agence I.D.F. : Tél. 02 37 31 95 04

COUPE TECHNIQUE DU FORAGE COMBLÉ

COMBLEMENT DE FORAGE

Ancien forage AEP - 03271X0005 / F

